


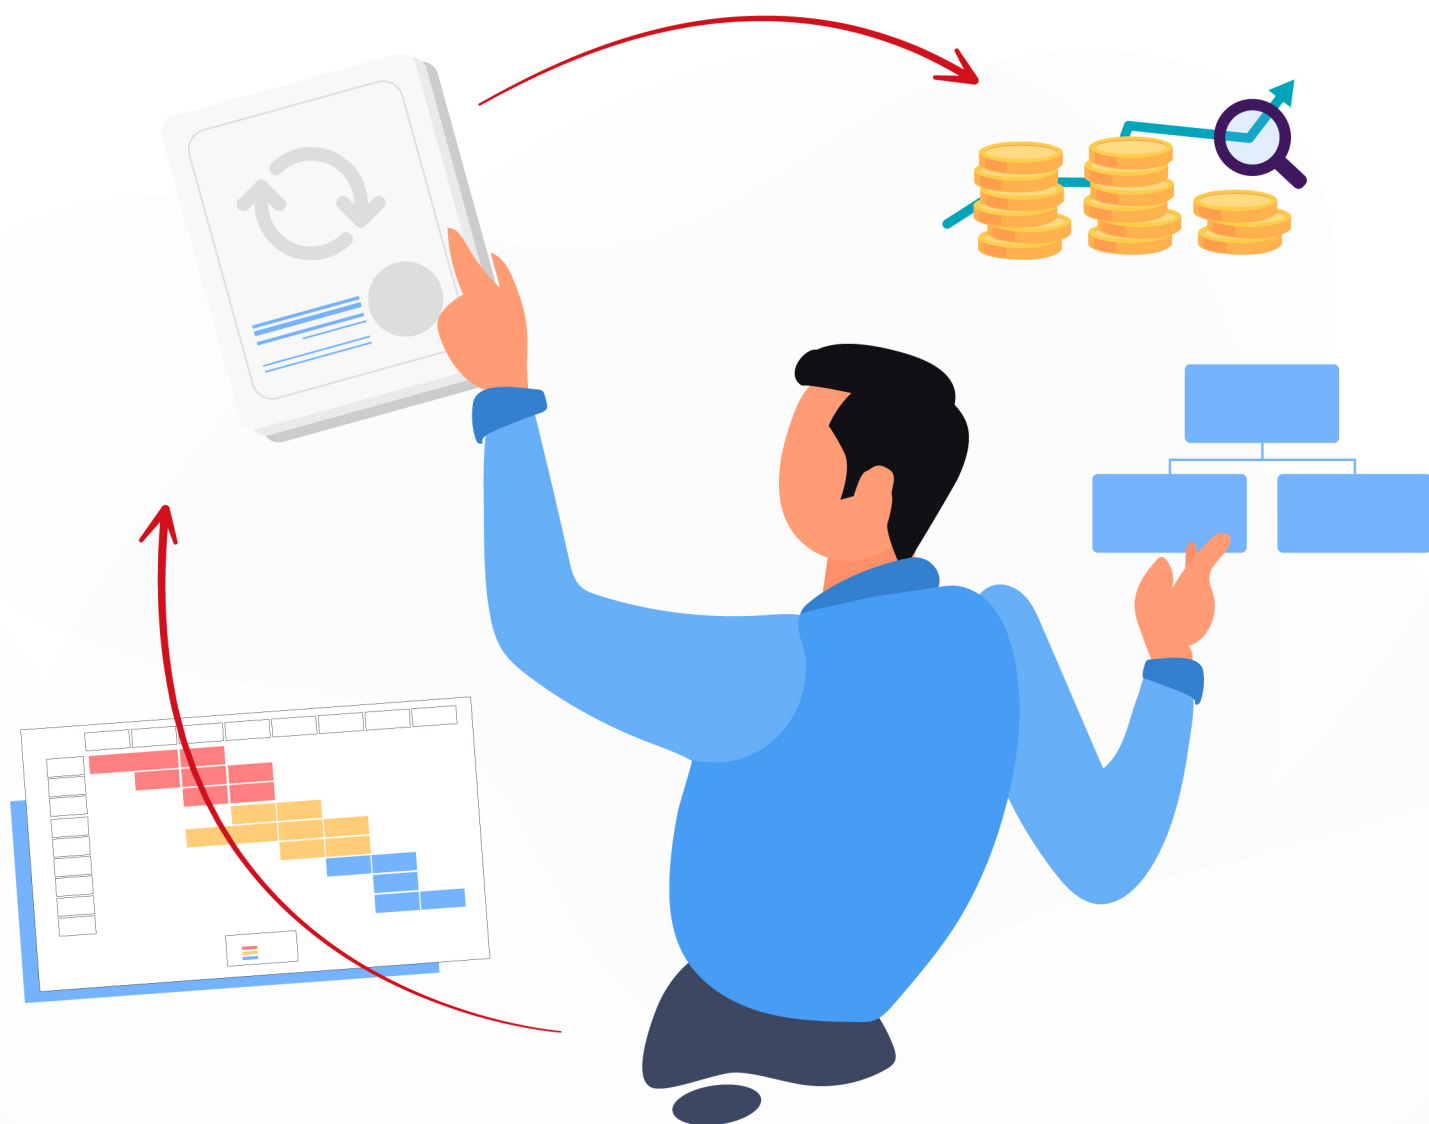

GESTIÓN DE CAMBIOS EN LOS PROYECTOS

Diciembre - Enero 2022

EDICIÓN N°2

CAPACITACIONES

ALINEADAS AL PMBOK 6TA EDICIÓN

- ✓ TALLER DE GESTIÓN DE RIESGOS
- ✓ GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECAÓNICOS
- ✓ GESTIÓN DE PROYECTOS CON MS PROJECT

Foto: Freepik

informes@malbapmc.com

MALBA **PMC**

Capacitación

CARTA DEL DIRECTOR



Estimados amigos:

Estamos muy contentos de presentarles la segunda edición de la revista *Gestiona Proyectos*, que en esta ocasión se ocupa de la gestión de cambios en los proyectos como tema central. Queremos compartir con los gestores de proyectos, y los directores de programas y portafolios, técnicas y herramientas que permitan realizar una gestión profesional de los cambios. Cabe tener en cuenta que estos son prácticamente inevitables y merecen un tratamiento, sea adaptativo o estructurado, para minimizar posibles pérdidas, no solamente económicas, sino en algunos casos también de reputación.

Nuestro tema central es desarrollado de manera integral por autores especialistas, mediante artículos que abordan el tratamiento del cambio como un evento dentro de un proyecto, que además puede conllevar a adaptarse a una nueva forma de trabajo. Es así que en esta edición se incluyen tópicos que abarcan desde la filosofía del cambio aplicada a la gestión de proyectos, hasta herramientas para afrontar estos desafíos, pasando por enfoques y mecanismos de tratamiento, y, por supuesto, por artículos sobre experiencias en proyectos que incluyen el contexto pandémico. Además, todo ello se complementa con información acerca de la gestión de cambios en el equipo de personas de una empresa y su relación con la cultura organizacional.

Es importante resaltar que los cambios se producen tanto en proyectos de enfoque tradicional como en proyectos de tecnología. Lo explica claramente Leonardo Reyes, fundador de PMOOfficers, PMOAcademy y PMOXperience, en nuestra entrevista central. Desde España, Reyes nos brinda pautas y recomendaciones para gestionar proactivamente los cambios y reducir las pérdidas. También aporta conceptos clave para el tratamiento de los cambios, y aclara los roles de los diferentes actores que participan en los comités de cambios, desde los project managers hasta la alta dirección.

Como bono especial, al igual que en nuestra primera edición, podrán descargar plantillas relacionadas, en este caso, a la gestión del cambio. Pueden ubicarlas junto a los artículos, según cada temática específica.

Finalmente, agradecemos a los lectores que se vienen sumando a esta comunidad; a los autores, por su deseo de compartir sus conocimientos; a los editores, que, con su creatividad, nos permiten una lectura agradable en cuanto al contenido y al arte visual; y, en general, a todos los colaboradores que forman parte del equipo de la revista *Gestiona Proyectos*.

Esperamos que disfruten esta segunda edición. ¡Seguiremos trabajando para brindar nuestro aporte a la comunidad de gestores de proyectos!

Con aprecio,

Miguel Ángel Alba Luis

MichaelPage

Parte de PageGroup, es el aliado estratégico que necesitas para gestionar el talento de tu empresa y potenciar tus proyectos.



¿En qué podemos ayudarte?

- ▶ Te asesoramos en la búsqueda de profesionales para posiciones permanentes o temporales.
- ▶ Te acompañamos en el desarrollo de proyectos desde un enfoque 360°.
- ▶ Diseñamos soluciones que se ajustan a las necesidades de tu organización.

Áreas en las que somos expertos:



Proyectos temporales



Tecnologías de la información



Finanzas y Contabilidad



Agroindustria



Marketing



Ingeniería, Construcción, Logística y Manufactura



Minería




Ventas técnicas



Energía

Ingresa a nuestro sitio web y descubre los distintos contenidos y oportunidades laborales que tenemos: www.michaelpage.pe



Director

Miguel Ángel Alba Luis

Autores

Lina María Avendaño Medina (Colombia)

Claudia Draghi (Perú)

Catherine Violeta Cueva Torrico (Perú)

Miguel Ramos Bernales (Perú)

Manuel Orlando Human Chávez (Perú)

Jorge Roger Frank Castro Castillo (Perú)

Javier R. Rodríguez Marrón (Venezuela)

Jose Arturo Palomino Higaonna (Perú)

José Enrique Vásquez Matallana (Perú)

Edición

Mariano Olivera La Rosa

Diseño Gráfico y Diagramación

Harold Carrasco Rodríguez

Asesoría Legal

Dra. Raquel Díaz Gastelu

TEAM BUILDING

COMUNICACIÓN EFECTIVA
GESTIÓN EMOCIONAL
SINERGIA Y CONEXIÓN DE EQUIPO



Foto: Freepik

informes@malbapmc.com

1

CONVERSAMOS CON LEONARDO REYES TORRES

| ENTREVISTA

8

2

LA FILOSOFÍA DEL CAMBIO APLICADA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS

| TENDENCIAS

12

3

LIDERAZGO Y ADAPTABILIDAD

| TENDENCIAS

14

4

¿CÓMO SE GESTIONA EL CAMBIO?

| ACADÉMICO

16

5

UN PROCESO ESTRUCTURADO QUE GENERA VALOR

| ACADÉMICO

18

6

EL ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL Y LA GESTIÓN DE CAMBIOS

| REGULATORIO

20

7

EL PORQUÉ DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS

| EXPERIENCIAS

23

8

MECANISMOS PARA PREDECIR Y MINIMIZAR LOS CAMBIOS

| EXPERIENCIAS

25

9

LA GESTIÓN DEL CAMBIO COMO HERRAMIENTA PARA MEDIR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL

| EXPERIENCIAS

27

10

ASPECTOS RELEVANTES PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE CAMBIOS EN PANDEMIA

| EXPERIENCIAS

29

UNA CUESTIÓN DE ESTRATEGIA



Leonardo Reyes, fundador de PMOfficers, PMOAcademy y PMOXperience, reconoce la importancia de contar con un adecuado enfoque para el tratamiento de los cambios, su gobernanza y políticas asociadas según el tipo de organización. En esta edición nos comenta acerca de la forma de identificar un cambio, las diferencias entre el control de cambios y la gestión del cambio. Además, a partir de su experiencia, brinda recomendaciones para el tratamiento de los cambios según el tipo de proyecto que se aborde.

Por Miguel Ángel Alba Luis

Los cambios en los proyectos son prácticamente inevitables, a pesar de que se cuente con una ingeniería definida, un contrato suscrito luego de un riguroso proceso de adquisición e, inclusive, con las respectivas aprobaciones de las autoridades. Se presentan debido a que, durante la implementación de un proyecto, se producen eventos que el equipo a cargo no puede controlar, tales como nuevas reglamentaciones, cambios de gobierno, condiciones climáticas complicadas y hasta pandemias.

Según el informe Pulse of the profession 2021 del PMI, publicado en marzo de 2021, dentro de las principales causas de falla de los proyectos en empresas a nivel global se encuentran el cambio de prioridades en organizaciones (41%), los cambios en los objetivos del proyecto (38%), la pobre gestión de cambios (24%), entre otras causas. ¿Cómo define un cambio en los proyectos Leonardo Reyes? ¿Cómo podemos afrontar un cambio en un proyecto?

Cuando hablamos de cambios, siempre hablamos de ejecución. En entornos tecnológicos, por ejemplo, se presentan cambios en una actualización de infraestructura de tecnología, base de datos, parte de hardware, en ocasiones debido a la pérdida de la garantía de ciertos productos que dejan de tener soporte técnico.

¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para la gestión de los cambios en proyectos con enfoque predictivo y con enfoque híbrido?

En megaproyectos hay incertidumbre. De acuerdo a mi experiencia, cuando existe una PMO de ingeniería o de una oficina de proyectos, es desde allí que se debe definir la estrategia para atender un cambio. Debe considerarse en qué momento, quién y cómo se pagan los cambios. Si bien se puede hacer un *statement of work* (enunciado de trabajo), en

el que queda especificado todo lo que incluye el proyecto, al principio no se tiene toda la información, lo que significa que durante la ejecución se presentarán cambios con costos asociados. Para ello, a nivel de cartera se va a requerir un colchón económico en un porcentaje que oscila entre el 10% y el 15%, generalmente. Si la afectación es mayor, se tienen pérdidas económicas e, incluso, de relacionamiento con proveedores. En el sector de tecnología hablamos del *product backlog*, es decir, de productos y no de proyectos, y si bien hay incertidumbre, es relativamente más fácil de controlar. Las peticiones del cliente que no estén contempladas inicialmente son cambios que pueden negociarse desde el principio, con una cantidad económica que estime el máximo alcance.

¿Cómo se asocian la gestión de cambios y la gestión de riesgos?

Dentro de la ejecución debe existir un plan de gestión de riesgos por cada proyecto y, a la vez, uno consolidado a nivel de oficina, dado que son dos formas diferentes de gestionar. Por ejemplo, los permisos ambientales pueden solicitarse por un proyecto. Sin embargo, si se encuentran dentro de un megaproyecto gestionado como portafolio, debe considerarse la afectación global para una mejor toma de decisiones y evitar que se suspendan estos megaproyectos o que presenten un coste incremental altísimo, con un impacto de dos mil millones de dólares a cuatro mil millones; o que impacten en entornos tecnológicos por diez millones de dólares. En la identificación se debe verificar si son riesgos transversales o verticales, para tener la visión 360, es decir, la visión de toda la cartera. Además, se deben identificar desde las etapas tempranas. Por ejemplo, a nivel tecnológico en una plataforma de SAP mundial, deben considerarse desde el inicio las monedas (pesos, soles, libras, dólares), la regulación de impuestos y los horarios de cada país. También debe considerarse un análisis cualitativo y cuantitativo que permita

conocer el impacto económico y el atraso sobre el proyecto y la cartera. Seguidamente, debemos tener en cuenta la planificación de la respuesta a los riesgos, para luego, mediante reuniones de seguimiento, darle una visibilidad global de cara a todos los involucrados en todos los niveles. Esto debe determinarse dentro de la estrategia de ejecución en un formato estándar para todos, y después debe obtenerse el consolidado de todos estos proyectos.

"Cuando no tenemos lecciones aprendidas, se presenta un gran problema porque no tenemos en qué basarnos ni de dónde tomar la experiencia".

En su experiencia, ¿existe manera de gestionar los cambios de forma proactiva? ¿Qué prácticas, métodos o herramientas recomendaría?

Definitivamente se deben registrar las lecciones aprendidas que contienen información que ayude en situaciones similares. En el proyecto de implementación de SAP mundial, se puede estimar que la orden de compra tarda tres meses, mientras que en proyectos anteriores toma seis meses; entonces, tenemos oportunidad de realizar una mejor estimación de tiempos y de reducir el potencial problema de la entrega de la infraestructura mediante la orden de compra. Cuando no tenemos lecciones aprendidas, se presenta un gran problema porque no tenemos en qué basarnos ni de dónde tomar la experiencia. Sin embargo, podemos recurrir a las personas con experiencia real, que saben ejecutar, como los project managers, directores de proyectos PMP o similares.

¿Qué aspectos resaltaría de los roles siguientes para la gestión de cambios?: miembros del equipo del proyecto, el

director del proyecto y el comité de control de cambios.

Los roles en el comité de control de cambios deben quedar muy claros. Recomiendo que sea liderado por una persona ajena a todos los proyectos de la organización. En el comité deben presentarse el project manager o director de proyecto y su equipo, con el project manager como la cara visible que se presenta ante el comité con toda la documentación necesaria. Además, deben considerarse unos procesos muy bien definidos con el tipo de plantillas que se tienen que entregar en las herramientas informáticas establecidas. El comité de cambios recibe toda la información de todos los proyectos de una organización. Y si hablamos de grandes organizaciones, puede haber un comité de cambios local o provincial junior o por país, y luego un enterprise corporativo global. Sin embargo, primero tienen que pasar por el local del país. Una de las cosas que debe tenerse muy en cuenta es que hay que llevar toda la información tal y como se la solicita. Hay que saber exactamente qué es lo que vamos a hacer, de manera que sepamos responder cualquier interrogante y no nos devuelvan o rechacen la solicitud, ni tengamos que rehacerla. Los comités de cambios, generalmente, tienen lugar semanal o quincenalmente, dependiendo de la organización, y si no entregamos bien una cosa posiblemente tengamos problemas para salir a producción.

Uno de los principios de la dirección de un proyecto, según la séptima edición de la guía PMBOK 2021 del PMI, señala que se debe "permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto". ¿Cómo se lleva este principio a la práctica?

Sin dejar de lado los principios o mejores prácticas, la mejor manera de lograrlo es preparando un plan de gestión de cambios definido, con una estrategia muy clara y con toda la información previa que se tiene desde

la cartera global, incluyendo plantillas en la forma de presentar, dado que la comunicación es fundamental.

¿Cómo puede ayudar una PMO en la organización para la gestión de los cambios en los proyectos?

Se puede ayudar desde la estrategia, intentando identificar todos los riesgos a nivel corporativo vertical y transversal 360. Es necesario aplicar buenas prácticas para la documentación de todos los cambios del plan y disponer de un plan de comunicación efectivo en todos los niveles. Seguidamente, se debe informar y comunicar a todos los equipos que están dentro de la cartera, de

manera que se tenga toda la información antes de la ejecución, con visibilidad para todos y con herramientas informáticas. Así, se comparte la información a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel de project managers, directores de proyecto, product owners y program managers; y, por supuesto, a la alta dirección, al chief operation officer. Depende de quién es el sponsor de la PMO para que, a su vez, dicho sponsor y la PMO reporten a todo el comité de dirección, al CEO. De esta manera, desde la estrategia, pasando por la táctica hasta la ejecución, la PMO informa a todo el mundo oportunamente, lo que ayuda mucho con miras a la mitigación global e intentar evitar que la organización pierda dinero.



PMOOfficers



PMOAcademy



PMOXperience

LA FILOSOFÍA DEL CAMBIO

APLICADA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS



Lina María Avendaño Medina

Administradora de empresas. Consultora y docente universitaria en Gestión de Proyectos, Estrategia, Liderazgo Consciente, Intra/Emprendimiento, Generación de Consciencia Organizacional - Personal y Habilidades Empresariales. Gerente de Proyectos Estratégicos de Outsourcing Asociados Colombia SAS.

La filosofía es el pilar de la vida en todos sus aspectos. Se aplica a diario, incluso de forma inconsciente, y siempre ha manifestado un interés especial en el concepto del cambio. El griego Heráclito, considerado el filósofo del cambio por su idea dinámica sobre la realidad y su fluir, decía: "lo único que no cambia es el cambio". Aristóteles, por su parte, dedicó tiempo y reflexión al estudio del cambio: manifestaba que todos los seres naturales se encuentran en movimiento.

Más cercanos a nuestros tiempos, reflexionaron sobre el concepto del cambio intelectuales como Karl Marx y el español José Ortega y Gasset. El primero, en relación a la transformación de las sociedades a partir de la acción humana; el segundo, frente a la condición de la vida humana y el sentido de los actos humanos, pues manifestaba que la "esencia" de nuestras vidas es, precisamente, el cambio.

Actualmente, la filosofía contribuye a identificar las fases del cambio para el conocimiento y su gestión. Es en este punto que el ámbito empresarial y la gestión

de proyectos se emparentan con el rubro filosófico. En particular, con la filosofía del cambio y sus aportes para la comprensión y adaptación frente a los escenarios de incertidumbre y situaciones variables propios del entorno en que nos desenvolvemos.

Analicemos los impactos sobre los objetivos, dado que aquellos pueden representar una oportunidad y una ventaja competitiva.



Teniendo en cuenta todo lo anterior, la filosofía del cambio aplicada en la gestión de proyectos puede evidenciarse mediante las siguientes reflexiones:

FILOSOFÍA DEL CAMBIO	REFLEXIONES
Donde existen cambios y proyectos, hay vida.	El cambio puede presentarse en cualquier momento del ciclo de vida de un proyecto.
Se deben afrontar los cambios con optimismo, de forma positiva, con confianza en el equipo de trabajo.	Hay que aceptar los cambios y adaptarse a ellos para avanzar en la gestión y reencaminar los objetivos del proyecto.
Debemos evitar la resistencia al cambio y estar preparados para actuar de forma oportuna.	Es preciso contar con un sistema de control de cambios para atenderlos de manera adecuada.
No subestimemos el aprendizaje que se obtiene gracias al proceso de cambio, aprendizaje que se convierte en el motor para seguir adelante y mejorar como personas y profesionales.	Para la mejora continua de la organización, es importante registrar las lecciones de fallo y logro de cada proyecto.
Para poder cumplir con los objetivos que nos planteamos, debemos ser conscientes de las decisiones que tomamos a diario.	En la gestión de proyectos, los cambios y las decisiones deben registrarse con sus sustentos correspondientes. Y deben realizarse seguimientos de manera permanente.
Ante la presencia de un cambio, reflexionemos sobre el "para qué" en lugar de acerca del "por qué".	Evaluemos el cambio, sus alternativas de solución y su alineamiento con los objetivos del proyecto.
Enfoquemos el cambio como una oportunidad de progreso y de incrementar fortalezas, no como una amenaza.	Analicemos los impactos sobre los objetivos, dado que aquellos pueden representar una oportunidad y una ventaja competitiva.

Es clave tener en cuenta el pensamiento reflexivo, el ser valientes al enfrentar los retos de los constantes y diferentes cambios. Nada como integrar la sabiduría a la vida cotidiana, a la toma de decisiones, para adquirir una perspectiva distinta y vislumbrar nuevas alternativas que contribuyan a sacar adelante cualquier clase de proyecto.

LIDERAZGO Y ADAPTABILIDAD



Claudia Draghi

Business & Team Coach. Docente en Pacífico Business School. Magíster (Summa Cum Laude) en Docencia Universitaria y Gestión Educativa.

El mundo se ha vuelto más complejo y los tiempos de respuesta, más breves. Frente a esta realidad, los líderes, los proyectos y las empresas requieren adaptarse. ¿Cómo pueden los líderes que gestionan proyectos desarrollar la adaptabilidad para avanzar hacia los resultados deseados? A continuación, cuatro claves para asegurar una gestión adaptativa y favorecer la gestión de cambio de nuestros proyectos.

1

Diversidad

El líder del proyecto debe asegurarse de incorporar a su equipo integrantes de diversas culturas, género, raza, orientación sexual y formas de pensar que ofrezcan perspectivas diferentes. Incluir en el equipo a personas con antecedentes y opiniones disímiles permite que se desafíe la preconcepción del proyecto. Para este fin, en las sesiones de trabajo es importante que, ante la evaluación de un cambio en el proyecto, el líder procure la participación de todos. Incluso debe invitar a los que menos participan a dar su opinión y ofrecer su punto de vista. En este sentido, el respeto y la apertura que demuestre el líder serán la fuerza de empuje e inspiración para la adaptabilidad y el surgimiento de nuevas posibilidades de solución frente al cambio evaluado.

2

Mentalidad de aprendizaje

El líder del proyecto debe estar alerta ante la búsqueda de oportunidades para aprender temas nuevos, y registrar y difundir las lecciones aprendidas de los cambios experimentados durante la puesta

en marcha del proyecto. Un líder que promueve el aprendizaje constante dedica tiempo a revisar publicaciones y/o videos relacionados con la industria o el propio proyecto, con miras a conocer las tendencias mundiales y las perspectivas globales que podrían desafiar o contribuir con el proyecto. Antes de iniciar sus sesiones de trabajo, el líder del proyecto debe invertir de diez a quince minutos en compartir artículos o videos que permitan el surgimiento de conversaciones de reflexión estratégica. El fin es favorecer la instauración de una mentalidad de aprendizaje en el equipo, mentalidad que finalmente promueve la mejora continua.

3

Confianza

El líder del proyecto debe propiciar las condiciones necesarias para crear un ambiente de confianza y respeto que favorezca la seguridad psicológica de su equipo. Las personas solo pueden asumir riesgos y expresar puntos de vista impopulares de manera honesta y constructiva cuando sienten que están en un ambiente seguro, en el que son aceptadas y respetadas, aun cuando discrepen de la

opinión general o cometan errores. Pero un líder de proyecto no solo debe promover que los integrantes de su equipo ofrezcan sus opiniones mientras se evalúan los impactos de cambios en el proyecto, sino que, además, debe mantener una actitud positiva cuando dichas opiniones difieran de las suyas. De otro lado, cuando un integrante del equipo falle, el líder debe apoyarlo y propiciar su crecimiento, de modo que convierta el error en una oportunidad para el aprendizaje y la resiliencia. Las preguntas básicas que debe plantear un líder ante un desafío no gestionado adecuadamente son: ¿Qué hicimos bien que debemos mantener? ¿Qué hicimos mal que debemos cambiar? ¿Qué necesitamos hacer diferente para que este evento no se repita? ¿Qué aprendizajes nos deja la situación experimentada?

Agilidad emocional

4 En todo proyecto surgen dificultades; en especial, frente a una situación de cambio. Estancarse en la queja o la búsqueda de culpables no ayuda para nada. Por el contrario, mostrar una mentalidad optimista y un equipo de apoyo sólido resultan mucho más efectivos para encontrar alternativas que permitan salir adelante. Aprender a recuperarse rápidamente cuando las cosas salen mal es una característica de liderazgo y una excelente manera de asegurar la adaptabilidad de un proyecto. Un buen líder debe establecer relaciones bidireccionales,

no solo con su equipo, sino también con los stakeholders del proyecto, ya que son ellos la razón de ser de su existencia y las palancas que permitirán encontrar nuevas formas de alcanzar el éxito. 4. Un buen líder trabaja su agilidad emocional, desarrolla su autoconciencia y es capaz de identificar y mejorar sus reacciones frente a los desafíos que puedan surgir. Al respecto, cabe preguntarse: ¿Cómo reaccionamos normalmente ante una situación de cambio? ¿Qué palabras, acciones y conductas reflejan nuestras respuestas frente a los contratiempos? ¿Estas respuestas nos permiten ser los líderes de proyectos que queremos ser? Si la última respuesta es negativa, entonces debemos autoexaminarnos y trabajar nuestros puntos de mejora.

Si bien es saludable que los objetivos sean el norte de las decisiones, en un panorama incierto y cambiante la adaptabilidad es la cualidad esencial de los líderes de proyectos.

Sin duda, conviene empezar a practicar estas cuatro claves cuando las cosas están en calma, de forma que las podamos utilizar con destreza cuando los verdaderos desafíos toquen a la puerta de nuestros proyectos.



¿CÓMO SE GESTIONA EL CAMBIO?



Catherine Violeta Cueva Torrico

Directora de Desarrollo Profesional PMI Lima. Ingeniera industrial bilingüe con más de once años de experiencia en Gestión de Proyectos y Gestión de Riesgos. Certificación Internacional PMP®, PMI-RMP®, Scrum Máster Profesional. Certificado ISO 22301. Auditora Líder 9001 by IRCA.

Vivimos en una sociedad de cambios constantes y a todo nivel. ¿Por qué en ocasiones nos resistimos a ellos? ¿Cómo asimilarlos de la mejor manera durante la puesta en marcha de un proyecto?

La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross describe, en forma secuencial, las cinco etapas que atravesamos frente a cambios en nuestra vida: i) negación, ii) ira, iii) negociación, iv) depresión, v) aceptación o rechazo. Dichas etapas las experimenta cualquier ser humano ante un proceso de cambio continuo.

A continuación, tres posibles escenarios en los que podríamos afrontar estas cinco etapas:

1 La empresa en la que trabajamos es absorbida por otra o se fusiona con ella, y el plan estratégico de la nueva matriz no se alinea con el proyecto que gestionamos, por lo que este corre el riesgo de ser cancelado.

2 Ante la incertidumbre política y económica actual, la planificación del proyecto en que veníamos trabajando queda en *stand by* hasta nuevo aviso (frecuentemente con plazos indefinidos).

3 Ocurren cambios organizacionales o una reestructuración dentro de la compañía donde llevamos trabajando quince años y los sistemas de gestión obligan al uso de nuevas plataformas informáticas que desconocemos.

Para entender el proceso descrito por Kübler-Ross, analicemos el tercer escenario. Recordemos que la primera etapa es la negación. Es natural que después de quince años nos neguemos o, por lo menos, nos mostramos reticentes a cambiar de plataforma; por ello, es probable que experimentemos ira, pero posteriormente intentaremos negociar el uso de la nueva plataforma o, en su defecto, permanecer un tiempo más con la antigua. En la recta final, nos angustiará o, incluso, deprimirá tener la certeza de que el cambio se dará sí o sí; y, finalmente, aceptaremos o rechazaremos el cambio de plataforma.

Hay personas que pasan de una etapa a otra en cuestión de instantes y terminan aceptando el cambio. Existen otras, sin embargo, que pueden quedarse en la negación por un tiempo prolongado. La velocidad con que transitan de una etapa a otra dependerá de la resistencia al cambio que experimenta cada persona.

A propósito de este fenómeno, surgen dos grandes preguntas de rigor: ¿cómo debemos gestionar los cambios? ¿Cuáles son las estrategias más convenientes para ayudar a las personas a sobrellevar estas cinco etapas de la mejor manera?

En su séptima edición, el PMBOK comparte doce principios sobre la dirección de proyectos. El duodécimo está orientado a la gestión del cambio. Señala explícitamente que "intentar

generar demasiados cambios en un tiempo demasiado corto puede llevar a que se genere resistencia debido a la saturación del cambio". En otras palabras, las directrices que se comuniquen acerca de cambios en una organización deben efectuarse de manera gradual. De este modo, los colaboradores de la organización contarán con mayores posibilidades de asimilarlos.

El objetivo es que el proceso en el que se genera el cambio no traiga mayores complicaciones, más allá de las que un cambio trae consigo por naturaleza.

En la citada guía PMBOK también se menciona que los cambios deben ser comunicados durante su etapa temprana; es decir, lo más pronto posible. Asimismo, es esencial comunicar cuál es la visión del proyecto en cuestión y sus metas asociadas, de modo que cada integrante del

equipo lo conciba con claridad y acepte por qué debe hacer lo que debe hacer.

No hay que olvidar difundir cuáles son los beneficios que producirán los cambios y el impacto que generarán en la organización, para que todos los trabajadores tomen conciencia de ellos y avancen en línea con los objetivos de la organización.

En último término, para gestionar adecuadamente un cambio es recomendable lidiar con él a una velocidad acorde con el aprendizaje y la asimilación de los colaboradores; sobre todo cuando se trata de afrontar grandes cambios. El apetito de cambio y las decisiones organizacionales jugarán un papel importante en relación a este "velocímetro": a veces propiciarán una mayor celeridad o una mayor lentitud, pero nunca cambiará la necesidad de que todas las modificaciones deben comunicarse en una etapa temprana a todas las partes comprometidas en el proceso.



UN PROCESO ESTRUCTURADO QUE GENERA VALOR



Miguel Ramos Bernalles

Profesional en Ingeniería de Sistemas y Gestión de Proyectos de Tecnología. Certificado como PMP y PMI-RMP por el Project Management Institute. Docente en cursos de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI.

El proceso para gestionar cambios debe seguir una serie de pasos y acciones que permitan generar la estructura y las fases adecuadas. En esa línea, los cambios solicitados deben ser evaluados correctamente con el objetivo de identificar el valor y los beneficios que sumarán al proyecto. ¿Qué pautas son necesarias para lograrlo?

La gestión de proyectos supone un esfuerzo superlativo que comprende un gran número de variables y factores, tanto internos como externos, los cuales deben estar en constante integración. La responsabilidad de conseguirlo, en su máxima instancia, recae sobre el director del proyecto, quien debe velar porque todos los elementos encajen en el lugar adecuado, exista una buena coordinación y pueda plasmarse el resultado esperado.

Si bien es cierto que la etapa de planificación es, quizás, la más importante, puesto que en ella se define e identifica el trabajo a realizar y el esfuerzo necesario para ejecutar el proyecto, es básico tener en cuenta que el proyecto dependerá, además, de factores externos sobre los cuales no se tendrá ningún control y podrán originar cambios. Es por ello que, en la etapa de planificación de un proyecto, también debe definirse el proceso, los formatos y la documentación requeridos para gestionar adecuadamente los cambios que puedan presentarse.

Las mejores prácticas de gestión de proyectos siempre brindan recomendaciones y pasos a seguir, de los cuales podemos considerar los siguientes:

1

Establecer un comité de control de cambios. En él deberán participar personas vinculadas al cambio solicitado, o que cuenten con los conocimientos

y la experiencia para analizarlo, con miras a tomar las decisiones adecuadas para aprobar o rechazar el cambio evaluado por el director del proyecto y su equipo. Dado que no es posible saber de antemano qué tipo de cambios pueden presentarse a lo largo de un proyecto, no es posible contar con un grupo definido de personas en este comité, pero sí es necesario identificar a los miembros que disponen del poder formal y legítimo para participar en la decisión final. Por ejemplo, si se solicita un cambio relacionado al presupuesto de un proyecto, se podría pedir ayuda al gerente de Finanzas, quien conoce y maneja todo lo relacionado al presupuesto.

2

Crear los formatos adecuados para las solicitudes de cambio y su registro. La solicitud de cambio

es el formato que deben completar, precisamente, los interesados en realizar el cambio. Debe contener toda la información necesaria que ayude a entender, de forma específica, el cambio, de manera

que pueda analizarse adecuadamente. El registro de cambios, por su parte, es el formato mediante el cual se documentan todos los cambios solicitados, independientemente de si se aprueban o se rechazan (es importante llevar una bitácora de todos los cambios solicitados).

3

Comunicar el proceso de cambio y compartir el formato de solicitud de cambio con los interesados.

Para que los interesados y/o involucrados en el proyecto conozcan del proceso de cambios, hay que explicarles cómo se llevará a cabo y, en especial, cómo debe completarse el formato de solicitud de cambio, de modo que la información que se registre en dicho documento sea la correcta y permita entender fielmente el cambio solicitado.

4

Analizar el efecto de los cambios solicitados en las líneas base del proyecto.

Es necesario que las personas encargadas de analizar y evaluar los cambios estén vinculadas al cambio solicitado, de forma que puedan identificar las implicancias y efectos que estas modificaciones pueden traer consigo. En este análisis también debe evaluarse el valor que genera la implementación del cambio y los beneficios que aporta al proyecto.

5

Informar sobre los cambios implementados.

Uno de los elementos fundamentales para una adecuada gestión de proyectos es mantener una buena comunicación con todos los interesados e involucrados en el proyecto. En ese sentido, es necesario que cualquier cambio aprobado se les comunique previamente.

Es fundamental tener en cuenta que un proyecto dependerá, también, de factores externos sobre los cuales no se tendrá ningún control.

6

Mantener actualizada la documentación en relación a los cambios.

Las mejores prácticas de gestión de proyectos ponen énfasis en la gestión del conocimiento, la cual se refiere al apropiado manejo de la documentación generada a lo largo de un proyecto. En vista de que todo cambio genera un impacto, todos los cambios aprobados e implementados siempre deben reflejarse en la documentación respectiva. Esto permite que puedan consultarse en cualquier momento.



Si necesitas plantillas de solicitud de cambios y de registro de cambios, te ofrecemos estas versiones gratuitas aquí:

Solicitud de cambios

Flujo de control de cambio

EL ANÁLISIS SOCIOAMBIENTAL Y LA GESTIÓN DE CAMBIOS



Manuel Orlando Human Chávez

Ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de Cajamarca. Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental por UEMC. Especialista en Regulación y Fiscalización Ambiental por la UPC. Especialista en Gestión Ambiental.


¿Por qué el análisis ambiental y sociocultural resulta esencial al momento de planificar un proyecto?

Lo evidenciaremos a partir de dos situaciones. Primero, en relación a la definición de proyectos; segundo, a propósito de la gestión de cambios.

El desarrollo de todo proyecto de inversión trae consigo asuntos socioculturales y ambientales que lo acompañan durante todo su ciclo de vida. Por consiguiente, los riesgos de carácter ambiental y sociocultural deben ser identificados y manejados de manera oportuna y formar parte del análisis para la gestión de cambios de cualquier proyecto.

Con respecto a la definición de proyectos, es importante tomar en cuenta las condiciones ambientales y socioculturales del emplazamiento, de tal manera que podamos entender, desde un inicio, la complejidad y magnitud de tal intervención. En otras palabras, el análisis de las alternativas para la definición del proyecto debe contemplar una exhaustiva revisión de las restricciones ambientales y socioculturales que pueden presentarse, de modo que la alternativa elegida resulte viable desde los puntos de vista de ingeniería, ambiental, sociocultural y presupuestal.

Imaginemos que, ante problemas de conectividad entre algunas localidades del oriente peruano, se determina y genera un anteproyecto para la construcción de una carretera que conecte nuevas localidades a través de una vía de 350 kilómetros, con un costo relativo de 400 millones de dólares. Sin embargo, el análisis no considera que dicha carretera se asentaría sobre tres áreas naturales protegidas (ANP), una zona de amortiguamiento (ZA), tres sitios arqueológicos y una reserva indígena; y que, además, tendría que cruzar tres ríos donde se desarrollan actividades de minería ilegal y existe un conflicto entre mineros ilegales y la población indígena del lugar. Este escenario denota muy bajas probabilidades de éxito para el proyecto, ya que, al no haber identificado ni interiorizado presupuestalmente tales riesgos, parte en enorme desventaja.

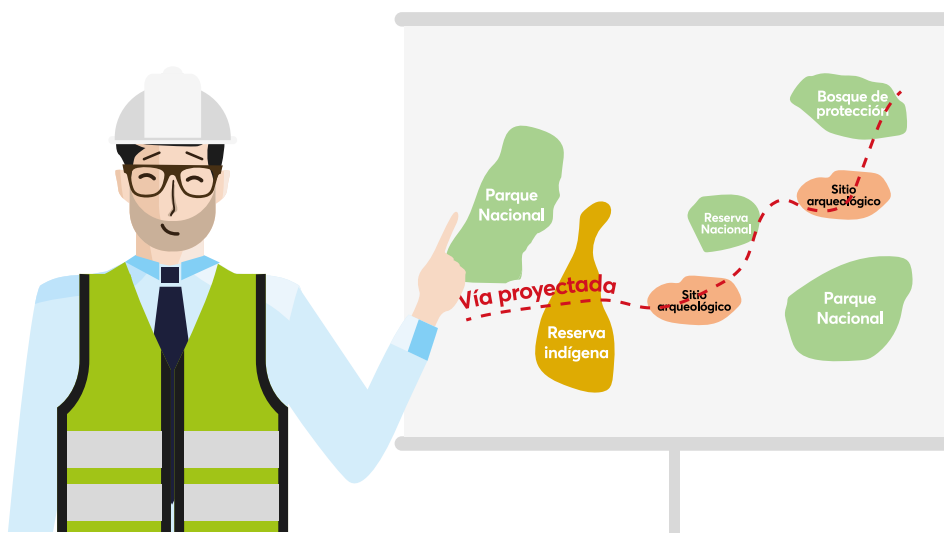

Es por ello que el análisis ambiental y sociocultural resulta vital dentro de la definición de los proyectos de infraestructura: permite entender, en su plenitud, las condiciones reales en las que tendrán que desarrollarse y las restricciones que existen para su materialización. En ese sentido, tanto las entidades encargadas de la determinación de proyectos como las empresas que efectúan procesos de estructuración de ofertas para licitaciones deben contar con un buen soporte que les brinde información precisa sobre las restricciones en materia ambiental y sociocultural. Dicho análisis debe considerar las restricciones normativas, el estado de los ecosistemas y las condiciones sociales y culturales. Esto permitirá garantizar el cumplimiento legal y facilitará la viabilidad sociocultural de los proyectos.

A lo largo de todas las fases de un proyecto surgirán solicitudes de cambio que buscarán mejorarlo.

Pero no debe confundirse el análisis ambiental y sociocultural con el estudio de impacto ambiental. El primero permite obtener información útil para la definición del proyecto y certeza en las ofertas de los postores (en los casos de licitación de proyectos), pero su ejecución no es un requisito establecido en la normativa. El segundo, en cambio, es un documento que resulta necesario para conseguir la certificación ambiental en cumplimiento de la normativa sobre la evaluación del impacto ambiental, para cuya elaboración el proyecto ya debe estar definido.

A propósito de la gestión de cambios, cabe mencionar, en primer término, que el proceso para la atención de las solicitudes de cambio se establece en el Plan de Gestión de Cambios. Es imprescindible que la aprobación, aplazamiento o rechazo de las solicitudes de cambio cuenten con el análisis ambiental y sociocultural de los impactos que generarían. Por esta razón, los directores de proyectos deben asegurarse de que los comités de control de cambios (CCB) incluyan profesionales en gestión ambiental y sociocultural. Esta práctica permite que los cambios aceptados sean ejecutables

desde los puntos de vista ambiental y sociocultural, y previene los retrasos en el cronograma, la paralización de actividades y las renegociaciones de contratos.

Planteemos el siguiente caso: ante la obtención de nueva información acerca de la calidad de los suelos para cimentaciones, el cliente propone a la empresa que ejecuta el proyecto modificaciones relacionadas con el cambio del trazo de una línea de transmisión eléctrica. El director del proyecto somete al comité de control de cambios la propuesta, cuyo análisis previo ha sido realizado por el equipo del proyecto. Dicho equipo es el que determina si es viable o no la propuesta, dado que reduciría el número de torres, aumentaría la distancia de los vanos y permitiría utilizar accesos existentes. No obstante, surge una complicación: llegado el momento de ejecutar los cambios, se dan cuenta de que el trazo modificado está fuera del área de influencia aprobada y, además, atraviesa un ecosistema frágil y un sitio arqueológico, ambos protegidos por la legislación. En este punto, las actividades constructivas se detienen; comienzan las gestiones de las áreas responsables en asuntos ambientales y socioculturales, y la empresa ejecutora manifiesta su necesidad de renegociar los términos del contrato. En paralelo, mientras se definen estos asuntos, surgen impactos en el cronograma de ejecución y sobrecostos por la paralización de los contratistas.

Es en este punto donde se evidencia la importancia de incluir profesionales en temas ambientales y socioculturales en los comités de control de cambios (CCB), dado que permiten el análisis completo de cada cambio propuesto, en beneficio de la viabilidad del proyecto. Debemos tener presente que los asuntos ambientales y socioculturales son inherentes a cada proyecto y se manifiestan en todas sus etapas, desde los procesos preliminares para la determinación del proyecto mismo, hasta su culminación, pasando por las fases de inicio, planificación, ejecución, control y cierre.

Evitemos que un proyecto fracase debido a que no se identifican de manera oportuna las restricciones ambientales y socioculturales del medio en que pretenden llevarse a cabo.



4000
ALUMNOS
CERTIFICADOS

Diplomados y cursos

Más de 14 años capacitando profesionales en América Latina en Dirección de Proyectos, Innovación, Metodologías Ágiles y Transformación Digital.

NUESTROS LIBROS

- ◆ **GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS EN PROYECTOS**
- ◆ **PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS**



EL PORQUÉ DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS



Jorge Roger Frank Castro Castillo

Ingeniero mecánico-eléctrico, MBA, PMP®, Gerente de Proyectos en Siemens SAC (división: Smart Infrastructure. Área: Digital Grids).

Así como en la vida, un proyecto raramente se desarrolla según lo planificado inicialmente, debido a factores externos e internos, no previstos, denominados "riesgos": nuevos requisitos, influencia de los interesados, cambios normativos... Dichos factores pueden afectar de manera positiva (oportunidades) o negativa (amenazas) a los objetivos previamente aprobados.

Allá por enero de 2005, cuando me instalé en Lima para hacer mis primeras prácticas preprofesionales, tuve la suerte de conocer a quien se convertiría en mi esposa... ¡pero vaya que me costó trabajo conquistarla! Ella vivía en la urbanización Matellini, en Chorrillos, mientras que yo vivía en Santiago de Surco, casi al costado de la Base Aérea Militar Las Palmas. A mis veinte años, Chorrillos era, para mí, un distrito inexplorado. En consecuencia, las primeras veces que la invitaba a salir debía hacer algunas "estimaciones" antes de ir a su casa y proponerle alguna actividad interesante.

Es responsabilidad del director del proyecto no permitir que se añada alcance si no se ha cumplido con el debido proceso de control de cambios.

Como no conocía bien la distancia entre Surco y Chorrillos, y no estaba seguro de cuál de las actividades ella aceptaría, debía estar "preparado", tanto económica como mentalmente. Eso significaba disponer del dinero suficiente por si el colectivo demoraba

en pasar y necesitaba tomar un taxi (en ese tiempo aún no existían Uber ni Beat) o estar listo –y medianamente bien vestido para la ocasión– por si decidíamos ir al cine o a bailar, por mencionar solo un par de ejemplos. No obstante, a veces sucedían imprevistos: ella cambiaba de planes, el tráfico no ayudaba o, como alguna vez también me ocurrió, yo tenía que regresar de improvisto a casa porque llegaba uno de mis hermanos de visita y no tenía copia de las llaves. En fin.

Cuando hablamos de proyectos, el punto de vista de que estos deben ceñirse a los planes y compromisos adoptados en las etapas iniciales no es beneficioso para los clientes ni usuarios finales, pues, como apunta la séptima edición de la guía del PMBOK, ello podría limitar el potencial de la generación de valor. Por tanto, es vital saber gestionar los cambios necesarios para adoptar un enfoque de adaptación y resiliencia que, entre otras cosas, permita una mejora y un aprendizaje continuos, disponer de equipos con un conjunto amplio de habilidades, contar con una planificación abierta y transparente para conseguir el compromiso de los interesados y rescatar lecciones aprendidas de proyectos similares.


Sobre la base de lo anterior, el director de un proyecto debe asegurarse de llevar a cabo oportunamente el proceso de "Controlar el Alcance". Para esto debe tener clara la línea base del alcance en sí, a fin de poder medir el desempeño del mismo en función del trabajo ejecutado y la materialización de los riesgos identificados durante la etapa de planificación. Como señala la sexta edición de la guía del PMBOK, también es necesario realizar el proceso de "Control Integrado de Cambios", que, en resumen, significa evaluar el impacto que tendría una solicitud de cambio como respuesta a un riesgo en particular identificado, para determinar si se aprueba y si, como resultado, se requiere actualizar o modificar la línea base, algunos de los documentos o, incluso, el plan para la dirección del proyecto.

Respecto de las posibles actualizaciones de las líneas base de alcance, tiempo y costo, es importante enfatizar que todo proyecto debe contar con reservas de dos tipos: de contingencia y de gestión. Las reservas de contingencia deben ser calculadas en la etapa de planificación del proyecto y son parte de la línea base de costos, mientras que las reservas de gestión, que también se calculan durante la planificación (usualmente como un porcentaje del costo total del proyecto), se añaden a la línea base de costos para obtener el presupuesto del proyecto. Como indica la sexta edición de la guía del PMBOK, el uso de las reservas de gestión normalmente requiere la aprobación de la Gerencia.

Pero no solo se requiere saber gestionar los cambios producto de la evaluación de los riesgos, sino también los cambios propuestos por alguno de los interesados. Es responsabilidad del director del proyecto no permitir que se añada alcance, o se introduzcan cambios al alcance, si no se ha cumplido con el debido proceso de control de cambios.

Finalmente, un motivo esencial de por qué es necesario gestionar los cambios en un proyecto tiene que ver con lo que la séptima edición de la guía del PMBOK define como la "Curva del Costo del Cambio": mientras más tarde se encuentra una desviación o defecto en un proyecto, más cuesta resolverlo. Es decir que implementar cambios resulta más costoso mientras más se tarda en identificar la solicitud para su realización. Además, como las etapas de diseño/planificación y desarrollo suelen ocurrir previamente, mientras más tarde se implementa un cambio, el impacto que genera en un mayor número de interesados tiene más probabilidades de concretarse.

Como seguramente, estimados lectores, habrán leído o escuchado antes: "lo único constante es el cambio". Lo dijo el filósofo Heráclito de Efeso hace más de dos mil años, pero aplica tanto para los proyectos como para la vida misma.

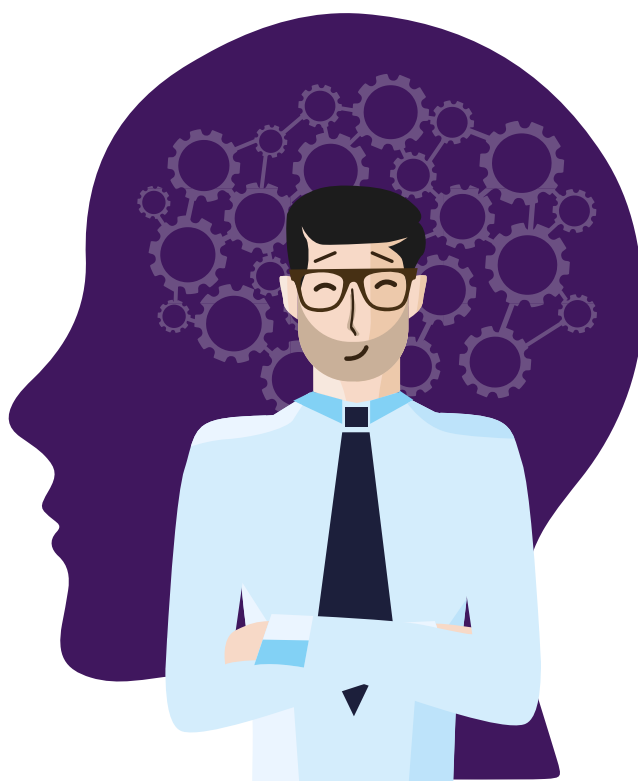

MECANISMOS PARA PREDECIR Y MINIMIZAR LOS CAMBIOS



Javier R. Rodríguez Marrón

Marketing and New Business Management. Gerencia de Comercialización y Nuevos Negocios en Oil & Gas -Engineering & Construction, C.A.

Todo proyecto es susceptible a experimentar modificaciones durante su periodo de ejecución. Estas pueden producirse durante la etapa de ingeniería, construcción u operaciones, y deben ser "procedimentadas", registradas y aprobadas, ya que, dependiendo de su magnitud, afectan y generan impacto en los tiempos de ejecución, costos, riesgos, planificación y recursos del proyecto. ¿Cómo podemos predecir o minimizar dichas modificaciones?

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®, sexta edición, punto 4.6), "realizar el Control Integrado de Cambios es el proceso de revisar todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar cambios a entregables, documentos del proyecto y al plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones".

Antes de implementar un cambio, es crucial contar con instrucciones de campo, las minutas de rigor y las firmas de la gerencia y del cliente.

En el sector hidrocarburos, un ejemplo práctico de un cambio se evidencia en el diseño y dimensión de un equipo y las tuberías de interconexión asociadas a él. En la etapa de ingeniería, el cliente o mandante puede solicitar aumentar la capacidad de manejo de dicho equipo. Esto traería como consecuencia volver a realizar los cálculos y planos para el dimensionamiento del equipo y las tuberías asociadas, cálculos civiles para fundaciones de equipos y soportes de tuberías, y evaluar los cambios que pudieran inducirse en electricidad e instrumentación, con sus posibles consecuencias y afectación a causa del "retrabajo" que se aplicaría en horas hombre (H-H) de ingeniería.

¿Qué buenas prácticas en gestión de proyectos contribuyen a prever o reducir los cambios?


- Uso de tecnología.
- Definición y delimitación adecuadas en el alcance del proyecto.
- Uso de un sistema de gestión de calidad que marque el camino en la gestión del cambio.
- Buen desglose de recursos y actividades en la Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT) reflejada en la planificación.
- Estimación de costos acorde con rendimientos, mano de obra, equipos y herramientas.
- Comunicación efectiva entre el equipo multidisciplinario de trabajo.
- Empleo de herramientas como la digitalización del proyecto.
- Toma de decisiones pertinentes, y aprobadas por el director del proyecto, sobre la base de estudios de medición del grado de definición y completación.

Mediante estas prácticas, el desempeño del proyecto se fortalece y se reducen las modificaciones que podrían poner en riesgo su culminación dentro del marco del contrato.

Es importante mencionar que la solicitud de un cambio implica cumplir previamente con una serie de pasos administrativos, financieros y técnicos apoyados en el Plan de Gestión de Cambios y su afectación en la línea base de alcance, cronograma, costos, trazabilidad de requisitos y un informe de riesgos. Antes de su autorización y ejecución, cualquier cambio en el diseño o construcción de un proyecto debe ser sometido a revisión y aprobación, tanto de parte del gerente del proyecto como de la empresa contratista y del cliente. Los líderes y ejecutores de cada disciplina deben ser informados y evaluar de inmediato los impactos en tiempo y estimación de costos que supone el cambio en cuestión. Esto con miras a realizar la

replanificación y revisión del contrato entre las partes interesadas y asegurarse de que queden todos los registros, fechas y firmas según los niveles de aprobación y la hoja de ruta del documento justificativo del cambio.

Cabe tener en cuenta que, por más pequeños que sean, los cambios causan un impacto indeseado si no se ejecutan a través de los procedimientos adecuados ni son debidamente estudiados, comunicados y autorizados para evitar que se diluyan los esfuerzos y recursos. En este sentido, es esencial que el gestor del proyecto tenga claros los objetivos que persigue, puesto que, a partir de ellos, podrá tomar decisiones que permitan el manejo de la incertidumbre y la realización de los cambios de manera eficaz. Finalmente, la premisa es evitar efectos que puedan salirse de control y no perjudicar el beneficio del cliente y de la entidad contratada.

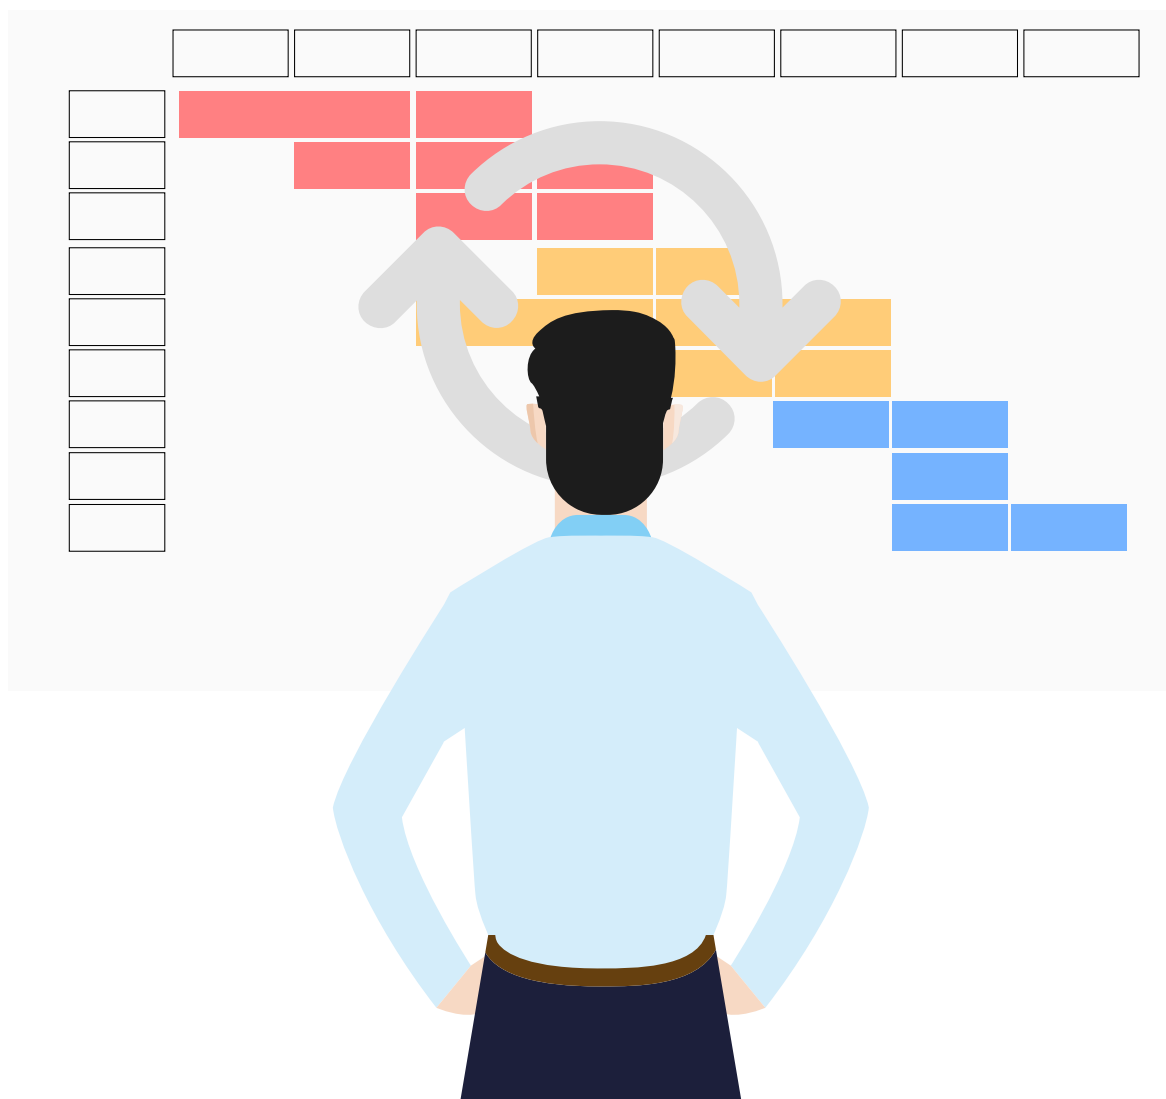

LA GESTIÓN DEL CAMBIO COMO HERRAMIENTA PARA MEDIR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL



Jose Arturo Palomino Higaonna

Ingeniero de Sistemas. Especializado en Gestión de Proyectos de TI, Innovación Digital y Dirección Estratégica, con más de trece años de experiencia facilitando a las organizaciones a lograr sus metas empresariales con ayuda de las tecnologías de información.

*¿Las personas están realmente dispuestas a cambiar la forma en que actualmente ejecutan sus procesos? Es habitual formular esta pregunta en la mayoría de proyectos que he podido liderar. La respuesta, también habitual, es un contundente y certero "sí". Pero la misma seguridad que se tuvo al afirmarlo (por ejemplo, en una reunión de kick off) se va debilitando en el transcurrir del proyecto, e, inclusive, llega a convertirse en un rotundo "no". La interrogante que viene a colación es: **¿qué sucedió durante el transcurso del proyecto para que se invirtiera la predisposición inicial frente al cambio?***

Es importante entender, de manera sencilla, qué significa la gestión del cambio. He identificado que muchos profesionales confunden lo que es una gestión de control de cambios con la gestión del cambio propiamente. La primera se refiere al conocimiento, habilidades y herramientas para hacer frente a requerimientos y/o solicitudes de cambio. La segunda se refiere a la estrategia integral y a la ejecución de acciones concretas que permitan a los miembros de una organización abrazar el nuevo "ser" y "hacer" que el resultado del proyecto traerá a la compañía.

Aclarado lo anterior, vamos al meollo del asunto: ¿por qué, a pesar de que un cambio parece viable y no conlleva ningún grado de complejidad, una organización puede pasar de un optimista "sí cambio" a un contundente "no cambiaré"?

De acuerdo a mi experiencia, este comportamiento es el reflejo real de la cultura organizacional que existe en una compañía, cuya esencia directa son sus colaboradores.

La cultura organizacional representa los valores, principios, costumbres y creencias que definen y caracterizan la identidad de una compañía.


La cultura organizacional, en sencillo, representa los valores, principios, costumbres y creencias que definen y caracterizan la identidad de una compañía, y son los colaboradores quienes llevan esa esencia a la práctica en sus tareas y actividades diarias. En ese sentido, comportamientos como creer de que todo tiene un ciclo y que las cosas cambian; tener la costumbre y el hábito de probar cosas nuevas e innovar; saber que si uno se equivoca o comete un error significa que está aprendiendo y no será amonestado; respetar las opiniones de los demás y tratar a los compañeros, proveedores, acreedores y a toda persona en general con respeto y cariño... todo ello refleja cómo se vive realmente la cultura en una organización.

Como encargado de llevar proyectos de tecnologías de información al logro de sus objetivos (y no me refiero necesariamente al cumplimiento del cronograma, costo y alcance), puedo afirmar que un proyecto es realmente satisfactorio y exitoso cuando:

- Sus resultados consiguen agregar valor diferenciador en la cadena de valor del proceso.
- Generan rentabilidad a corto plazo.
- Impactan positivamente en todos los involucrados en el proyecto.

Contar con un adecuado plan y una correcta ejecución de la gestión del cambio es precisamente lo que nos ayuda a conseguir estos resultados.

En conclusión, cuando inicio un nuevo proyecto hoy en día, siempre formulo la siguiente pregunta: ¿la empresa cuenta con un plan de gestión de cambio para promover y garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto? Sea afirmativa o no la respuesta que reciba, estoy seguro de que, a partir de ese punto, empezaré a conocer y vivir en la práctica la cultura organizacional de la empresa en cuestión.

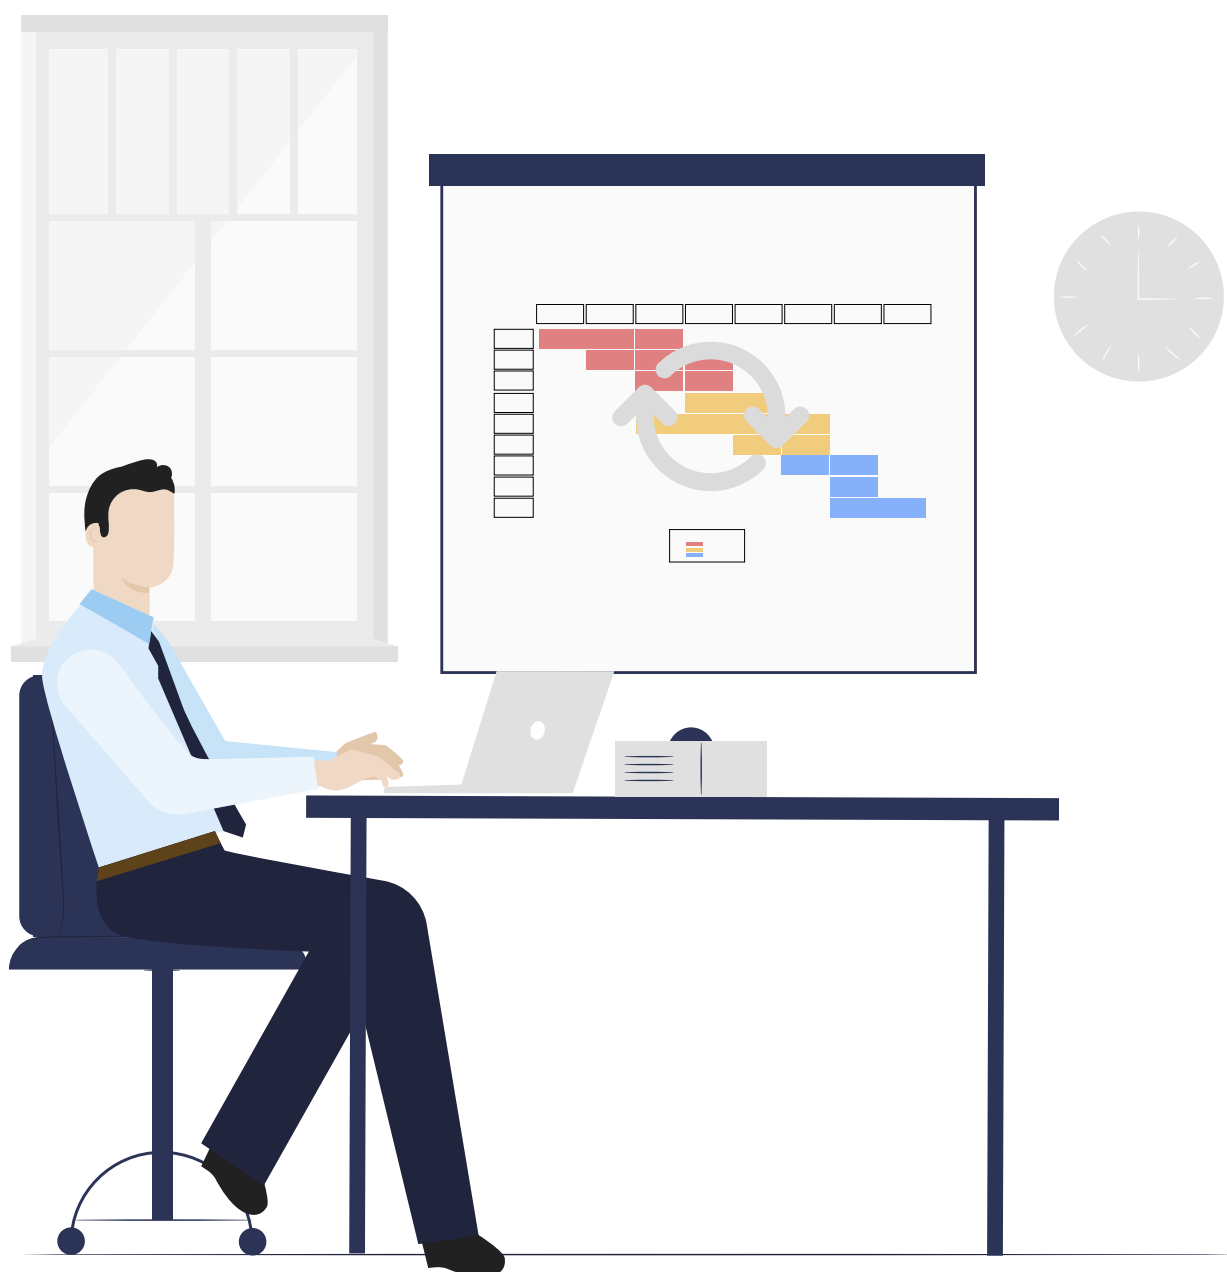

ASPECTOS RELEVANTES PARA UNA EFECTIVA GESTIÓN DE CAMBIOS EN PANDEMIA



José Enrique Vásquez Matallana

Ingeniero Electricista certificado como PMP, con MBA en curso. Magíster en Gerencia de Proyectos. Actualmente se desempeña como Gestor de Proyectos en la Red de Energía del Perú.

Quizás la frase más usada para promover la flexibilidad en nuestros procesos y equipos de trabajo sea la siguiente: "lo único constante es el cambio". Ante ella, surge una serie de interrogantes: ¿cómo procesamos un cambio real? ¿Cuán rápido podemos responder ante cambios inesperados? ¿Estaremos preparados para afrontar un cambio drástico o solo uno paulatino? ¿Qué necesitamos para lograr los objetivos de un proyecto en un escenario cambiante? Estas y otras preguntas cobraron vigencia inmediata desde la aparición del Covid-19. Desde entonces, afrontamos una gestión del cambio constante. En este contexto, brindaré experiencias reales de un proyecto que resultó satisfactorio y fue desarrollado en el Perú para una importante empresa minera.

Se ejecutaba un proyecto de infraestructura eléctrica con alta complejidad técnica, y la empresa minera exigía elevados estándares de calidad y seguridad. En obra se tenían desplegadas más de 450 personas entre staff técnico y profesional, así como maquinaria para la construcción. El proyecto sufría un retraso en su avance físico. A solo dos meses de finalizar su compromiso contractual, quedaba disponible menos del 1% de presupuesto destinado a imprevistos y se venían implementando medidas de recuperación; entre ellas, incorporar recursos calificados para ser destacados a obra.

Destaco tres características irrenunciables de la comunicación: debe ser precisa, oportuna y transparente.

Es en medio de ese nivel de estrés que se presenta la pandemia, se paraliza toda actividad productiva y el Estado peruano decreta el confinamiento nacional. En estas circunstancias, la incertidumbre era una constante. No se tenía certeza sobre el comportamiento del virus, ni de cómo evitar el contagio entre el personal de obra. El Estado peruano emitía constantemente protocolos

de salubridad y todos los integrantes del proyecto dedicábamos esfuerzos para elaborar y hacer cumplir los nuevos protocolos de bioseguridad, asegurar los recursos clave y gestionar la logística necesaria para reiniciar actividades.

Con personal ubicado en campamentos de contratistas, otro grupo fue emplazado a su ciudad natal, sin poder retornar a la obra por restricciones en el transporte. Había personal foráneo dentro y fuera del país, sospechas de contagios, largos periodos de aislamiento y altos costos de servicios: en ese escenario se reiniciaron las actividades de forma paulatina.


Sin embargo, ya en plena actividad, las deserciones, las bajas por contagios, la indisponibilidad de los equipos de trabajo y otras afectaciones impedían mantener el avance de obra constante y, más aún, predecir un rendimiento. Pese a ello, el proyecto logró completar su alcance dentro del nuevo plazo aprobado por el cliente y, aunque se tuvo que disponer de un presupuesto adicional para hacer frente a los costos originados por el Covid-19, se lograron acuerdos satisfactorios con todas las partes.

Esto lleva a destacar cuatro aspectos favorables que permitieron cumplir con los objetivos trazados:

1 Disposición
Declarada la pandemia a nivel mundial, se generaron distintas actitudes en cada interesado del proyecto, según su participación. Por ejemplo, tuvimos contratistas que afrontaron una fuerza mayor, que representaba costos adicionales; un cliente que requería un reinicio inmediato del trabajo; un equipo de dirección presionado por reportar avances, y todo el personal de la obra preocupado por su salud y la de sus familias. Con estas posiciones era prácticamente imposible lograr acuerdos colaborativos. Por ello, para obtener acuerdos favorables de cara al proyecto, fue necesario encontrar una actitud positiva de parte de todos los interesados. Logramos identificar objetivos comunes que se orientaron, primero, a garantizar la salud de todo el personal de campo; segundo, a disponer del recurso clave que garantizara un avance ininterrumpido de los trabajos; y, tercero, a generar un cronograma de actividades que pudiera ser aceptado por el cliente.

Comparto la herramienta que permitió gestionar a los interesados en busca de una participación contributiva:

2 Comunicación
El flujo de información fue multidireccional y ágil entre el cliente, el equipo de dirección del proyecto y el contratista. Este aspecto fue, tal vez, el que más esfuerzo demandó, pero también el que mayores réditos nos dio. Cada coordinación, cambio, anuncio, disposición, solicitud de apoyo o inconveniente era informado de manera inmediata a los interlocutores designados por cada interesado. Esta gestión permitía mantener a los involucrados informados de las gestiones y cambios efectuados en todos los frentes del proyecto. Destaco tres características irrenunciables de la comunicación practicada: fue precisa, oportuna y transparente. La falta de alguna de ellas hubiera afectado directamente a la confianza de los interesados y no hubiera permitido desarrollar la agilidad deseada.

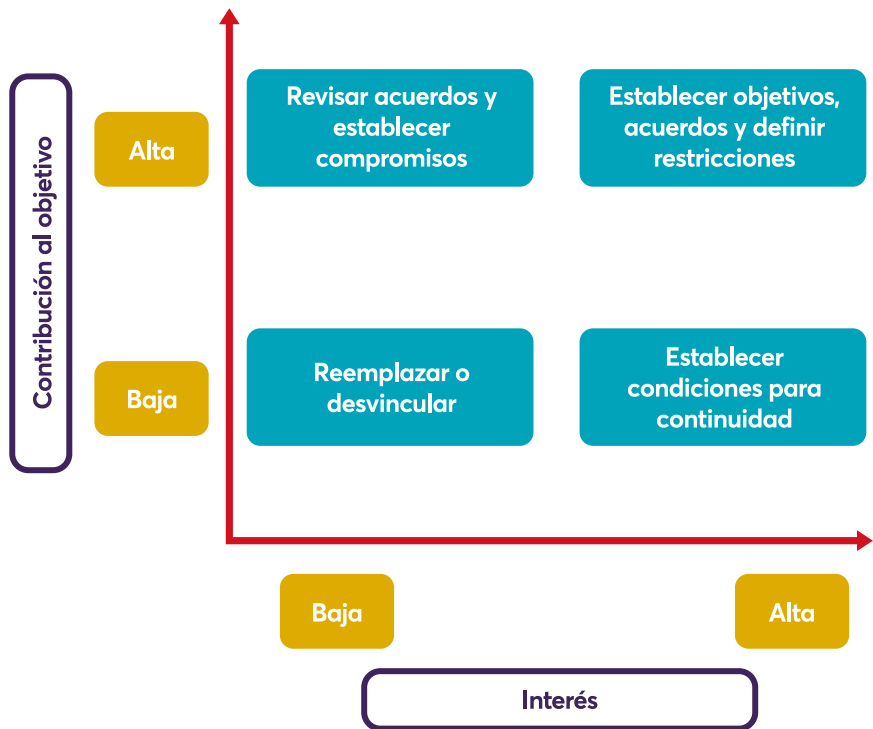

3

Documentación

Llevar un adecuado control de la documentación, sus modificaciones y/o actualizaciones no es novedad para ningún equipo de proyectos; sin embargo, en un escenario donde incluso la forma de trabajar cambia, el registro y control de nuestra gestión debe permitir una trazabilidad de las decisiones adoptadas. En especial, de aquellas que impactan en alguno de los objetivos del proyecto. Así, parte de nuestra experiencia estuvo enfocada en aprender sobre la marcha que, en la agilidad de los cambios, una adecuada gestión documentaria de los mismos permitió acuerdos efectivos con menores impactos negativos.


que nuestro patrocinador se involucrara directamente en la toma de decisiones y promoviera espacios de alineamiento con las gerencias de los otros interesados. Desde la dirección del proyecto se establecieron mecanismos para decidir rápidamente y evitar la burocracia interna, y fuimos convirtiéndonos, junto con los contratistas, en aliados que lográbamos responder a la velocidad requerida y entendíamos el sentido de urgencia de cada gestión a realizar.

4

Decisión

Los aspectos antes mencionados no hubiesen generado resultados positivos si la toma de decisiones no se habría dado de manera ágil. En este sentido, jugó un papel importante

Es primordial tomar en cuenta estos aspectos. Permiten a los equipos de proyectos adaptarse rápidamente a las necesidades exigidas a causa de los cambios y contar, además, con el soporte de la alta gerencia, que facilita tomar decisiones ágiles en un contexto de incertidumbre.

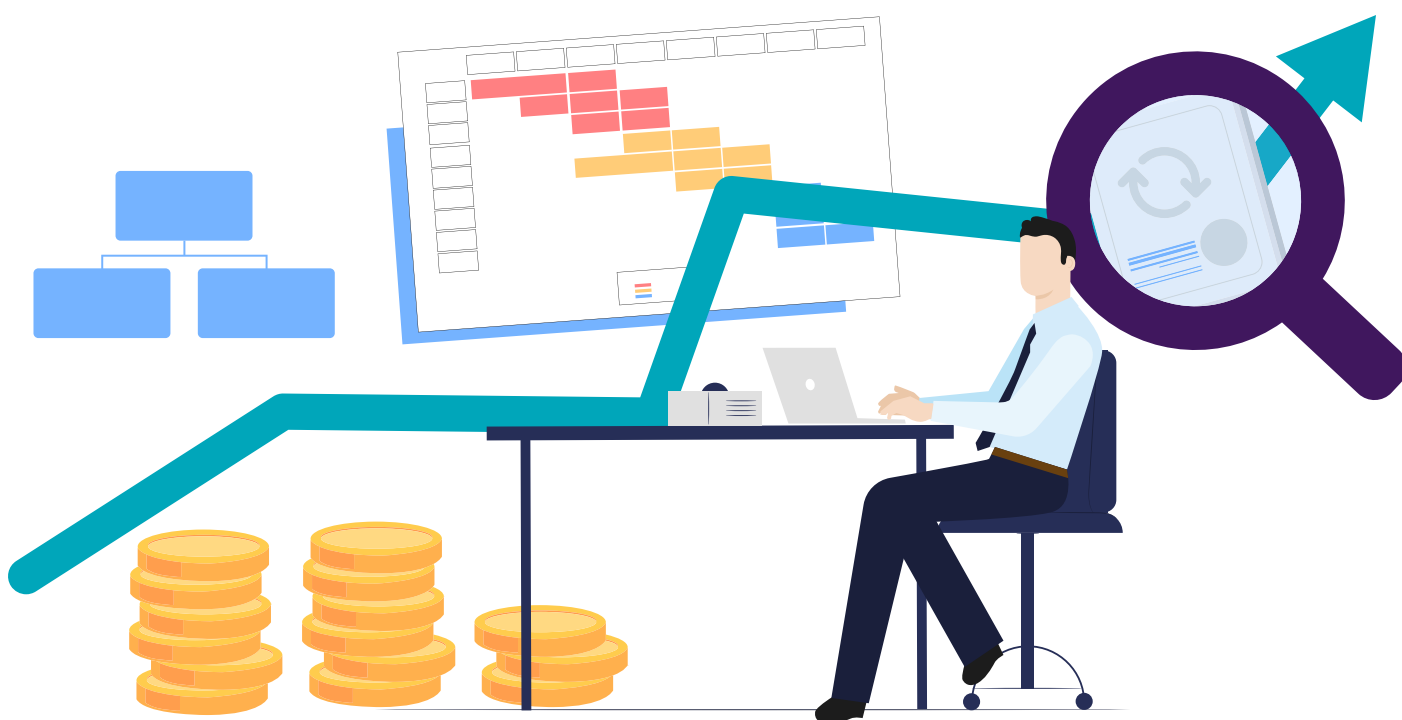

GESTIONA
PROYECTOS

revistagp@malbapmc.com

f / in: Gestiona Proyectos
