

GESTIONA PROYECTOS



GESTIÓN DE RIESGOS

Abril - Mayo 2022

EDICIÓN N°4

EN VIVO

Fusión de habilidades blandas en la gestión de proyectos

Seminario práctico

18 HORAS LECTIVAS

Una reflexión profunda acerca de la relevancia e importancia de integrar, en toda gestión de proyectos, las habilidades esenciales. Su fin es acompañar y complementar a las habilidades duras para lograr los propósitos que toda empresa tiene: productividad, rentabilidad, clima laboral satisfactorio y felicidad en sus colaboradores, entre otros.



Miguel Alba



Lina Avendaño



Sandra Avendaño



FECHAS

Del 1 al 19 de agosto

HORARIOS

Lun, mie. y vie. de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.

CARTA DEL DIRECTOR



Estimados amigos:

Estoy muy contento de compartir conocimiento de interés que aporte a la comunidad de profesionales en gestión de proyectos. En esta ocasión, el tema central que desarrollamos es el de la gestión de riesgos en proyectos.

Los riesgos se encuentran presentes en todos los proyectos y, en su mayoría, amenazan los objetivos comprometidos con los plazos y costos. De hecho, según el informe del PMI 2021, Pulse of the Profession, solo el 62% de los proyectos es completado dentro del presupuesto, mientras que el 55% concluye dentro del plazo. He aquí la relevancia de identificar los riesgos tempranamente e implementar planes de respuesta para reducir la probabilidad de que se produzcan o la magnitud del posible daño. ¿De qué manera? Mediante herramientas y técnicas, pero, sobre todo, con disciplina; vale decir, con metodología, pues, de otro modo, la gestión pierde efectividad.

Por ello, en esta edición los autores comparten su experiencia desde diferentes industrias (energía, petróleo, empresarial, tecnología) y desarrollan tópicos especializados, tales como las estrategias de respuesta ante los riesgos, la gestión de riesgos en entornos cambiantes, la posible afectación a la reputación, la fortaleza de la comunicación, desafíos de tendencia actual y aquellos elementos determinantes en la gestión de riesgos y, consecuentemente, en el éxito de un proyecto.

En nuestra entrevista central, nos acompaña Víctor Gordillo Otárola, gerente de Riesgos del proyecto del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero, en Cusco, quien nos explica la importancia de la gestión de riesgos y los factores clave de éxito, entre los que destaca la comunicación con los interesados y el hecho de contar con una metodología que gobierne los procesos vinculados a todo el equipo de un proyecto. Además, nos brinda importantes recomendaciones para aprovechar los riesgos positivos y la forma de atender uno de los más sensibles en el contexto actual: el riesgo social.

Como en las ediciones anteriores, en esta compartimos con ustedes plantillas referenciales y de uso aplicativo para el registro de riesgos. Podrán descargarlas con la ayuda de las señalizaciones ubicadas al interior de la revista (busquen a nuestros ya conocidos personajes).

Finalmente, quiero expresar mi agradecimiento con ustedes, nuestros lectores. Al cierre de esta edición, ya superamos los mil seguidores en la red LinkedIn. También quiero destacar, una vez más, la buena disposición de nuestros autores, que comparten sus conocimientos y experiencias; y el trabajo de nuestro equipo de edición y gráfico, que hace de la revista un producto de calidad y lectura agradable. En general, gracias a todos los que hacen posible que vea la luz la cuarta entrega de nuestra revista Gestiona Proyectos.

Espero que disfruten de esta edición. Su preferencia nos motiva a continuar compartiendo conocimiento acerca del apasionante mundo de la gestión de proyectos.

Con aprecio,

Miguel Ángel Alba Luis

4000
ALUMNOS
CERTIFICADOS

Diplomados y cursos

Capacitación en Dirección de Proyectos, Metodologías Ágiles, Innovación y Transformación Digital.

NUESTROS LIBROS

◆ **GESTIÓN AVANZADA
DE RIESGOS EN
PROYECTOS**

◆ **PLANIFICACIÓN Y
CONTROL DE
PROYECTOS**



Director

Miguel Ángel Alba Luis

Autores

Lina María Avendaño Medina (Colombia)

Jaime Gustavo Vinueza Cobos (Ecuador)

Catherine Violeta Cueva Torrico (Perú)

Miguel Ramos Bernales (Perú)

Jorge Roger Frank Castro Castillo (Perú)

Javier R. Rodríguez Marrón (Venezuela)

Jose Arturo Palomino Higaonna (Perú)

Edición

Mariano Olivera La Rosa

Diseño Gráfico y Diagramación

Harold Carrasco Rodríguez

Asesoría Legal

Dra. Raquel Díaz Gastelu

CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECAÓNICOS EN ALTA TENSIÓN

ALINEADA AL PMBOK 6TA EDICIÓN

informes@malbapmc.com

1

RIESGO REPUTACIONAL EN LOS PROYECTOS: EL PODER OCULTO

| TENDENCIAS

8

DESAFÍOS PARA LOGRAR UNA CULTURA DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS

| TENDENCIAS

2

10

¿QUÉ HACER PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE MANERA ADECUADA?

| ACADÉMICO

3

12

4 ESTRATEGIAS DE RESPUESTA FRENTE A RIESGOS

| ACADÉMICO

14

5 CONVERSAMOS CON VÍCTOR GORDILLO

| ENTREVISTA

17

EL ENTORNO VUCA Y LA GESTIÓN DE RIESGOS

| EXPERIENCIAS

6

27

GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES

| EXPERIENCIAS

7

30

8 EL RETO DE COMUNICAR EFICIENTEMENTE LOS RIESGOS DE UN PROYECTO

| EXPERIENCIAS

32

RIESGO REPUTACIONAL EN LOS PROYECTOS: EL PODER OCULTO



Lina María Avendaño Medina

Administradora de empresas. Consultora y docente universitaria en Gestión de Proyectos, Estrategia, Liderazgo Consciente, Intra/Emprendimiento, Generación de Consciencia Organizacional - Personal y Habilidades Empresariales. Gerente de Proyectos Estratégicos de Outsourcing Asociados Colombia SAS.

Entre las distintas habilidades que debe tener un líder de proyecto está la de poder identificar, analizar y gestionar los diferentes riesgos que puede enfrentar. Hoy en día, cada vez toma mayor protagonismo el interés genuino por hacer las cosas bien, por tener una responsabilidad social, una buena ética, una buena imagen para mantener una buena reputación. Lo anterior, no solo por convicción personal, sino con la intención de alcanzar los beneficios a largo plazo que esta actitud y prácticas traen consigo: ventaja competitiva, credibilidad, respaldo de la comunidad, lealtad, buenas relaciones, confianza, motivación e, incluso, la aparición de nuevas oportunidades de negocio. Por ello, la gestión del riesgo reputacional adquiere gran importancia, se convierte en un reto y es, a la vez, el poder oculto detrás de cualquier proyecto.

Recordemos que la reputación es la opinión, imagen o percepción que se tiene de algo o de alguien. En la gestión de proyectos, este elemento es de gran valor, ya que está en juego la percepción de todos los grupos de interés, internos y externos, que tienen en cuenta el comportamiento, gestión y resultados del proyecto. Asimismo, el riesgo reputacional es aquel que puede generar una imagen desfavorable de cara a estos mismos grupos de interés, y puede afectar de forma negativa el éxito de cualquier proyecto. Por lo tanto, genera un impacto significativo y la importancia de gestionarlo adecuadamente es clara.

Para enfrentar varios de los riesgos asociados a la reputación es indispensable identificarlos y crear planes de acción, de modo que sea posible lidiar con desafíos como: acciones o relaciones cuestionables, problemas de calidad, fraude, procesos poco transparentes, entre otros. Podríamos pecar por acción o por omisión cuando somos testigos de conductas antiéticas en los proyectos y no tomamos decisiones oportunas al respecto, lo que, además, nos convertiría en cómplices. Por ende, es importante reflexionar sobre nuestro desempeño individual y colectivo, y poner en práctica los principios de las empresas y proyectos conscientes. La reputación en los

proyectos es difícil de medir, pero lo que sí se puede evidenciar son las graves consecuencias, que abarcan la pérdida de credibilidad y de las relaciones con el equipo de trabajo, hasta el fracaso total del proyecto.

Para enfrentar varios de los riesgos asociados a la reputación es indispensable identificarlos y crear planes de acción, de modo que sea posible lidiar con desafíos como: acciones o relaciones cuestionables, problemas de calidad, fraude, procesos poco transparentes, entre otros.

De aquí el llamado urgente a asumir la responsabilidad que tenemos como individuos, profesionales, gestores y líderes de proyectos y empresas, y como miembros de la sociedad. Nos corresponde actuar de forma integral. Al fusionar la honestidad, la credibilidad y la sinceridad, siendo coherentes con nuestros valores esenciales y poniéndolos en práctica, podemos responder a este llamado. En esta misma línea, mantener una buena reputación se

está convirtiendo en la principal característica de un proyecto, y poder sostenerla se convierte, también, en un gran reto, tal y como lo afirma el considerado rey de las inversiones a largo plazo, Warren Buffet: "se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas sobre ello, harás las cosas de forma diferente"

Ante este panorama, ¿cómo podemos fomentar la ética en los proyectos para mantener una buena reputación? Existen varios factores, pero, como mínimo, se deberían tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Generar conciencia en el equipo de dirección del proyecto y áreas transversales, para darnos cuenta, de forma oportuna, de si nuestra conducta en la gestión de los proyectos es buena o mala, de manera que tomemos acciones correctivas, de ser necesario.
- Tener un compromiso y una disciplina permanentes, con la verdad y la honestidad como pilares.
- Alinear los valores personales con los valores del proyecto.

- Identificar dilemas éticos que se puedan presentar de antemano en el proyecto y prepararse para gestionarlos de forma oportuna.

Inspirar con el ejemplo: actuando con amor, empatía, coherencia, honestidad,

- equidad, excelencia y buenos hábitos.
- Tener un manual de ética práctico, coherente y realista.
- No dejar en el olvido la esencia de nuestros valores y la razón de estos a la hora de cumplir con nuestros objetivos.

Para terminar, reflexionemos sobre lo siguiente: muchas veces lo que deseamos conseguir va de la mano de nuestros principios éticos y, bajo una buena gestión, ambos se complementan para dar fuerza a cualquier proyecto. Si en el camino aparecen dudas, es bueno hacer una pausa y formularnos esta pregunta: ¿cómo queremos ser percibidos por nuestros clientes, proveedores, colaboradores, equipo de trabajo, competidores, familia y nuestra propia comunidad? La respuesta nos guiará para tomar las acciones y decisiones necesarias, y llevar nuestros proyectos al éxito y reconocimiento que se merecen.



DESAFÍOS PARA LOGRAR UNA CULTURA DE CUANTIFICACIÓN DE RIESGOS



Jaime Gustavo Vinueza Cobos

Ingeniero de Sistemas de la Universidad de Cuenca, Ecuador. MBA por la Universidad Torcuato Di Tella, de Argentina, y magister en Finanzas, con grado de honor, por la Universidad Adolfo Ibáñez, de Chile. Actualmente trabaja como Head of Analytics en Betterfly.

*En este artículo se abordará la problemática de la implantación de una cultura cuantitativa de riesgo en las empresas; se analizarán las posibles razones de su lenta adopción, y **propondremos una serie de pasos para facilitar su implementación.***

Se define como cultura cuantitativa de riesgos a la incorporación de técnicas de simulación y cálculo probabilístico como la manera estándar de manejar los riesgos en una empresa. Su beneficio principal es la capacidad de contestar a preguntas como: ¿cuál es la probabilidad de que mi proyecto se atrase?, ¿cuán probable es que se sobrepase su presupuesto inicial?, ¿en qué riesgos tengo que enfocarme, sobre la base de la simulación de su ocurrencia?

En los más de diez años que llevo en contacto directo con empresas de diversos tamaños e industrias, uno de los denominadores comunes que he encontrado es su clara intención de minimizar la importancia del análisis de riesgos.

En retrospectiva, mal se haría en señalar como culpables a los directivos, a sus estándares y procesos, o a las distintas unidades operativas, teniendo en cuenta que los objetivos del negocio no están directamente relacionados con cuantificar riesgos, sino con incrementar ventas, controlar costos o preocuparse de sus empleados. Vamos a fracasar si intentamos vender la cuantificación de riesgos como algo tan importante y estratégico, en conflicto con todo lo anterior.

Así, se tiene una masa crítica de organizaciones que, si bien cuentan con comités y analizan sus riesgos, toman estas instancias más como checklists por cumplir que como verdaderos momentos de generación de valor. Es esta misma masa la que genera una inercia hacia la inactividad y la baja adopción de estas técnicas. Enumero algunas causas de lo anterior:

- **La falta de recursos**, sean analistas cuantitativos, herramientas de software u otros relacionados. Esto indica que, si bien las empresas tienen interés en el tema, no dan el siguiente paso y se abstienen de comprometerse.
- **La falta de entendimiento**. Se refiere a empresas que, aunque podrían comprometer recursos, no tienen la suficiente comprensión de las ventajas de la cuantificación de riesgos y cómo puede traer grandes beneficios en la toma de decisiones. Son empresas más tradicionales, centralizadas, menos abiertas a nuevas prácticas.
- **La falta de prioridad**, que aplica a empresas que pueden tener recursos, que valoran internamente la disciplina, pero no otorgan el enfoque suficiente al tema para que se concrete. Esto indica que consideran que existen programas de mayor relevancia.

Entre los tres grupos, en mi opinión, hay dos tipos de empresas: las que, a pesar de explicarles los beneficios, no encuentran el valor de estas técnicas; y las que potencialmente adoptarían técnicas cuantitativas de riesgo y les extraerían el mayor valor posible. Es justamente para estas últimas que se presenta una serie de pasos clave para tener éxito en la implementación de una cultura como la que se busca. Son los siguientes:

1 Primeros pasos
Poner los riesgos sobre la mesa, incluirlos en la narrativa, enseñar a la empresa a identificarlos y monitorearlos cualitativamente con escalas simples, del tipo *alto, medio, bajo*.

2 Definir escalas
Se define escalas de fácil comprensión para los riesgos cualitativos, usando órdenes de magnitud: miles, cientos de miles, millones, etc., que respondan más a límites estimados que a rangos predefinidos. Esto aplica a costo y tiempo.


3 Monitoreo frecuente
Una vez identificados los riesgos y sus escalas, se procede a incluirlos en la agenda frecuente de un comité de riesgos. Si bien el mismo comité puede no existir al inicio, el tópico en la agenda debe aparecer en comités ejecutivos y reuniones de área, lo que afianzará los riesgos como un tema estratégico.

4 Cuantificación simple
Cuando la empresa ya incluye y monitorea los riesgos de manera cualitativa, el siguiente paso es encontrar victorias cercanas a problemas en áreas donde existan situaciones puntuales sujetas a resolverse con métodos cuantitativos. Por ejemplo: optimización de operaciones, cálculos de nivel de reservas y capital, predicción de cartera, estrategias de riesgo operativo, entre otros.

5 Implementación
Una vez que la organización encuentra valor en identificar y monitorear riesgos, así como en resolver algunos problemas directos, es hora de mostrar lo ganado y conquistar, una por una, las diferentes áreas que pueden estar sujetas a este tipo de metodologías. Penetrar y diseminar es esencial.

La duración y orden de cada paso siempre se pueden afinar, pero el objetivo seguirá siendo el mismo, dependiendo del grado de madurez, tamaño e industria de cada empresa.

En conclusión, impregnar una cultura de cuantificación de riesgos en una empresa es un desafío complejo, y no existe una fórmula mágica para lograrlo. Sin embargo, existen actividades que, como profesionales, podemos ejecutar, y que nos acercan al estado de evolución donde las técnicas probabilísticas están presentes en todas las decisiones de la empresa. Es nuestra obligación, como práctica de riesgos, presentarlas en nuestras organizaciones y apoyarnos en ellas para extraer el valor tan importante que se devela cuando, de manera constructiva, se funde el mundo empresarial con el científico.

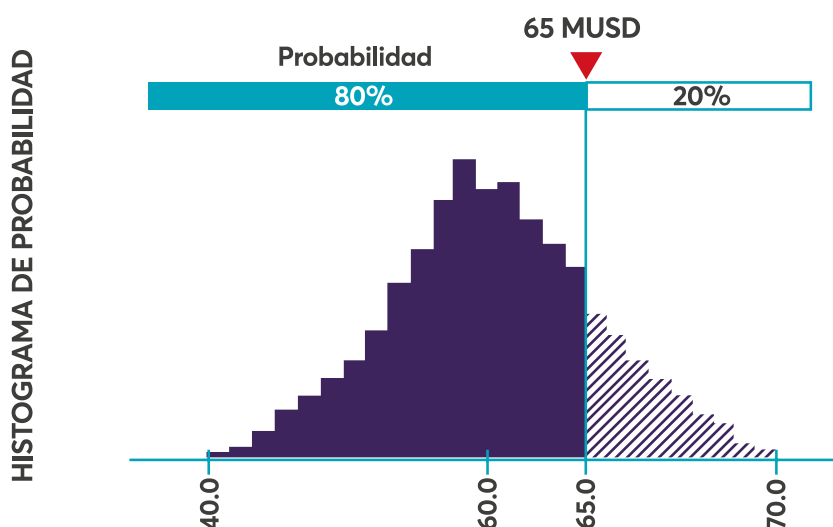

¿QUÉ HACER PARA GESTIONAR LOS RIESGOS DE MANERA ADECUADA?



Catherine Violeta Cueva Torrico

Directora de Desarrollo Profesional PMI Lima. Ingeniera industrial bilingüe con más de once años de experiencia en Gestión de Proyectos y Gestión de Riesgos. Certificación Internacional PMP®, PMI-RMP®, Scrum Máster Profesional. Certificado ISO 22301. Auditora Líder 9001 by IRCA.

Es cierto que todo equipo aspira a que sus proyectos sean exitosos. Con ese objetivo en mente, ¿sabías que aplicar una adecuada gestión de riesgos resulta clave para lograrlo? ¿Cómo podemos gestionar los riesgos de manera correcta?

Para empezar, todos los riesgos identificados deben relacionarse con los objetivos de tu proyecto. Cuando encuentres que un riesgo puede generar un impacto negativo, planifica e implementa una respuesta asociada a dicho riesgo, con el fin de que no se materialice o se reduzca su posibilidad y/o su impacto. De este modo, el objetivo de tu proyecto quedará protegido. Ten en cuenta que la gestión de los riesgos siempre mantendrá a un proyecto en mejores condiciones frente a una eventualidad.

Una de las acciones que funciona bien en estos casos es realizar supuestos o preguntarse: ¿qué pasa si...? Para citar un ejemplo, si el objetivo de tu proyecto es no exceder la línea

base de costos de 50,000 USD y, dentro del presupuesto, 20,000 USD están destinados a la compra de la materia prima; y si, además, el proveedor que proporciona el insumo es el único que está ofertando a ese precio, mientras que los otros proveedores lo suministran por encima del 10%, existe el

La identificación de riesgos no solamente se realiza al inicio del proyecto, sino durante todo su ciclo de vida, como una práctica constante.

riesgo de que, ante una fuerte demanda, el proveedor no mantenga el stock. Frente a este panorama, un plan de respuesta puede ser asegurar la transacción con anticipación, para mantener el precio de compra previsto. De la misma forma, se puede plantear la interrogante ¿qué pasa si...? ante todos los entregables críticos que pudiesen afectar los objetivos de tu proyecto. Esta es una excelente práctica para identificar y plantear potenciales respuestas frente a los riesgos.

La identificación de riesgos no solamente se realiza al inicio de un proyecto, sino durante todo su ciclo de vida, como una práctica constante. Una manera de asegurar esta práctica es considerar, en tu plan de gestión de riesgos, reuniones periódicas para monitorear los riesgos registrados e identificar los nuevos.

Ahora, ¿qué sucedería en el siguiente caso?: Imagina que te encuentras en la etapa de ejecución de tu proyecto y las reuniones de monitoreo e identificación son los viernes a



las 4:00 p.m. Hoy martes, tres días antes de la reunión, descubres un riesgo importante que podría afectar el objetivo de entregar en la fecha planificada; es decir, una de tus actividades en la ruta crítica podría tomar unos días más. ¿Esperarías al viernes para reportar este riesgo? ¿Lo reportarías inmediatamente? En estos casos, se recomienda comunicarlo lo más pronto posible, ya que, mientras más pronto se registra, más pronto se evalúa y se podrá plantear potenciales soluciones con mayor anticipación.

En consecuencia, una buena práctica para gestionar riesgos y acercar un proyecto al éxito pasa por monitorear e identificar los riesgos de manera continua. Debes evaluar la probabilidad de ocurrencia y el impacto, en caso se materialicen, de aquellos riesgos identificados (directamente relacionados con los objetivos de tu proyecto), de modo que pueda plantearse una alternativa de solución para evitar o minimizar su ocurrencia y proteger los objetivos del proyecto. Así, estarás gestionando los riesgos de manera adecuada.

Si necesitas plantillas de registro de lecciones aprendidas, te ofrecemos esta versión gratuita aquí:

Registro de riesgos



ESTRATEGIAS DE RESPUESTA FRENTE A RIESGOS



Miguel Ramos Bernalles

Profesional en Ingeniería de Sistemas y Gestión de Proyectos de Tecnología. Certificado como PMP y PMI-RMP por el Project Management Institute. Docente en cursos de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI.

Si bien es cierto que todos los riesgos son importantes y que hay que gestionarlos efectivamente, siempre habrá algunos más prioritarios que otros. Precisamente sobre la base de la prioridad de cada uno es que deben planificarse las estrategias de respuesta ante el riesgo, para definir cómo reaccionar de la mejor forma posible. Existen muchas estrategias disponibles: elegir la mejor depende de las características de cada riesgo.

La gestión de riesgos es una de las áreas de conocimiento más sustanciales dentro de la gestión de proyectos, la cual ayuda a manejar adecuadamente todos los eventos que pueden generar efectos positivos y negativos, y, de ese modo, crear estrategias idóneas para responder ante ellos.

Se podría decir que todos los riesgos se basan en la incertidumbre, ya que son considerados eventos inciertos que pueden o no materializarse. Por ello, resulta importante que, en primer lugar, se evalúe la probabilidad de ocurrencia del riesgo. A partir de herramientas como la información histórica o el juicio de expertos, esta probabilidad se podría definir en términos de porcentaje equivalente: por ejemplo, hasta 15% podría considerarse bajo; hasta 40%, medio; hasta 60%, alto, y, mayor a 60%, muy alto.

Otra característica que debe evaluarse respecto del riesgo es el impacto o el efecto (sobre los objetivos del proyecto) que este ocasionaría en caso llegara a materializarse. Es necesario que se identifiquen todas las áreas o variables que podría afectar (logística, diseño, social, legal, constructiva, entre otras) y la magnitud de su impacto en el alcance, cronograma, costo, calidad, reputación u otro objetivo declarado en el plan de gestión. Tanto la probabilidad como el impacto servirán para

conocer la prioridad del riesgo y, así, definir estrategias para responder ante él.

Se podría decir que el riesgo que habitualmente se identifica es el negativo, el cual representa una amenaza para el proyecto y, en caso de concretarse, traerá problemas o inconvenientes: todos los esfuerzos de la gestión de riesgos estarán concentrados en gestionar estos eventos de manera preventiva.

El riesgo que habitualmente se identifica es el negativo, el cual representa una amenaza para el proyecto y, en caso de concretarse, traerá problemas o inconvenientes: todos los esfuerzos de la gestión de riesgos estarán concentrados en gestionar estos eventos de manera preventiva.

Pero, además de encontrar las amenazas, también se podrían identificar los riesgos positivos, las oportunidades que, de materializarse, generarán beneficios para el proyecto, tales como ahorro de costos, disminución en los tiempos o mejoras en la calidad.

Estrategia de respuestas frente a amenazas (riesgos negativos)

- **Escalar.** Cuando se habla de escalar, se alude a solicitar apoyo para gestionar un riesgo a una instancia superior del proyecto que pueda tener una mayor capacidad o responsabilidad para hacerlo. Por ejemplo, si el impacto del riesgo afecta a otros proyectos, a las operaciones de la organización o a la misma organización en cualquier ámbito, y las acciones del equipo de dirección del proyecto no han alcanzado los resultados previstos, entonces la gestión de ese riesgo podría escalar a la gerencia general de la organización, de modo que esta pueda encontrar una forma efectiva de responder ante él. Cabe tener en cuenta que el impacto no solo concierne o afecta a un proyecto, sino también a otras áreas de la organización.
- **Evitar.** La estrategia de evitar se refiere a tomar la decisión de eliminar la situación o el elemento que está generando el riesgo. Por ejemplo, si lo que lo ocasiona es la complejidad de elaboración de un entregable, lo cual podría causar un incumplimiento en el cronograma, entonces debería tomarse la decisión de no considerar el desarrollo de dicho entregable como parte del proyecto y, de ese modo, se eliminaría la amenaza, previo acuerdo con los interesados afectados. Por lo general, la estrategia de evitar conlleva realizar algún cambio y su proceso asociado, ya que se elimina un elemento del proyecto.
- **Transferir.** Implica darle la responsabilidad de la gestión del riesgo a un tercero que tenga una mayor capacidad, conocimiento o experiencia en el manejo de dicha situación, lo que normalmente significa un mayor costo. Por ejemplo, cuando se contrata un seguro vehicular ante posibles pérdidas o daños por choques, se le está dando la responsabilidad de manejar el

impacto de dicho riesgo a la empresa aseguradora, que dispone de una mejor capacidad para hacerse cargo de este evento. La subcontratación de un servicio especializado, que conlleva riesgos en su implementación, es otra de las formas de transferir el riesgo a una entidad con mayor experiencia en el manejo de los mismos.

- **Mitigar.** Significa enfocarse en disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto que pueda generar un riesgo. Por ejemplo, se puede contratar a un recurso más experimentado para disminuir la probabilidad de no terminar un entregable a tiempo y, así, evitar el pago de penalidades. Cuando se aplica esta estrategia, es ideal tener en mente un estimado de cuánto se quiere disminuir la probabilidad o el impacto, para elegir la mejor forma posible de hacerlo.
- **Aceptar.** Se utiliza cuando no se encuentra una respuesta efectiva ante un riesgo, o cuando no se tiene control sobre dicho evento y solamente queda aceptar su posible ocurrencia. Se pueden crear planes de contingencia para aplicarlos en caso el riesgo se materialice y cause el impacto identificado.

Estrategia de respuestas frente a oportunidades (riesgos positivos)

- **Escalar.** Cuando el impacto de la oportunidad beneficia a otros proyectos, a la parte operativa o a la organización, y no se logra una gestión efectiva de parte del equipo del proyecto, se escala la gestión del riesgo a una instancia superior para conseguir aprovechar la oportunidad.
- **Aprovechar.** Se utiliza esta estrategia cuando se busca que la oportunidad se concrete. Involucra modificar el proyecto.

- **Compartir.** Tal como su nombre lo sugiere, consiste en compartir el impacto o beneficio de la oportunidad con otras entidades, áreas o grupos que también se puedan beneficiar de él. Siempre es ideal identificar socios con cualidades que potencien el servicio o la oferta de la organización, con quienes se pueda compartir un beneficio para trabajar de forma colaborativa, o conjunta, en un caso de negocio.
- **Mejorar.** Busca aumentar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, así como maximizar el impacto positivo de la oportunidad. Por ejemplo, si se ha identificado que la calidad del producto asegurará negocios futuros con el cliente, se podría invertir en capacitaciones para mejorar los conocimientos y habilidades del equipo de proyecto y, así, optimizar también las opciones de desarrollar entregables de mejor calidad.
- **Aceptar.** Esta estrategia no busca de manera activa que se concrete la oportunidad. Simplemente se trata de esperar a ver si se materializa para poder conseguir el beneficio, que normalmente no es muy atractivo para la organización.

Según el análisis realizado para cada riesgo, y la prioridad que se identifique para cada uno, se podrá elegir la mejor estrategia de respuesta. Siempre hay que tener en cuenta que, cualquiera que sea, conlleva la ejecución de actividades y la utilización de recursos que deberán considerarse tanto en el cronograma como en el presupuesto.



"NO GESTIONAR LOS RIESGOS, O HACERLO DE FORMA DEFICIENTE, CONDUCE AL FRACASO"

Conversamos con Víctor Manuel Gordillo Otárola, gerente de Riesgos del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero, en Cusco, docente universitario de posgrado y coautor del libro "Gestión avanzada de riesgos en proyectos".

Por Miguel Ángel Alba Luis

La gestión de riesgos se analiza en disciplinas como finanzas, ciberseguridad, tecnología, organizacional, operativa, entre otras; y, por supuesto, en proyectos. Es así como KPMG, en su encuesta global 2022 sobre la gestión de riesgos, señala que cerca del 89% de las organizaciones han adoptado una función de riesgo integrado para, precisamente, cubrir toda clase de riesgo. Por su parte, el Foro Económico Mundial, en su Informe de Riesgos Globales 2022, indica que 84% de las personas encuestadas estaban preocupadas por las perspectivas del mundo dadas las afectaciones de la COVID-19. Además, Deloitte, en su encuesta global de riesgo digital, precisa que el 52% de los consumidores se sienten más en riesgo cuando usan servicios en línea, debido a la digitalización acelerada que provocó la pandemia.

Si bien la gestión de riesgos es analizada en diversos campos, estos tienen un fin común, relacionado con identificar situaciones futuras que puedan afectar la economía, la salud o la continuidad del negocio de las empresas. La gestión de riesgos en proyectos no es ajena a este análisis, pues también se tienen objetivos formalmente establecidos en documentos, contratos o acuerdos, sea dentro de una organización o con entidades externas, que deben alcanzarse para obtener los beneficios esperados por los inversionistas, la sociedad, el Estado u otros interesados.

En esta ocasión, conversamos con Víctor Manuel Gordillo Otárola para que, de acuerdo a su amplia experiencia, nos hable acerca de la importancia de una gestión profesional de los riesgos en los proyectos.

Víctor, ¿por qué consideras que es importante desarrollar la gestión de riesgos en los proyectos? ¿La gestión de riesgos asegura el éxito de un proyecto?

La dirección de proyectos tiene varias áreas de especialidad, a las que podemos llamar áreas de conocimiento (como las llama el PMBOK® en su sexta edición) o dominios de desempeño (como las llama el PMBOK® en su séptima edición). Una de esas áreas es la gestión de los riesgos del proyecto. Desde mi perspectiva, tiene una particularidad que la distingue de las demás: se vincula con todas las otras áreas de especialidad, dado que los riesgos se presentan en distintas categorías. Por ejemplo, tenemos riesgos legales, sociales, técnicos, de seguridad y salud, ambientales, de calidad, arqueológicos, de diseño, BIM... entre otros. En tal sentido, considero que la gestión de riesgos es la que tiene más características integradoras y de articulación entre las áreas de especialidad en un proyecto y, por ello, constituye uno de los principales factores de éxito en un proyecto, aunque no asegura el éxito al cien por ciento. Por el contrario, no gestionar los riesgos, o hacerlo de forma deficiente, te conduce al fracaso.

¿Cuál es el rol principal de un gerente de riesgos en un proyecto de construcción? ¿En qué casos debe considerarse un equipo de gestión de riesgos en proyectos?

Esta es una pregunta interesante porque un gerente de Riesgos cumple varios roles. A mi entender, su papel integrador y de comunicación son los más importantes. El papel integrador es fundamental porque se relaciona con absolutamente todas las áreas de especialidad del proyecto. Una visión holística del proyecto es fundamental para un gerente de Riesgos. Ahora, como las condiciones internas y externas del proyecto son cambiantes, el gerente de Riesgos debe garantizar que permitan un flujo de



comunicación continuo, para actualizar de manera permanente la información del estado de los riesgos; es decir, si están activos, inactivos temporalmente o totalmente inactivos. Pero también actualizar, previa evaluación y/o reevaluación, su importancia y prioridad, para así determinar, en cada periodo, cuál es la lista corta de riesgos importantes y urgentes que debemos priorizar y en los que debemos enfocarnos. Precisamente para esto es fundamental que el gerente de Riesgos se apoye en sus habilidades interpersonales y, de manera específica, en la comunicación.

"Cuando hablamos de riesgo, nadie está seguro de que va a suceder o no. Por eso, un factor que lo caracteriza es la probabilidad de ocurrencia, la cual se puede expresar de forma cualitativa y/o cuantitativa".

Con respecto a la pregunta de contar con un equipo de gestión de riesgos, primero hay que señalar que la gestión de riesgos se desarrolla mediante un trabajo en equipo con los responsables de todas las especialidades del proyecto. Esto ya constituye una forma de equipo de riesgos, que algunas veces suele denominarse "comité de riesgos". En esta figura, el gerente de Riesgos es el responsable de definir las directrices y la metodología de gestión de riesgos que se aplicarán en el proyecto, para que todas las especialidades involucradas las usen, generen la información requerida y reporten a la gerencia de Riesgos, de modo que esta centralice toda la información al respecto. Ahora, dependiendo de la magnitud y complejidad del proyecto, el gerente de Riesgos podría tener a su cargo personas de apoyo, con roles, funciones y responsabilidades establecidas, para que ayuden en este esfuerzo de interactuar con las otras áreas de especialidad del proyecto a generar y actualizar la información requerida.

Esto también supone otra forma de entender un equipo de gestión de riesgos.

¿Cuáles son los factores clave para una adecuada gestión de riesgos en proyectos?

La literatura del PMI® habla de seis factores: 1) considerar la gestión de riesgos como un componente de la gestión integral del proyecto; 2) comunicación abierta y honesta; 3) compromiso individual; 4) compromiso de la organización; 5) esfuerzo consistente, que significa que la gestión de riesgos debe ser acorde al tamaño e importancia de los riesgos y del proyecto; 6) debe existir un convencimiento en todos los involucrados, en especial en el equipo del proyecto, acerca del valor que aporta la gestión de riesgos a la gestión integral del proyecto. Para mí este es el factor más destacable, junto con la comunicación: solo así tendremos una comunidad de interesados participando de forma activa y aportando directa e indirectamente a la gestión de los riesgos. A mí me gusta la frase: "¡La gestión de riesgos es responsabilidad y tarea de todos!".

A estos factores que destaca la teoría, desde mi experiencia, les sumaría la necesidad de contar con una metodología de gestión de riesgos única para todo el proyecto, con procedimientos y plantillas adaptadas a las características propias del proyecto: producto, procedimientos y entorno. Desarrollar esta metodología, en principio, es responsabilidad del gerente de Riesgos, quien se apoyará en su equipo para hacerlo. Esta metodología deberá ser difundida y socializada para que todos los involucrados la comprendan y la usen. Es un reto interesante y desafiante porque, como se comprenderá, un proyecto es un trabajo multidisciplinario que integra a profesionales de varias especialidades, con diferentes perfiles y distinta formación académica, algunos con mayor o menor formación técnica y de gestión. Asimismo, la metodología deberá ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno del proyecto, conforme este avanza en su ciclo de vida.

Según el estándar de gestión de riesgos del PMI 2019, como lo acabas de mencionar, uno de los factores clave para la gestión de riesgos es disponer de una comunicación abierta y honesta. ¿Cómo se lleva a la práctica este factor clave?


No debe quedar ninguna duda de que este es uno de los factores más importantes para una adecuada gestión de riesgos. Primero, el gerente de Riesgos es responsable de desarrollar, difundir, entrenar, monitorear y actualizar la metodología de gestión de riesgos del proyecto. Esto define la forma y estructura del trabajo, pero el contenido, la información propiamente dicha, es responsabilidad de todas las áreas de especialidad del proyecto, cada una en su respectivo campo. Es en esta interacción donde este factor se hace más visible y cobra una mayor importancia, porque, si no existe un ambiente de confianza para que los involucrados se comuniquen de manera abierta y honesta, la actualización de la información no será oportuna; será deficiente. Esto conlleva un análisis incorrecto de los riesgos, con resultados de importancia y prioridad poco confiables. Como

consecuencia, el desarrollo e implementación de las estrategias de respuestas será poco eficiente y poco eficaz. Esto lleva a una desconfianza en la gestión de riesgos, que se traduce en una cada vez menor participación de los involucrados y en la consideración de que todo este esfuerzo no aporta valor.


¿Qué mediciones o elementos recomiendas en los reportes periódicos de la gestión de riesgos?

El reporte periódico de los riesgos siempre debe ser una consecuencia de la actualización de la información. Debería contener, sin perjuicio de otros elementos, los siguientes puntos:

- La cantidad de riesgos contenidos en el registro de riesgos, resaltando aquellos que han sido incorporados en el último periodo (riesgos nuevos). La estadística de su respectivo estado: ¿cuántos riesgos están activos, inactivos temporalmente o inactivos permanentemente? Asimismo, la cantidad de riesgos por zonas de importancia y/o prioridad: ¿cuántos riesgos pertenecen a la zona alta, media

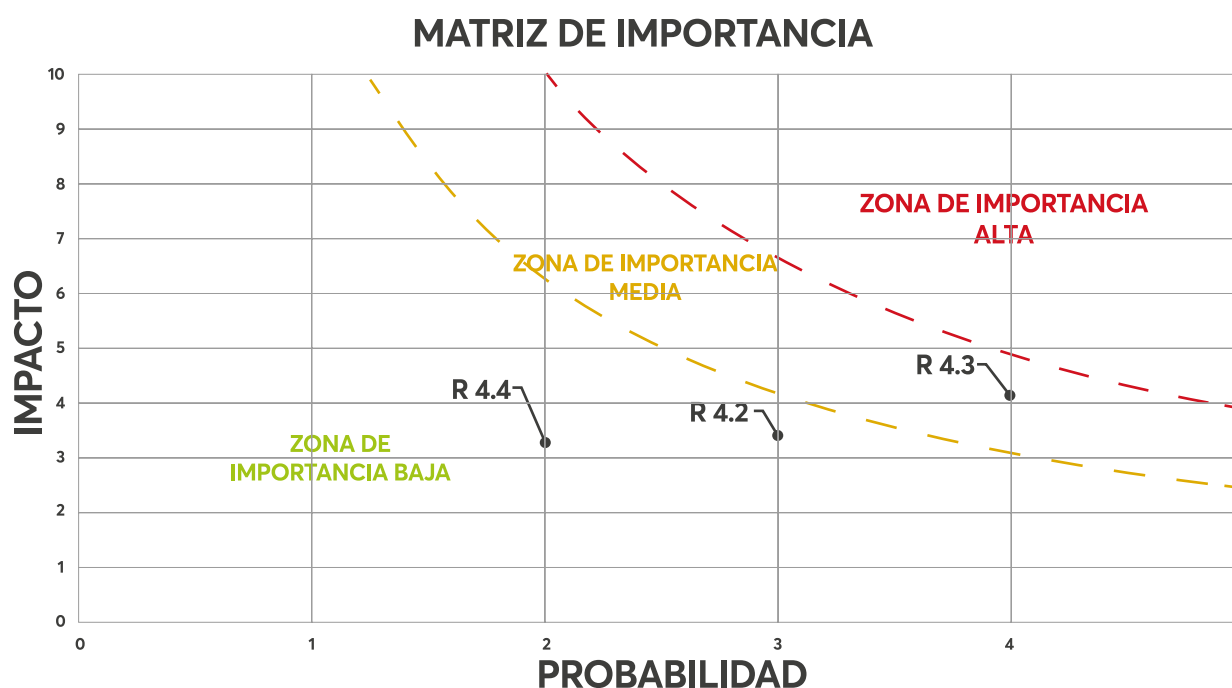

MATRIZ DE PRIORIDAD

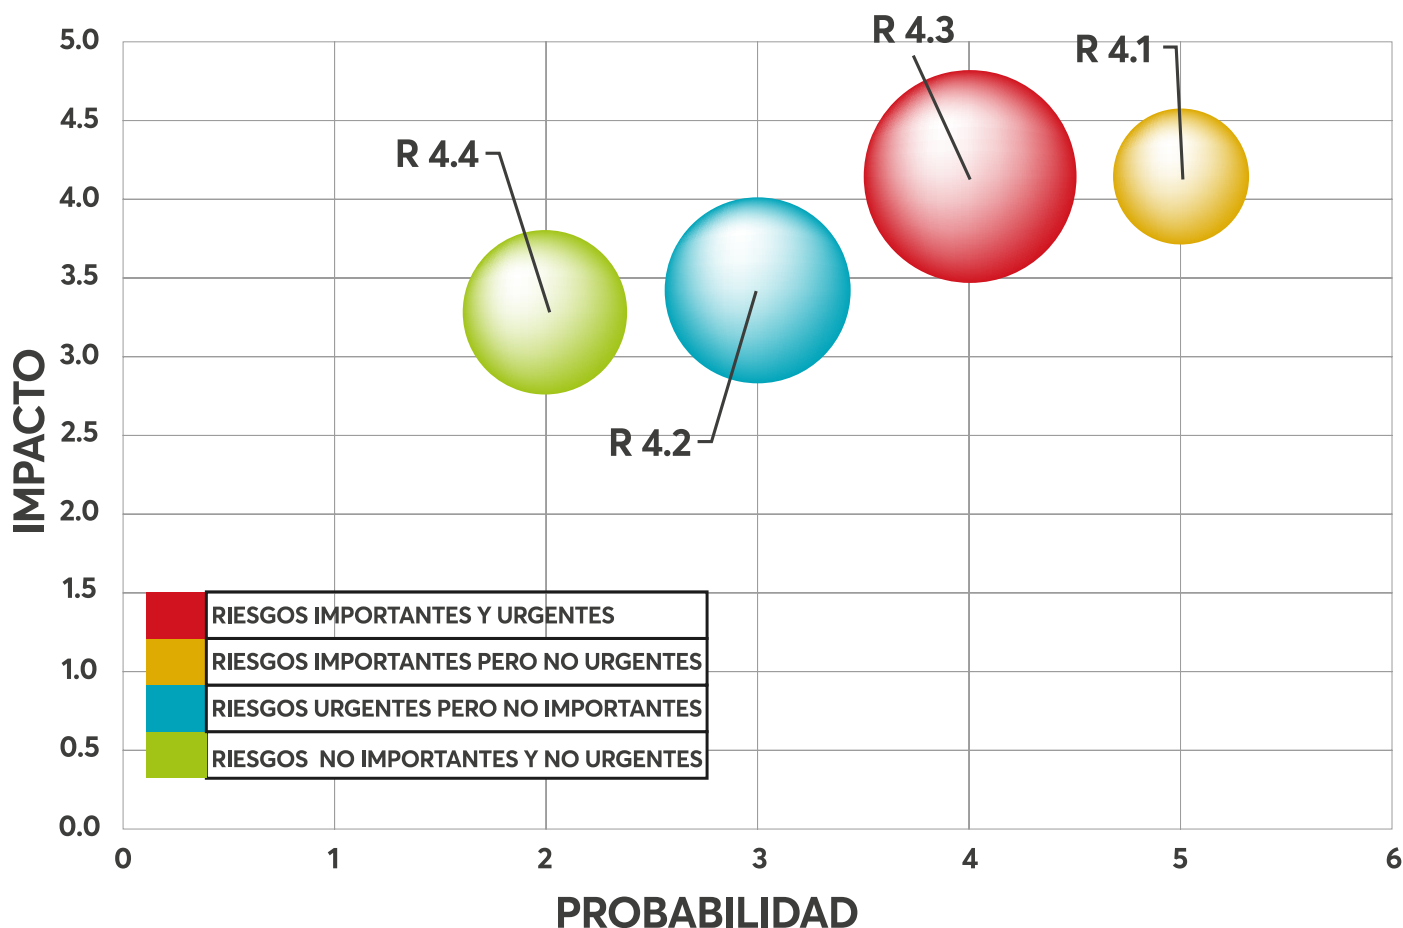

o baja? Toda esta información debe ser brindada en términos porcentuales y absolutos.

Las matrices de importancia (probabilidad vs impacto) y de prioridad (probabilidad, impacto y urgencia). Para esto último es recomendable usar un diagrama de burbujas.

La lista corta de los riesgos prioritarios (importantes y urgentes).

La información detallada de los riesgos prioritarios y el plan de respuesta con sus respectivas acciones. Aquí una sugerencia es usar un tablero Kanban con la lista de acciones hechas (fecha de finalización), en proceso (% avance y posible fecha de finalización) y pendiente (fecha comprometida de fin). También se puede presentar un cronograma de trabajo. Ambas formas resultan útiles.

¿Cómo se puede medir la efectividad de la gestión de los riesgos? ¿Se puede medir el nivel de madurez de la gestión de los riesgos en proyectos?

Desde mi punto de vista, considero que lo más objetivo es medir la efectividad de la gestión de los riesgos a través de la eficiencia y eficacia de las estrategias de respuesta. Para mí, estos dos factores (eficiencia y eficacia) definen la efectividad de cualquier cosa que queramos medir; es decir: si los planes de respuesta acordados para enfrentar los riesgos se han cumplido en lo que se refiere a la implementación de las acciones (indicador de eficiencia) y, además, se ha dado el resultado esperado (indicador de eficacia). Ahora, con respecto al indicador de eficiencia, hay diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un plan de respuesta frente a un riesgo puede contener cinco acciones específicas. La pregunta es: ¿todas las acciones demandan el mismo esfuerzo? En otras palabras, si

se ejecutó completamente una de ellas, ¿podemos decir que el plan avanzó un 20%? Yo creo que no. Por eso, recomiendo que, al desplegar un plan de respuesta con varias acciones específicas, estas sean ponderadas según el esfuerzo que demandan, para una mejor medición del avance y eficiencia del plan.

En cuanto a la medición de la madurez de la gestión de riesgos, yo creo que se podría desarrollar un sistema que permita esta medición o, por lo menos, darnos una idea de cuál es el nivel de madurez que hay en una organización. Algo parecido a lo que, en su momento, desarrolló el PMI® para medir la madurez en la dirección de proyectos: lo que llamó OPM3®. En definitiva, la evaluación de la madurez debería girar alrededor de la evaluación de los procesos de gestión de riesgos que se vienen aplicando y la profundidad o el nivel de detalle que hay en su implementación. Esto significa hacer una revisión minuciosa de las plantillas que se usan, las herramientas y técnicas que se aplican, el nivel de estandarización y flexibilidad de los procesos, las métricas o indicadores que se reportan y los entregables que se obtienen (registro de riesgos, matrices de importancia y prioridad, formatos de seguimiento, actualización y reporte, entre otros).

Muchas veces confundimos riesgo con un problema que viene atravesando el proyecto. ¿Cómo podemos diferenciar estos conceptos?

La forma más sencilla es basarse en la definición conceptual. Un riesgo, en principio, es un evento probable, que potencialmente puede ocurrir y, en caso suceda, podría afectar positiva o negativamente los objetivos del proyecto: alcance, tiempo, costo, calidad. Cuando hablamos de riesgo, nadie está seguro de que va a suceder o no. Por eso, un factor que lo caracteriza es la probabilidad de ocurrencia, la cual se puede expresar de forma cualitativa y/o cuantitativa. De otro lado, un problema es un hecho, algo que ya ocurrió y que tiene implicancias negativas para el proyecto. La relación lógica es que un problema deviene de un riesgo negativo

(amenaza) que se materializó y ocurrió. Por ejemplo, un riesgo podría ser que, debido al incremento de lluvias, las caras de los taludes de corte podrían desmoronarse y, como consecuencia, afectar la calidad del entregable. Ahora, si durante la temporada de lluvias esto llega a suceder y realmente la cara de los taludes se desmorona, independientemente de si se aplicó un plan de respuesta o no, esto ya constituye un problema y, como tal, debe resolverse.

"Un aspecto importante en la gestión de los riesgos sociales es que se gestionen como parte de la gestión integral de los riesgos del proyecto y no de forma aislada, ya que los conflictos sociales afectan a todas las áreas de especialidad del proyecto".

Respecto de los riesgos conocidos y desconocidos, ¿en qué categoría puede ubicarse la pandemia por la COVID-19?

Lo que ocurre aquí es que la definición de un riesgo conocido es aquel que fue identificado y debidamente documentado. Se requieren ambas condiciones (identificación y documentación) para hablar de un riesgo conocido. De otro lado, un riesgo desconocido es aquel que no fue identificado y, debido a ello, no existe formalmente para el proyecto; no está en su registro de riesgos, pero había condiciones para identificarlo y, por temas de desconocimiento, inexperiencia o alta complejidad del proyecto, esto no se pudo hacer. Ahora, existe una categoría de riesgos denominados "de ambigüedad", que recién se incorporó en la sexta edición del PMBOK®. Estos riesgos se definen como aquellos que se desprenden del conocimiento imperfecto de lo que puede suceder en el futuro, cuando no se tienen bases o antecedentes que permitan visualizar ese escenario. Equivale a lo que llamaríamos la incertidumbre. En mi opinión, la situación de la pandemia de la COVID-19

correspondería a este tipo de riesgo. Claro que actualmente no lo llamaríamos así, porque ya ocurrió y, por ende, es un problema que todos estamos tratando de resolver.

Hoy en día, los riesgos sociales pueden llegar a paralizar un megaproyecto o una planta que se encuentra en operación. ¿Qué planes de respuesta pueden sugerirse ante este tipo de riesgos?

Un aspecto importante en la gestión de los riesgos sociales es que se gestionen como parte de la gestión integral de los riesgos del proyecto y no de forma aislada, separada del resto de riesgos, ya que los conflictos sociales afectan a todas las áreas de especialidad del proyecto. Para esto, es muy importante un trabajo permanente, articulado y coordinado con las áreas social, laboral, ambiental, de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST), entre otras. En los proyectos de construcción, en relación a los temas sociales, hay que enfocarse en tres aspectos principales: el comité de obra, la comunidad o comunidades alrededor del proyecto (área de influencia directa) y los sindicatos; y, en la medida de lo posible, evitar que estos temas se mezclen. Hay varios puntos clave a tomar en cuenta para gestionar los riesgos sociales:

- La empatía, para entender las necesidades y requisitos de estos grupos de interés.
- La asertividad en la comunicación, para recibir y transmitir información. Entender que en estos casos los receptores son distintos a aquellos con los que estamos acostumbrados a interactuar en el ámbito interno del proyecto, y es necesaria mucha didáctica en la comunicación.
- La inteligencia emocional, para mantener los canales de comunicación y el diálogo siempre abiertos, sin caer en agresiones de cualquier tipo.
- Mucho trabajo de campo, para comprender y tratar estos temas con la proximidad adecuada. El peor error

que se comete es pretender resolver los conflictos sociales desde el escritorio.

- Es importante tomar como referencia los aspectos contractuales y los instrumentos de gestión ambiental (IGA), pero no ser inflexible y limitarse estrictamente a ellos.
- Respetar absolutamente todos los acuerdos, plazos y compromisos asumidos. Por ello, es importante que quienes gestionen estos temas estén empoderados y tengan el nivel de autoridad para tomar decisiones al respecto.
- Contar con un plan de gestión de conflictos sociales, enfocado en la prevención y la gestión del conflicto, en caso este llegue a ocurrir, con protocolos de comunicación y medidas de control claras y precisas.

"El plan de contingencia tiene una naturaleza un tanto híbrida, ya que es preventivo; se aplica antes de la ocurrencia del riesgo. Pero, al mismo tiempo, es reactivo, porque se aplica luego de la ocurrencia del disparador del riesgo".

En algunas matrices de riesgos, observamos que todos los riesgos implican planes de contingencia. ¿Qué es un plan de contingencia y cuándo debe activarse?

Desde mi punto de vista, los riesgos deben estar asociados a planes de respuesta con su respectivo despliegue de acciones específicas para su implementación, más allá de que estos planes sean de mitigación, de contingencia o de cualquier otro tipo. Lo importante es que el plan de respuesta sea acorde o coherente con el nivel de importancia y prioridad del riesgo. Este es un factor clave para una adecuada gestión de riesgos. También

existe la posibilidad de que los riesgos sean aceptados activa o pasivamente, con lo cual no se desarrolla ningún plan de respuesta frente al riesgo. En el caso de la aceptación activa, no se desarrolla un plan para enfrentar el riesgo, pero sí uno para enfrentar el problema, el cual se implementará cuando el riesgo ocurra y se convierta en un problema. En el caso de la aceptación pasiva, no se elabora absolutamente ningún tipo de plan de respuesta (ni para enfrentar el riesgo, ni para enfrentar el problema).

Como parte del lenguaje en esta especialidad de riesgos, continuamente se escucha que estos deben ser mitigados, como si la mitigación fuese la única forma de responder frente a los riesgos, desconociendo que existen otras alternativas de respuesta. Lo que sí debo reconocer es que la mitigación suele ser la estrategia de respuesta más usada, pero no significa que sea la única.

Ahora, dentro de este contexto de términos, aparece el plan de contingencia y, por lo general, se piensa que este plan es el que se aplica cuando un riesgo ha ocurrido y se ha convertido ya en un problema. Sin embargo, según lo explicado anteriormente, esto corresponde a un plan de aceptación activa y no es correcto llamarlo plan de contingencia. Entonces, ¿qué es un plan de contingencia? Para responder a esta pregunta hay que partir por definir lo que es el disparador de un riesgo. Se trata de un evento relacionado con el riesgo, que representa una señal de alerta que anticipa su posible ocurrencia; es decir, es un evento correlacionado con el riesgo. En caso de suceder, incrementa significativamente la probabilidad de que el riesgo ocurra, lo hace prácticamente inminente (lo que en estadística se conoce como "probabilidad condicional"). Por ejemplo, si el riesgo fuese que debido al incremento del caudal del río, este podría desbordarse y, como consecuencia, dañar la infraestructura de la localidad, un disparador asociado a este riesgo podría ser que la precipitación de lluvias alcance los 50 mm/h.

Entonces, se le llama plan de contingencia a todo plan de respuesta que se diseña para enfrentar un riesgo y cuya condición es que solo será implementado cuando se accione el disparador: la implementación del plan se hará sí y solo sí primero se acciona el disparador. El plan de contingencia tiene una naturaleza un tanto híbrida, ya que es preventivo; se aplica antes de la ocurrencia del riesgo. Pero, al mismo tiempo, es reactivo, porque se aplica luego de la ocurrencia del disparador del riesgo.

"Una sólida formación académica en cualquier especialidad permite a un profesional tener solvencia en la práctica. Sin un sólido respaldo teórico, la práctica cae en el terreno de lo empírico y resta argumento al trabajo que desarrollamos".

De acuerdo a tu experiencia, ¿es posible explotar los riesgos positivos? ¿Qué recomendaciones puedes brindarnos al respecto?

Creo que la idea interiorizada, al menos en nuestro contexto, es que, cada vez que se habla de riesgo, se piensa solamente en lo malo que podría ocurrir y afectar de manera negativa al desarrollo del proyecto. La concepción del riesgo positivo, u oportunidad, está muy poco desarrollada en nuestra cultura de dirección de proyectos, aunque hay casos en el sector público y privado, de los que he sido testigo, donde sí consideran este enfoque, pero se trata más de una excepción que de la regla. De acuerdo con la teoría, la gestión de los riesgos positivos y negativos, en general, es similar en lo que se refiere a los procesos que se deben seguir; es decir, se identifican, analizan, responden, monitorean. Sin embargo, en el detalle sí hay diferencias.

Por ejemplo, en el tipo de respuesta que se puede implementar. Los riesgos negativos se pueden aceptar (activa o pasivamente), mitigar, transferir, evitar o escalar. Los riesgos positivos también se pueden aceptar y escalar; eso tienen en común con los riesgos negativos, pero implican otro tipo de respuesta, como mejorar, compartir y explotar. Evitar riesgos negativos o explotar riesgos positivos son estrategias de respuesta que, en el papel, suenan bien, pero en la práctica no siempre son tan sencillas de aplicar. Evitar un riesgo negativo significa eliminarlo por completo y lograr que su probabilidad o impacto sean nulos; explotar un riesgo positivo, por su parte, es asegurarse de que suceda. Como se entenderá, son situaciones poco comunes, pero ocurren.

"Evitar riesgos negativos o explotar riesgos positivos son estrategias de respuesta que, en el papel, suenan bien, pero en la práctica no siempre son tan sencillas de aplicar".

Si queremos sacar un mejor provecho de la gestión de riesgos, es necesario incorporar, como parte de nuestra identificación y análisis, a los riesgos positivos. Para ello, es fundamental cambiar nuestro chip con respecto de la manera en que concebimos los riesgos. Por ejemplo, al desarrollar esta entrevista, en mi rol de entrevistado enfrente varios riesgos negativos: que mis respuestas no sean precisas y no convenzan a los lectores; que mis respuestas no se ajusten a la rigurosidad de la teoría; que la transcripción no sea exacta, entre otros temas. Pero, al mismo tiempo, hay también riesgos positivos u oportunidades: por ejemplo, darme a conocer en una comunidad más amplia de profesionales en dirección de proyectos, lo que ampliará mi networking; que el enfoque de mis respuestas resulte interesante para los lectores y me inviten a otros eventos académicos, entre

otros. Particularmente, considero que lo mejor es tener un enfoque dialéctico en este tema: nada es solo positivo o solo negativo; esta unidad de contrarios es una característica propia de la naturaleza y, como tal, hay que aceptarla y saberla gestionar.

Finalmente, ¿cómo puede ayudar a los profesionales interesados en la gestión de riesgos una formación especializada en esta materia?

Recuerdo mucho a un profesor de posgrado que solía repetir esta frase: "No hay nada más práctico que una buena teoría". Una sólida formación académica en cualquier especialidad permite a un profesional tener solvencia en la práctica. Sin un sólido respaldo teórico, la práctica cae en el terreno de lo empírico y resta argumento al trabajo que desarrollamos. La gestión de riesgos es muy rica y diversa en la variedad de conceptos que debemos conocer; de ahí que se confundan con mucha facilidad. Hay tres beneficios clave que, considero, brinda una formalización especializada en gestión de riesgos.

1

Permite un mejor dominio y uso de los conceptos y términos propios de esta área de especialidad.

2

Permite conocer distintos enfoques y metodologías de trabajo, lo mismo que herramientas, técnicas para la identificación y análisis de los riesgos, y para la elaboración de los planes de respuesta y el correspondiente monitoreo. En resumen, permite conocer las llamadas "buenas prácticas" en esta área de especialidad.

3

Al ser transversal a todas las áreas de especialidad del proyecto, la gestión de riesgos permite tener una visión más holística e integral del mismo.



**¡Ahora en
español!**

Los miembros
del PMI pueden
descargarlo
gratuitamente

Desde aquí

EL ENTORNO VUCA Y LA GESTIÓN DE RIESGOS



Jorge Roger Frank Castro Castillo

Ingeniero mecánico-eléctrico, MBA, PMP®, docente universitario en Universidad de Piura (UDEP).

Seguramente en alguna ocasión el lector habrá leído o escuchado los términos VUCA (siglas de los vocablos en inglés volatile, uncertain, complex, ambiguous) o BANI (ídem de lo anterior, pero para brittle, anxious, non-linear, incomprehensible), los cuales intentan describir el entorno en el cual se desenvuelven las sociedades en la actualidad. Irónicamente, el acrónimo VUCA comenzó a popularizarse a inicios de la década de los noventa, para hacer referencia a la situación surgida luego de la Guerra Fría, a pesar de que a partir de ese momento la previsibilidad y todo lo opuesto a las siglas que representó dominaron el escenario global por muchos años.

Ironías y vocablos aparte, ¿cómo o en qué momento cambió el mundo? Se podría decir que la respuesta está muy relacionada al tránsito que experimentó el ser humano. Pasó de desarrollarse en entornos locales controlados a hacerlo en escenarios impactados por efectos de las zonas geográficas y las distintas culturas.

Las organizaciones necesitan combatir la ambigüedad con agilidad y una adecuada capacidad de reacción ante imprevistos, siempre alineadas a su estrategia vigente.

Validando la ley de supervivencia del más apto, de autoría de Herbert Spencer, a las organizaciones no les queda más remedio que adaptarse y responder frente a dichos escenarios si desean perdurar, para lo cual necesitan adoptar una visión proactiva ante los riesgos a los que están expuestas constantemente.

En líneas generales, a la ejecución del plan que materializa esta visión se le denomina gestión de riesgos, y es necesario que sea aplicado

no solo a cada proyecto que emprende una organización, sino de manera transversal a todas sus actividades.

Primero que nada, conviene aclarar el concepto de "riesgo", que normalmente es objeto de confusión o prejuicio. Se denomina como tal a todo evento incierto que tiene una determinada probabilidad de ocurrencia e impacto (positivo o negativo) en uno o más objetivos del proyecto. A los riesgos positivos se les suele llamar "oportunidades", mientras que a los riesgos con potencial de impactar negativamente se les conoce como "amenazas". Por tanto, se debe evitar o minimizar el impacto de las amenazas y, al mismo tiempo, activar o maximizar el impacto de las oportunidades.

Toda gestión de riesgos empieza por determinar el apetito y la tolerancia al riesgo que una organización fija para sus proyectos. Partiendo de esta base, cada proyecto debe identificar las amenazas y oportunidades que enfrentará a lo largo de su ciclo de vida. El siguiente paso es seleccionar una metodología adecuada para la evaluación de los riesgos identificados y el plan de respuesta que se adoptará en caso se materialicen. Como bien recomienda la séptima edición de la Guía PMBOK, esta elección tendrá que

sopesar aspectos generales del proyecto, tales como el presupuesto, la duración, el alcance, el tamaño del equipo; así como también asuntos más particulares, como el grado de innovación, tecnología e interfaces y dependencias externas del proyecto que se encuentren en juego.

Algo importante a tener en cuenta es que este proceso de identificación, evaluación y elaboración del plan de respuesta frente a los riesgos identificados es iterativo y no estático. ¿Por qué? La respuesta sencilla es porque las organizaciones se desenvuelven en un entorno VUCA:

- a) La volatilidad del entorno (social, económica, política) genera que la disrupción sea la norma y no la excepción, y deja al descubierto la fragilidad de los sistemas existentes. Para contrarrestar esto, es necesario desarrollar estrategias a corto y mediano plazo y revisarlas periódicamente para comprobar su validez.
- b) El nivel de incertidumbre que genera el estar sometidos a un entorno volátil propicia que las personas experimenten ansiedad, lo cual termina impactando, pues son personas las que trabajan y dirigen las organizaciones. Por tanto, habilidades como la atención plena, la resiliencia y la disciplina adquieren una mayor relevancia y hacen que la

capacitación y actualización profesional, tanto en el campo duro como en el blando, deba ser una constante. Atrás quedó la época en que una persona egresaba de la universidad, conseguía un buen trabajo, realizaba una maestría y no se preocupaba más por su formación.

- c) Vivimos en un mundo donde no hay una proporcionalidad directa entre las causas y las consecuencias, especialmente para los países en vías de desarrollo (donde se puede producir incremento de la canasta básica, inflación, influencia de la tecnología, etc). Esta no-linealidad genera desestabilización y que la gestión de los proyectos en las organizaciones sea más retadora. Ante ello, se impone con urgencia adoptar enfoques sistemáticos que permitan enfrentar la complejidad actual con niveles de claridad y sencillez cada vez mayores. Estos enfoques, cómo no, deben revisarse y ajustarse con la periodicidad debida.
- d) En medio de este escenario complejo, nos encontramos con hechos que escapan a nuestra capacidad de entendimiento. El mundo se ha vuelto ambiguo e incomprensible, dicen algunos, y razón no les falta. Las organizaciones necesitan, entonces, combatir la ambigüedad con agilidad y una adecuada capacidad de reacción ante imprevistos, siempre alineadas a su estrategia vigente.



Las organizaciones deben ser conscientes del entorno en que se desenvuelven y realizar una gestión de riesgos de manera diligente y responsable. El plan de gestión de riesgos de una organización debe ser un documento modular y ajustable periódicamente, mientras que los planes de gestión de riesgos de los proyectos que emprende deben reflejar el espíritu del plan organizacional. La clave reside en ser capaces de involucrar a toda la organización y generar compromiso. Pero... ¿cómo?

Las buenas prácticas documentadas en la literatura de gestión de proyectos sobre este tema incluyen la realización periódica de reuniones de revisión de riesgos ("Risk review meetings") y la implementación de una Oficina de Gestión de Proyectos (conocida

por sus siglas en inglés como PMO). En una reunión de revisión de riesgos, se revisa el estado de los riesgos existentes y, de ser el caso, se puede identificar algún nuevo riesgo. Se revisa, además, el plan de respuesta ante los riesgos, para determinar si aún es vigente o requiere ajustes, así como también se cierran los riesgos inactivos.

Quien se encarga de apoyar y supervisar la gestión de riesgos y otras actividades de soporte a los proyectos, como la planificación y el seguimiento del desempeño, es una PMO proactiva que no se limita únicamente a proporcionar lineamientos, establecer formatos y realizar entrenamientos. Es decir, una PMO de una organización que ha alcanzado la madurez.

ENTORNO CAMBIANTE Y COMPLEJO



GESTIÓN DE RIESGOS EN INSTALACIONES INDUSTRIALES



Javier R. Rodríguez Marrón

Marketing and New Business Management. Gerencia de Comercialización y Nuevos Negocios en Oil & Gas -Engineering & Construction, C.A.

La "Guía de los Fundamentos para la Dirección de los Proyectos" (Guía del PMBOK, séptima edición) define un riesgo como el "evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos". Por su parte, la ejecución de proyectos en instalaciones industriales requiere de aplicar procesos de identificación de riesgos, realizar análisis cualitativos y cuantitativos relacionados con dichos riesgos, planificar respuestas y acciones, e implementar estudios, monitoreo y control de los riesgos. **¿Qué oportunidades y amenazas existen en este rubro?**

En la ejecución de un proyecto, los riesgos siempre existen y se constituyen en eventos o condiciones que pueden ser positivas (cuando permiten evaluar oportunidades de mejora) o negativas (como amenazas que pueden generar consecuencias de tipo económico o financiero, retrasos en el plan de ejecución, costos mayores, alcances no visualizados inicialmente...).

Un factor de vital importancia es establecer las responsabilidades tanto del personal operativo como de los cuadros gerenciales o directivos de la organización. Estos últimos son los encargados de proveer los recursos necesarios para la implementación de acciones preventivas.

En las plantas industriales, los riesgos deben ser evaluados adicionalmente desde el punto de vista de la seguridad industrial, el ambiente y la salud ocupacional de las actividades laborales, considerando los aspectos psicosociales del entorno del equipo

de trabajo. En ocasiones, dependiendo de la estructura organizacional, se crean comités de seguridad, que serán los encargados de revisar las condiciones anteriormente señaladas involucrando a las partes interesadas en la ejecución de los proyectos.

Una de las herramientas usadas para la gestión de riesgos en instalaciones industriales tiene que ver con el manejo del cambio. Por ejemplo, lo vemos en las variaciones en la ingeniería (planos y documentos), actividades de obra (instrucciones de sitio, solicitudes de modificación o cambios de alcance, etc.). Al mismo tiempo, los planes de respuesta preventivos, que permiten controlar este tipo de riesgos, se apoyan en Procedimientos de Trabajo Seguro (PTS), planes de inspección, evaluaciones de ergonomía y puestos de trabajo, Estudios de Impacto Ambiental (EIA), diagramas de flujo de proceso, planes de emergencia y contingencia, filosofía de diseño y operación de las instalaciones industriales, identificación de normas y procedimientos de trabajo aplicables al proyecto en curso, entre otros.

Un factor de vital importancia es establecer las responsabilidades tanto del personal operativo como de los cuadros gerenciales o directivos de la organización. Estos últimos

son los encargados de proveer los recursos necesarios para la implementación de las acciones preventivas y correctivas descritas en los planes de respuesta frente a los riesgos, incluida la mitigación o reducción de los grados de incertidumbre o peligros de las tareas a ejecutar en el proyecto.

Finalmente, en lo que concierne a las instalaciones industriales, cabe destacar que en las etapas de ejecución o ciclo de vida de un proyecto (visualización, conceptualización, definición, implantación y operación) se van desarrollando diferentes estudios que brindan mayor información y favorecen la disminución del grado de incertidumbre. Permiten, así, evitar o minimizar la ocurrencia de incidentes, accidentes, riesgo de salud, riesgos financieros y técnicos en proyectos tales como:

- 1 Evaluación de riesgos financieros (estimación de costos, rentabilidad de la inversión, retorno de la inversión, entre otros)
- 2 Estudio de factibilidad
- 3 Estudios de Impacto Ambiental (EIA)
- 4 Plan de Ejecución de Proyecto (PEP)
- 5 Matriz de tecnología
- 6 Matriz ubicación del sitio de implantación del proyecto
- 7 Análisis Preliminar de Peligros (APP)
- 8 Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)
- 9 Índice de calificación de definición del proyecto (Project Definition Rating Index, PDRI)
- 10 Estudio de peligros y operabilidad (Hazard and Operability Study, HAZOP)
- 11 Análisis de constructibilidad
- 12 Ingeniería de valor
- 13 Evaluación de riesgos de operaciones simultáneas (Simultaneous Operations Risk Assessment, SIMOPS)
- 14 Realización de ensayos, pruebas de arranque y garantías de construcción y operabilidad
- 15 Procedimientos específicos de trabajo



Se precisa que las evaluaciones dependen de la naturaleza y complejidad de cada proyecto, por lo que el equipo debe realizar las adaptaciones o *tailoring* necesarios (según la guía PMBOK, en su séptima edición) para alcanzar los objetivos del proyecto.

Si necesitas plantillas de plan de gestión de riesgos, te ofrecemos esta versión gratuita aquí:

Plan de gestión de riesgos

EL RETO DE COMUNICAR EFICIENTEMENTE

LOS RIESGOS DE UN PROYECTO



Jose Arturo Palomino Higaonna

Ingeniero de Sistemas. Especializado en Gestión de Proyectos de TI, Innovación Digital y Dirección Estratégica, con más de trece años de experiencia facilitando a las organizaciones el logro de sus metas empresariales con ayuda de las tecnologías de información.

Una de las prácticas en el seguimiento y control de la gestión de proyectos es, ciertamente, la identificación, el análisis, la evaluación y el control de los riesgos. Los profesionales en proyectos somos muy eficientes y prolijos en la elaboración de estos documentos y diagramas. Los hacemos según las best practices que nos recomiendan los expertos y la literatura. Sin embargo, en ocasiones, ese excelente trabajo se ve opacado porque no contamos con la habilidad de lograr transmitirlo adecuadamente a nuestros interlocutores.

Como parte del plan de comunicaciones que debo exponer ante el Comité de Directorio del Proyecto, considero incluir, en las presentaciones de Power Point, al menos dos slides acerca de los riesgos identificados hasta ese momento. Uno de ellos los menciona con sus respectivos impactos y planes de mitigación; el otro, con el gráfico que representa su probabilidad versus su impacto. Elaborar el Power Point con el contenido es la parte sencilla de la tarea. La complicada es la preparación previa, durante la cual, tengo que admitir, puedo destinar un tiempo prolongado a encontrar las palabras adecuadas y los tonos correctos, hasta sentirme en confianza y conforme con el discurso que brindaré.

Para los grupos interesados en el negocio, llamados también stakeholders, hablar de riesgos es hablar de la probabilidad de lograr o no con éxito el objetivo y la meta propuestos. Resulta clave cómo comunicamos estos riesgos y cómo ellos interpretan el mensaje.

Comunicar los riesgos de un proyecto ante el Comité Directivo puede derivar en dos situaciones: una favorable (situación deseada) o una de alta tensión emocional (situación no deseada). ¿Por qué sucede esto? Recordemos que los riesgos que vayamos a presentar e informar, con su respectivo plan de mitigación, ante nuestros interlocutores implican, en gran medida, las probabilidades de éxito o fracaso del proyecto en sí. Para los grupos interesados en el negocio, llamados también stakeholders, hablar de riesgos es hablar de la probabilidad de lograr o no con éxito el objetivo y la meta propuestos. Por tanto, cómo comunicamos esto traerá interpretaciones del mensaje y, con ello, alguna de las situaciones descritas.

Estaba nervioso, durante la noche anterior no había podido dormir bien. A tiempo, había logrado armar mi presentación en Power Point y había practicado mi speech con todos los razonamientos para indicar la situación en que se encontraba el proyecto. Pero, aun así, estaba nervioso. El mensaje, en concreto, era que los riesgos tenían una gran probabilidad de ocurrencia e implicaban el impacto de no lograr salir a producción en la fecha establecida en el plan inicial. El factor tiempo y la disponibilidad de las personas en la asignación de sus tareas no se concretaron, lo que perjudicó el cronograma y la finalización de las principales actividades.

—Jose Arturo, ¿estamos listos? Te veo preocupado —me preguntó mi jefe.

—Sí, estoy listo, pero, en efecto, estoy nervioso preocupado. Siento que algo falta en mi speech; tengo la sensación de que estoy llevando un problema, más que una probabilidad de riesgo —le contesté.

—¿Cómo te puedo ayudar? No pudimos ver la presentación antes por no coincidir en tiempos durante la semana; aún tenemos toda la mañana para verla. ¿Deseas revisarla ahora?

—Mmmm... no dudo del contenido de mi presentación de Power Point, sino del mensaje que voy a transmitir. Si me puedes ayudar, te pido podamos hacer una dinámica que me servirá para tener tu opinión y tu perspectiva de mi mensaje. Hagamos la dinámica del *role play*.

El *role play* consiste en una interacción entre personas que toman un rol e interpretan su papel bajo una situación o escenario particular. En sencillo, es como realizar una escena en particular de una obra teatral. Le pedí a mi jefe que él tomara el rol del sponsor del proyecto, una persona que en la compañía tiene la posición de gerente de área y cuya personalidad es analítica, dominante y poco tolerante; pero que, sin embargo, entiende de hechos y de argumentos lógicos. Fue así que separamos una sala de reuniones para tener una ambientación más realista e iniciamos nuestro *role play*.

Luego de unos treinta minutos de dinámica, previos acuerdos y ajustes en nuestros roles para hacerlos verídicos, ya empezaba a descubrir ciertos hallazgos que, durante mi preparación personal, no había tomado en cuenta o había pasado por alto y representaban puntos muy importantes en la secuencia de los hechos hasta la fecha. Logré, entonces, identificar lo que me mantenía nervioso y preocupado.

Ya por la tarde se llevó a cabo el Comité Directivo, y pude hacer mi presentación de acuerdo a la agenda programada. Asimismo,

durante la exposición de los riesgos del proyecto, empezaron a darse situaciones que ya había anticipado con mi jefe al momento de la dinámica. Esto me sirvió para dar respuestas más concretas, lograr resolver ambigüedades, cotejar interpretaciones correctas e, inclusive, lidiar con las intervenciones y aportes de mi jefe durante mi discurso. Al final, logramos “subir al barco” al sponsor y a los principales interesados que asistieron ese día al Comité; conseguimos que todos tuvieran un entendimiento claro de los riesgos y un soporte ante los planes de mitigación presentados, y reforzamos el involucramiento activo en las acciones que se requerían.

Si bien el *role play* ayudó a escenificar la situación y a identificar puntos omitidos por mí, debemos comprender y entender que deben darse otras premisas importantes al momento de comunicar los riesgos. Entre ellas, debemos considerar las siguientes:

1

Los riesgos no son hechos, sino eventos que tienen asociada una probabilidad de ocurrencia y de que se materialicen en hechos desafortunados.

2

Los hechos desafortunados no son riesgos, sino problemas, y, como tales, tienen otro tratamiento de gestión.

3

Todo riesgo lleva un impacto asociado. Este debe traducirse como la consecuencia negativa frente a la obtención del objetivo o meta del proyecto.

4

Todo riesgo requiere de un plan para mitigarlo o minimizarlo. Hay que tener en cuenta que, durante el Comité, se presenta el acuerdo del plan, no se busca elaborar el plan per se.

5

Si el plan de mitigación no logró definirse previamente entre los miembros del equipo, en el Comité se solicita el soporte del sponsor.



Probabilidad		SEVERIDAD				
Improbable	5	5	10	15	20	25
Moderado	4	4	8	12	16	20
Probable	3	3	6	9	12	15
Alto	2	2	4	6	8	10
Extremo	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Nulo	Bajo	Medio	Alto	Extremo
		Impacto				

6 Los riesgos siempre van a existir; la gestión de riesgos permite colocar al proyecto en mejores condiciones en caso aquellos se materialicen. Para ello, se clasifican de acuerdo a su probabilidad e impacto.

7 Los riesgos tienen responsables directos de resolución. No obstante, es compromiso de todo el equipo del proyecto contribuir y aportar en su solución.

Finalmente, recordemos que, según el estándar especializado en riesgos del PMI 2019, uno de los factores claves del éxito en la gestión de riesgos es la comunicación abierta y honesta. Como líderes de proyectos, debemos ser conscientes de que la gestión de riesgos no significa solo identificarlos y elaborar cuadros y diagramas, sino también desarrollar nuestras habilidades y competencias para lograr presentarlos e informarlos de forma precisa, adecuada y eficiente, a fin de que nuestros interlocutores interpreten correctamente nuestro mensaje.

¿Quieres ser parte de las siguientes ediciones de la revista?



Completa el formulario

GP GESTIONA PROYECTOS



EDICIÓN N°3



GP GESTIONA PROYECTOS

revistagp@malbapmc.com

f / in: Gestiona Proyectos
