


GESTIONA PROYECTOS

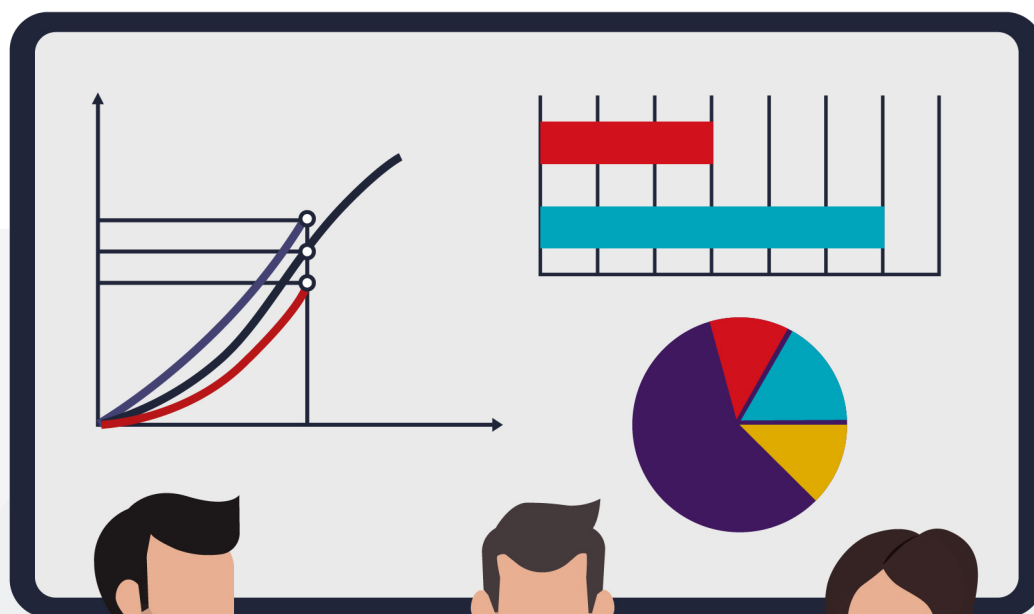

OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS, PMO

Septiembre - Octubre 2022

EDICIÓN N°6

CAPACITACIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECAÓNICOS EN ALTA TENSIÓN

ALINEADA AL PMBOK 6TA EDICIÓN

informes@malbapmc.com

CARTA DEL DIRECTOR



Estimados amigos:

Nos complace presentar la sexta edición de nuestra revista *Gestiona Proyectos*. En esta oportunidad, nos enfocamos en las oficinas de gestión de proyectos, PMO. Cabe tener en cuenta que, hoy en día, las organizaciones evalúan la implementación de una PMO dado el nivel de sus inversiones o el número de proyectos que gestionan en simultáneo. Ya no solo requieren de un lenguaje común, sino de una forma de trabajo estandarizada que permita lograr eficiencias en el uso de recursos para, finalmente, sumar valor a las organizaciones.

Esta tendencia no es exclusiva del sector privado. En el sector público también se promueve la implementación de oficinas de gestión de proyectos; en especial, para los proyectos de infraestructura. Es por ello que en esta edición nuestros autores desarrollan este tema desde perspectivas que incluyen las habilidades a considerar en una oficina de proyectos, la relación entre la PMO y el director de proyectos, y las formas de gestionar una PMO con agilidad. Además, en nuestra sección Tendencias se muestra cómo una PMO puede ser fuente de liderazgo y de transformación, favorable a la gestión del conocimiento e, incluso, una instancia donde articular la estrategia de cada empresa. En la sección Experiencias, en tanto, exponemos las consideraciones a tener en cuenta a la hora de implementar una oficina de proyectos.

En nuestra entrevista central, conversamos con Alexandres Hoyos, director de Consultoría en Practical Thinking Perú y experto en la implementación de oficinas de proyectos, quien nos revela que uno de los factores clave en la implementación de una PMO es que debe satisfacer las necesidades de los interesados y mostrar la entrega de valor de forma continua. Asimismo, nos brinda recomendaciones sobre la implementación de una PMO, los roles de sus integrantes y las metodologías existentes, entre otros aspectos esenciales. Estamos agradecidos con los lectores por sus comentarios y aportes en nuestras redes; con los autores por mostrarnos, en palabras simples, los aspectos relevantes de cada tema central y compartir sus experiencias y perspectivas desde países como Colombia, Venezuela, Perú, Puerto Rico y Bolivia; con el equipo gráfico y de edición de contenido, que favorece la lectura y el desarrollo de cada tema, y, en suma, con todos los que hacen posible la publicación de *Gestiona Proyectos*.

Compartir conocimiento y experiencia en la gestión profesional nos mueve a seguir contribuyendo a la comunidad de gestores de proyectos.

Con aprecio,

Miguel Ángel Alba Luis

4000
ALUMNOS
CERTIFICADOS

Diplomados y cursos

Capacitación en Dirección de Proyectos, Metodologías Ágiles, Innovación y Transformación Digital.

NUESTROS LIBROS

- ◆ **GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS EN PROYECTOS**
- ◆ **PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS**



GESTIONA PROYECTOS

Nº6 - Septiembre - Octubre 2022

© MALBAPMC PROJECT MANAGEMENT CONSULTING E.I.R.L.
Calle Taquitahuana N° 266, Urb. Maranga, San Miguel, Lima (Perú)
Edición Octubre 2022

Director

Miguel Ángel Alba Luis

Autores

Lina María Avendaño Medina (Colombia)

Jorge Castro Castillo (Perú)

Daniel Enrique Muñoz Zaldivar (Perú)

Jesus E. (Nesty) Delgado Moarales (Puerto Rico)

Alexandres Hoyos (Perú)

Jose Luis Apaza Vargas (Perú)

Rocío Rios Rios (Bolivia)

Javier Rafael Rodríguez Marrón (Venezuela)

Julio Regalado Crisanto (Perú)

Edición

Mariano Olivera La Rosa

Diseño Gráfico y Diagramación

Harold Carrasco Rodríguez

Asesoría Legal

Dra. Raquel Díaz Gastelu

Publicación bimestral
ISSN: 2955-8484 (En línea)

Los artículos publicados en esta revista, y la cita de sus fuentes, son de exclusiva responsabilidad de los autores.

PMOfficers, PMOAcademy & PMOXperience Founder

**Strategy, Digital Transformation &
PMO Consultant
Advisor - Trainer - Speaker - Author**



**Leonardo
Reyes**



PMOfficers

1

12 POWER SKILLS A TENER EN CUENTA EN UNA PMO

| ACADÉMICO

8

LA RELACIÓN ENTRE LA PMO Y EL DIRECTOR DE PROYECTOS

| ACADÉMICO

2

10

PMO: ¿UN ELEFANTE EN UNA CARRERA DE CHITAS?

3

| TENDENCIAS

12

4

LA PMO COMO FUENTE DE LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

| TENDENCIAS

15

5

CONVERSAMOS CON ALEXANDRES HOYOS

| ENTREVISTA

17

LA PMO COMO LÍDER DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNA ORGANIZACIÓN

6

| REGULATORIO

21

LA PMO COMO INSTANCIA ARTICULADORA DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

7

| EXPERIENCIAS

24

CÓMO IMPLEMENTAR UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

8

| EXPERIENCIAS

26

9

EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO

| EXPERIENCIAS

29

12 POWER SKILLS A TENER EN CUENTA EN UNA PMO



Lina María Avendaño Medina

Administradora de empresas. Consultora y docente universitaria en Gestión de Proyectos, Estrategia, Liderazgo Consciente, Intra/Emprendimiento, Generación de Consciencia Organizacional - Personal y Habilidades Empresariales. Gerente de Proyectos Estratégicos de Outsourcing Asociados Colombia SAS.

En su séptima edición, la Guía PMBOK le da espacio a la oficina de Gestión de Proyectos, PMO, y nos recuerda la importancia de fomentar y desarrollar capacidades y habilidades para cumplir con los doce principios de la dirección de proyectos. De estos, resalta el cuarto: entrega de valor. *Se trata de un concepto imprescindible en la edición actualizada, pues ofrecer productos y servicios que logren complacer al cliente es un elemento diferenciador.* Esta entrega de valor se alinea con los objetivos de cualquier proyecto, mientras excede las expectativas del cliente.

En la actualidad, el cliente está mejor informado, es más exigente y tiene a su disposición varias alternativas, por lo que evaluar de manera crítica y hacer comparaciones teniendo en cuenta qué producto o servicio le aporta más y cuál merece ser comprado es parte de la realidad del mercado. Es clave esforzarse para conocer y entender las necesidades reales de los clientes, evitando asumirlas y apegándose a las condiciones cotidianas. En ese sentido, nos enfrentamos al reto generacional viendo cómo personas mayores, al interior de las organizaciones, son muy fuertes en las habilidades duras o técnicas y se muestran renuentes, en algunos casos, a trabajar para reforzar sus habilidades blandas. En contraste, los colaboradores jóvenes suelen ser más conscientes de la importancia de las habilidades blandas y están dispuestos a aprender sobre las habilidades técnicas o se apoyan en la tecnología y la maquinaria.

Ahondando en el tema, al ver las funciones y responsabilidades de las PMO, compuestas por un departamento o colaborador, se presenta el soporte transversal para gestionar herramientas y metodologías que hagan posible el cumplimiento de objetivos. Con miras a lograrlo, el conocimiento teórico no es suficiente, ya que las habilidades blandas, también conocidas como "soft skills" o "power skills", tienen un rol fundamental. Mencionadas en el Triángulo de Talento del PMI, se trata de habilidades cada vez más buscadas por las organizaciones e, incluso, cada vez con mayor frecuencia, aparecen en anuncios de

convocatorias laborales y proyectos. En palabras de Josh Bersin, experto en educación corporativa, "las habilidades duras son blandas (cambian todo el tiempo, se vuelven obsoletas constantemente y son relativamente fáciles de aprender) y las habilidades blandas son duras (son difíciles de construir, críticas y requieren un esfuerzo extremo para obtenerlas)".

Teniendo en cuenta lo anterior, las interacciones del equipo de la PMO con diferentes talentos dentro de la organización y, de acuerdo a mi experiencia como consultora senior, las siguientes son las principales power skills a tener en cuenta:

1

Integridad. Unir esto cuatro valores de acuerdo con el código de ética y conducta profesional del PMI: responsabilidad, respeto, equidad y honestidad. Ser coherentes con nuestros valores esenciales.

2

Servicio. Ser útil a los miembros del equipo de trabajo, ayudar, escuchar, observar, acompañar y motivar para que sean la mejor versión de sí mismos. Influir y transformar la vida de quienes los rodean.

3

Trabajo colaborativo. Pasar de la competencia a la colaboración, trabajando de forma coordinada, comprometida, unida y tomando decisiones de forma colectiva.

4 **Humildad.** El líder de la PMO no se considera superior a los demás. Reconoce que existen diferentes perspectivas y puntos de vista, todos igualmente válidos. Es esencial permitir el aporte de todo tipo de ideas.

5 **Flexibilidad de pensamiento y acción.** Demostrar capacidad de adaptabilidad y de respuesta oportuna.

Se trata de habilidades cada vez más buscadas por las organizaciones e, incluso, cada vez con mayor frecuencia, aparecen en anuncios de convocatorias laborales y proyectos.

6 **Resiliencia.** Capacidad de recuperarse frente a situaciones complicadas, constantes retos y cambios al asumir una actitud resolutiva y rápida para avanzar y continuar.

7 **Recursividad.** Optimizar los recursos limitados, sean de personal o financieros, con los que cuenta la PMO, para evitar los desperdicios, reprocesos y retrasos en el cronograma.

8 **Comunicación.** Entender a los demás con asertividad y claridad en los requerimientos, al validar la información y aplicarla de forma interna, externa, verbal y no verbal: "Lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices" (Emerson).

9 **Creatividad e innovación.** Con aportes, diferencias, ideas, cambios, mejoras, agregando valor y aprendiendo de los errores para generar nuevas soluciones a los problemas, retos y dificultades que se presentan.

10 **Liderazgo consciente.** Uno de los pilares del capitalismo consciente. A esta clase de líderes los impulsa el servicio a la gente; se enfocan en los vínculos y en la calidad humana, por encima del poder y del dinero. Transforman el desempeño individual en colectivo, sabiendo inspirar, motivar y desarrollar a sus equipos de trabajo. Lo anterior involucra el concepto de autoconocimiento: "para liderar a los demás, primero debo liderarme a mí mismo".

11 **Maestría emocional.** Conocer, aceptar y gestionar las emociones. No dejarse llevar por las situaciones de estrés, dominarlas y reflexionar con calma para poder tomar las mejores decisiones. Se debe buscar el equilibrio emocional y ser conscientes de los errores propios.

12 **Gratitud.** No dar por hecho, agradecer a los colaboradores por poner sus cualidades, habilidades y talentos al servicio de los proyectos. El líder de una PMO demuestra que se valoran los esfuerzos individuales y colectivos, y genera un ambiente de respeto, compromiso, motivación y lealtad.

Para finalizar, los invito a seguir trabajando y dedicando tiempo a actualizarse en relación a las habilidades que requieren nuestros proyectos y equipos, para lograr nuestra propia satisfacción y la satisfacción de nuestros clientes. Recuerden siempre que lo mejor de las *power skills* es que, al ser habilidades conductuales, pueden adquirirse, reforzarse y convertirse en fortalezas.

LIDERAZGO
COMUNICACIÓN
MANEJO DE CONFLICTOS
COOPERACIÓN
EMPATÍA



LA RELACIÓN ENTRE LA PMO Y EL DIRECTOR DE PROYECTOS



Jorge Roger Frank Castro Castillo

Ingeniero mecánico-eléctrico y MBA por la Universidad de Piura. PMP® por el Project Management Institute. Cuenta con experiencia en proyectos y servicios de control, protección y equipos primarios de subestaciones de media y alta tensión. Actualmente es gerente de Proyectos en Hitachi Energy Perú.

Una oficina de Dirección de Proyectos, conocida por sus siglas en inglés como PMO, tiene como objetivo primordial garantizar la mejora continua en la gestión de los proyectos del portafolio de la organización, con foco en aspectos críticos como: costos, cronograma, calidad, gestión de riesgos, lecciones aprendidas, entre otros. *La consecución de esta mejora continua no es un objetivo per se, sino que, por el contrario, es un medio para el fin último que debería tener toda PMO que se precie de serlo: alinear el trabajo desarrollado por los directores de proyectos a los objetivos estratégicos de la organización.* Estos objetivos pueden ser muy variados; van desde lograr afianzar y desarrollar relaciones a largo plazo con los distintos interesados, y desarrollar a sus propios colaboradores, hasta, por supuesto, generar valor y rentabilidad para sus accionistas.

Este alineamiento o armonización entre estrategia y trabajo del "día a día" pasa por un actor fundamental: el director de proyectos. Para poder lograr un adecuado engranaje entre lo que aporta cada proyecto y el valor agregado que persigue la PMO, existen algunas actividades críticas que deben ser tomadas en cuenta por el otro actor relevante en esta ecuación: el responsable de la oficina de Dirección de Proyectos. Ambos realizan, en esencia, actividades complementarias y combinan sus esfuerzos para lograr el éxito de la organización, aunque con distintas visiones: el director del proyecto dirige las restricciones (alcance, cronograma y costos) de los proyectos individuales y el responsable de la PMO se encarga de las metodologías, normatividad e interdependencias entre los proyectos a nivel de empresa.

Dichas actividades son varias, pero se podrían resumir en las siguientes¹:

Normatividad y estandarización. Al definir las herramientas a utilizar y los tipos de metodologías aceptables para la gestión de los proyectos, se garantiza una estandarización que minimiza la

confusión y posibles reprocesos de parte de los colaboradores. Una consecuencia inmediata de esto es que los equipos tendrán un marco de trabajo común y, por tanto, la gestión de los directores de proyectos será más fluida y ágil.

Los equipos de proyectos necesitan contar con un espacio para la discusión y poder decidir respecto del estilo de gestión, de manera ad hoc para cada proyecto.

Priorización de recursos. Una de las funciones principales del director de proyectos es controlar los recursos asignados a sus proyectos. Sin embargo, algunos proyectos gestionados al mismo tiempo pueden originar conflictos en cuanto a asignación de recursos. Por ello, el responsable de la PMO debe evaluar y decidir qué proyectos tendrán un impacto mayor en el portafolio de la compañía y priorizarlos.

¹ "Qué es un PMO manager y cuáles son sus funciones principales" (<https://zemsaniaglobalgroup.com>).

Análisis financiero. El director de proyectos se centra en los objetivos de los proyectos individuales, pero es deber de la PMO monitorear el portafolio y, por ende, evaluar y proponer los cambios necesarios para materializar oportunidades potenciales, a fin de alcanzar mejor los objetivos del negocio. Por otra parte, es necesario determinar si las herramientas utilizadas en los proyectos son rentables según lo esperado por la organización, de acuerdo con los resultados que estos generan.

Creación y almacenamiento de información. Cada etapa del proyecto debe documentarse adecuadamente, es decir, con fiabilidad y rigor. Los documentos fundamentales de todo proyecto son: su justificación (caso de negocio), el acta de constitución, el presupuesto y el plan de dirección; mientras que, en el caso de la PMO, la documentación relevante suele ser la vinculada a procedimientos y guías de capacitación, gestión de procesos, selección de metodologías y definición de entregables, entre los más importantes.

Teniendo en cuenta lo anterior, los equipos de proyectos necesitan contar con un espacio para la discusión y poder decidir respecto del estilo de gestión, de manera ad hoc para cada proyecto. El equipo siempre debe estar alineado con las directrices establecidas por la PMO; por tanto, el rol que juega el director del proyecto en dicho proceso es fundamental, ya que es el llamado a ser el interlocutor o enlace con la oficina de Dirección de Proyectos. Además, el director del proyecto debe aportar su visión específica del proyecto, de manera que algunas decisiones puedan ser adaptadas al contexto particular del mismo.

Como lo señala el “Estándar para la Gestión de Proyectos” incluido en la séptima edición de la guía PMBOK, la customización de un proyecto puede estar implícita en la selección de la metodología de gestión, pero también puede ser una acción explícita producto de la mezcla de elementos específicos para adecuarse a las características propias del proyecto y de su entorno. Dependiendo del impacto de dicha customización, el nivel de aprobación puede diferir, y esto también debe estar regulado por la PMO: una customización que impacta principalmente a la labor del equipo del proyecto, por lo general, requiere de un menor grado de seguimiento que una de impacto de mayor alcance. En el primer caso, es responsabilidad del director de proyectos aprobar y supervisar la implementación de la customización, mientras que en el segundo, además de la revisión y visto bueno del director de proyectos, suele necesitarse un segundo nivel de aprobación proveniente de la PMO.

Finalmente, y según la experiencia profesional adquirida a lo largo de estos años, una muy buena práctica que ayuda a que los directores de proyectos se comprometan en la consecución de los objetivos de la PMO consiste en organizar capacitaciones recurrentes, difusiones de los estándares y cambios o actualizaciones de políticas, así como programas de certificación. Esto mitigará en gran medida el riesgo de cualquier desfase entre lo que cada director de proyectos aplique en sus proyectos individuales y lo que la organización espera del portafolio en general. Evidentemente, todo ello debe contar con el involucramiento activo de los altos mandos de la organización, a fin de que el mensaje cale y devenga en un sello característico de la cultura organizacional.



PMO: ¿UN ELEFANTE EN UNA CARRERA DE CHITAS?



Daniel Enrique Muñoz Zaldívar

Ingeniero de Sistemas y magíster en Administración de Negocios, con amplia experiencia liderando proyectos y portafolios de tecnología e innovación a nivel corporativo en empresas de los sectores de energía, telecomunicaciones y servicios de tecnología. Certificado como PMP y Scrum Master.

Seamos pragmáticos. *Propongo seguir un flujo estructurado, lógico y sobre la base de las mejores prácticas ya existentes, actualizadas y enfocadas en la entrega de valor al negocio y "customizado" a este último.* A continuación, cuatro pasos esenciales.

Imagínense que son invitados a una carrera de 100 metros con obstáculos y que la única condición es que los participantes pueden escoger un animal para correr sobre su lomo, como jinetes sobre caballos. Imagínense, de nuevo, que todos los competidores, excepto ustedes, escogen, inteligentemente, correr sobre chitas (también conocidas como guepardos), pero a ustedes, como son disruptivos, se les ocurre ir sobre un pesado elefante africano de casi seis toneladas de peso. Debo sospechar que, hasta este momento, ustedes estarán diciéndose que, más que disruptiva, la idea les parece poco astuta, por no utilizar otro adjetivo más duro. Creo que no es necesario recordar que las chitas pueden alcanzar los 150 km por hora, mientras que los elefantes africanos, tan solo 40 km por hora. Esos datos son irrelevantes para nuestro ejercicio, pues bastaba el sentido común –el más escaso de los sentidos, dicho sea de paso– para darnos cuenta de que pensar competir o, en otras palabras, ir al mismo ritmo que el resto de participantes sería absurdo.

Con el mismo sentido común, pensemos entonces si una pesada, lenta, sobreburocratizada PMO podría ir al mismo ritmo de –o “aportar valor a”, como está de moda decir– una organización que, hoy por hoy, tiene que moverse a un ritmo mucho mayor que antes (moverse: tomar decisiones, lanzar productos, innovar, implementar mejoras, aprender, etc.). Y es que las PMO, como se han conceptualizado desde el siglo pasado, tienen, nos guste o no, aquellas nada envidiables características. Y lo dice alguien que ha liderado –y lidera– dicha función.

Recuerdo que hace poco un buen amigo mío, al ponerle el mismo ejemplo, me comentó que las PMO no tienen ya razón de ser y están condenadas a desaparecer. No pude estar más en desacuerdo. Otro amigo, un poco más mesurado que el anterior, me decía que las PMO podrán subsistir siempre y cuando se vuelvan más “ágiles”; es decir, citando sus palabras, “menos burocráticas, más enfocadas en la entrega que en la documentación”. Tampoco estuve de acuerdo.

Se preguntarán por qué discrepé con ambos, si en el primer caso planteaba desaparición y, en el segundo, una actualización. Y es que, efectivamente, desde mi punto de vista, la “actualización” es el camino a seguir; pero no una actualización ciega, dogmática: debemos pensar en una evolución que tiene como primer, segundo y tercer ingrediente el sentido común. Lo que venga después pasa por aplicar las buenas prácticas que existen allá afuera. No hay secretos, ni es ciencia espacial.

Paso 1: ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Cada vez que debe implementarse una nueva función en una organización, tiene que haber un por qué y un para qué bien definidos, conocidos y aceptados. Como cualquier otro proyecto, la implementación de una nueva o evolucionada PMO tiene que tener un sustento de negocio; es decir, valor. Esto se entiende mejor en términos de los beneficios que la nueva PMO genere. Beneficios de negocio, no tecnológicos u operativos. Beneficios relevantes, no solo para los gerentes de proyectos, sino incluso

para la gerencia general y los directores de la organización.

Para ello, se pueden utilizar técnicas de relevamiento de información, tales como entrevistas, *focus groups* o encuestas, a todos y cada uno de los roles que, de una u otra manera, participan, impactan o se ven impactados por los proyectos que lleva a cabo la organización. Recomiendo que el beneficio esperado de un rol ejecutivo tenga una ponderación mayor al de un rol operativo, por la visión de los beneficios que la organización, como un todo, necesita.

Paso 2: ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué debemos entregar? Una vez identificados, entendidos y consensuados qué beneficios concretos desean los interesados obtener, se procede a priorizarlos de acuerdo a, por ejemplo, qué grupo los solicitó (gerentes, project managers, áreas de soporte, comercial, etc.), con qué frecuencia aparecieron en las respuestas, benchmark en otras empresas del sector o cualquier otro criterio que haya sido convenido en la organización.

Los beneficios, ya estructurados de esa manera, deben ser traducidos ahora a funciones que la PMO ejecutará. Por ejemplo, si uno de los beneficios solicitados por la alta gerencia fuese tener mayor confiabilidad en la información presentada por cada proyecto, una de las

funciones asociadas podría ser conducir auditorías de proyectos. Cabe tener en cuenta que un beneficio puede ser cubierto por una o más funciones.

Cada vez que debe implementarse una nueva función en una organización, tiene que haber un por qué y un para qué bien definidos, conocidos y aceptados. Como cualquier otro proyecto, la implementación de una nueva o evolucionada PMO tiene que tener un sustento de negocio.

Paso 3: ¿De qué manera nos organizamos? Toda función o servicio a entregar debe estar soportado por un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y sistemas que generen el servicio a partir de entradas específicas. En otras palabras, se necesita de un proceso. El diseño del proceso que permitirá que la función pueda llevarse a cabo y, a través de ella, se entregue un beneficio, es el paso más difícil: implica definir, diseñar e implementar procedimientos, roles, responsabilidades y herramientas que logren que el proceso funcione como se espera.



Quiero detenerme un momento en los roles y responsabilidades: aquí estamos hablando de personas. Es el factor humano el que, en la práctica, con su buen o mal rendimiento, hará de la PMO un éxito o un fracaso. El talento humano deberá ser definido no solo en términos de conocimientos, experiencia y habilidades (fundamental), sino que también se deberá tomar en consideración la capacidad necesaria para cubrir la demanda de servicios que el negocio requerirá. Una vez establecido el proceso, se deben definir métricas que midan su efectividad y eficiencia, siempre alineadas a los beneficios esperados del paso inicial. KPI u OKR, todo sirve.

Paso 4: ¿Estamos siendo rentables? Finalmente, toca demostrar que la inversión de tiempo

y dinero para la implementación genera rentabilidad. Solo hay una forma de hacerlo: mostrando beneficios esperados al negocio. Lógicamente, la entrega de valor de parte de una PMO es una carrera de largo aliento. No es viable ver todos los beneficios materializados en el corto plazo. Sin embargo, sí es muy necesario identificar en el paso 1 o el paso 2 (a más tardar) aquellos que podrán ser entregados rápidamente, sea por su sencillez o porque los servicios asociados ya se encuentran parcialmente en operación. Una buena estrategia es clasificar aquellos servicios (funciones) que serán entregados en el corto, mediano y largo plazo, y apuntar a que por lo menos el 50% del total esté presente en los dos primeros grupos. De esta manera, nos aseguramos un patrocinio adecuado.

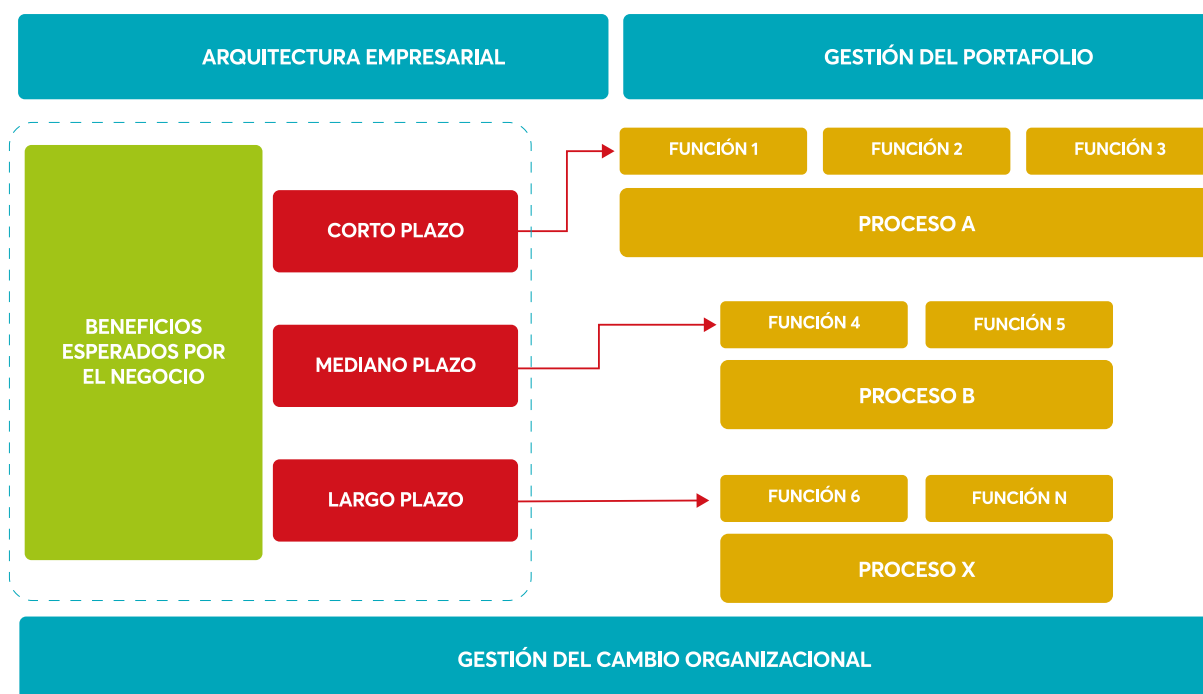


Figura 1

Una PMO es una estructura organizacional viva y, como tal, si es que no mejora en el tiempo, tarde o temprano se vuelve obsoleta. En consecuencia, desaparece. La evolución de la PMO no es un esfuerzo de una sola vez. Implica un proyecto que debería seguir los macropasos mostrados líneas arriba y ejecutarse cada cierto tiempo, de acuerdo a la evaluación de madurez que la organización realice, el contexto, los cambios en la estrategia, etc. Las PMO deberán centrarse en la entrega de valor (beneficios menos el costo de implementarlos) y pasar a ser realmente una Value Delivery Office más que

una Project Management Office (el nombre no es importante). Deberá centrarse en gestionar productos, no proyectos (a pesar de que los primeros se construyen con los segundos), y demostrar con quick wins a los responsables del negocio, que pueden ser un área clave y estratégica para el logro de sus objetivos.

Adicionalmente, tal como se muestra en la Figura 1, no debe perderse la visión sistémica que todo cambio tiene que incluir. Una PMO no existe de manera aislada: su creación o evolución impacta y se ve impactada por otras estructuras en la organización.

LA PMO COMO FUENTE DE LIDERAZGO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES



Jesús E. (Nesty) Delgado Moarales

Ingeniero civil con más de 20 años de experiencia. Presidente de OKA Project Management & Strategic Leadership. Fundador de la Academia de Gerencia de Proyectos PM4PRR3.

El mundo se encuentra en una coyuntura histórica sin precedentes. En ella, la mayor parte de la economía global se sustenta en el desarrollo de proyectos y no en las operaciones tradicionales de las empresas y organizaciones. Este fenómeno, al que conocemos como "project economy", es sumamente palpable en cada país en todos los sectores e industrias, incluidos el sector gubernamental y las ONG.

Cuando la economía de proyectos llega para impulsar tanto el rendimiento a corto plazo como la creación de valor a largo plazo, a través de transformaciones organizacionales, de un desarrollo más acelerado de nuevos productos y de una adopción más rápida de nuevas tecnologías, se hace imperativo adoptar las mejores prácticas, metodologías, herramientas y marcos de trabajo, pero, sobre todo, estilos de liderazgo, principios y valores que nos permitan lograr el éxito en cada uno de nuestros proyectos.

Es lamentable que, aun cuando las estadísticas a nivel mundial dicen que solo tres de cada diez proyectos culminan exitosamente ("Standish Group Chaos Report", 2020), existan organizaciones que no se han convencido de la importancia de diseñar, implementar y mantener en un estado de mejora continua una oficina de Gestión de Proyectos/Programas/Portafolios (PMO) en sus empresas.

Por la experiencia adquirida en los cientos de proyectos que hemos ayudado a gestionar y liderar para diversas organizaciones, ONG y municipios, nos hemos dado cuenta de que las PMO no solo deben ser el lugar desde donde estandarizar metodologías, documentación, realizar informes, crear políticas y coordinar los recursos para cada proyecto, sino que desde ellas también tenemos que liderar para transformar.

Es desde la PMO que garantizamos el alineamiento de los proyectos con la estrategia de la organización y estimulamos que el resultado final de cada uno de estos proyectos se traduzca en el cumplimiento de un objetivo estratégico dentro de nuestra teoría del cambio. Cuando garantizamos este alineamiento, aseguramos que aquello que comenzó como un problema raíz o una necesidad, y que dio paso a la generación de ideas que, a su vez, fueron las precursoras de las iniciativas y los proyectos en nuestro programa o portafolio, realmente culmine y genere un impacto positivo y un valor en la gente, las organizaciones y las comunidades a las que servimos.

La teoría del cambio debe ser el motor que nos conduzca a entablar un compromiso con la excelencia y la mejora continua de nuestras PMO. En mi opinión, esto se logra convirtiendo a las PMO en una escuela y cantera de líderes y expertos en la materia (subject matter experts).

La teoría del cambio debe ser el motor que nos conduzca a entablar un compromiso con la excelencia y la mejora continua de nuestras

PMO. En mi opinión, esto se logra convirtiendo a las PMO en una escuela y cantera de líderes y expertos en la materia (*subject matter experts*).

Dentro de un ambiente tan disruptivo, inestable y de gran incertidumbre como en el que estamos viviendo, donde, a pesar de disponer de una accesibilidad a la información sin precedentes históricos, sigue siendo el factor humano el que está presente y gobierna todas las interacciones en los proyectos. Sin gente, de alguna u otra forma, no existen proyectos, y sin proyectos no hay economía.

Cuando nos convencemos de que la gente es el centro de todo, no tenemos otra opción que estimular que desde las PMO se promueva un liderazgo que motive e inspire a nuestro equipo a dar lo mejor de sí y a sentir un propósito en cada una de las tareas que lleva a cabo. Desde las PMO promovemos las condiciones apropiadas para que aflore la empatía, la innovación y la transparencia, y se proteja a toda costa la seguridad psicológica y la salud emocional de cada individuo.

Desde las PMO debemos contagiar al resto de la organización y provocar una transformación que comience con el fortalecimiento de una cultura organizacional en la cual se alcance una mayor uniformidad en los procesos, los equipos de trabajo desarrollen una fuerte cohesión y puedan actuar con mayor autonomía y aumentar la

rapidez en la toma de buenas decisiones en función de los intereses colectivos, y donde logremos canales de comunicación abiertos y mayor claridad en las metas organizacionales, que se traducen en una mayor motivación, dedicación y buen desempeño.

Pero, sobre todo, cuando desde las PMO lideramos genuinamente y alentamos una cultura organizacional sólida, se viven, día a día, los valores de la empresa; se conectan los propósitos de vida personales con el propósito de la organización, y se genera un fuerte sentido de empoderamiento, identidad y pertenencia en todos los colaboradores.

Estoy totalmente convencido de que, con la llegada de la economía de proyectos y de esta revolución tecnológica sin precedentes, también llegó la hora de que nuestras PMO se conviertan en verdaderas promotoras de liderazgo, innovación y transformación. Ya no solo se trata de tener certificaciones, estandarizar documentos y herramientas, o de debatir sobre metodologías y marcos de trabajo. Las organizaciones a nivel mundial han advertido que no necesitan "gerentes de proyectos": están buscando desesperadamente líderes de proyectos. ¡La PMO es desde donde vamos a cambiar estos paradigmas, y tenemos que hacerlo ya!

Llegó el momento de entender la necesidad de ser más que gerentes de proyectos y convertirnos en verdaderos líderes de transformación

que mantengamos y promovamos un crecimiento personal, profesional, espiritual y organizacional constante. Porque lo que no crece, perece, y estoy seguro de que para ti, al igual que para mí, perecer no es una opción.



"LAS PMO QUE FRACASAN SON AQUELLAS QUE NO SATISFACEN LAS EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS"



Conversamos con Alexandres Hoyos, director ejecutivo de Practical Thinking Perú, quien conoce la relevancia de las oficinas de gestión de proyectos para el logro de los objetivos de una organización. El ingeniero informático nos brinda claridad sobre los conceptos básicos y aspectos a tener en cuenta para el diseño e implementación de una PMO, a partir de su amplia experiencia profesional y preparación académica.

Por Miguel Ángel Alba Luis

El Project Management Institute (PMI) y la empresa de servicios profesionales globales PwC publicaron, en febrero de 2022, el reporte de Madurez de la PMO, "Lecciones del nivel superior global", sobre la base de una encuesta a profesionales en la dirección de proyectos que laboran en PMO de diferentes industrias. Entre los resultados se menciona que las organizaciones del 10% superior en las dimensiones medidas (Gobernanza, Integración, Procesos, Tecnología, Personas) llegaron a duplicar sus ingresos en 2020 en contraste con 2019, mientras que el nivel de satisfacción del cliente fue triplicado. La citada publicación resalta, además, que las PMO demuestran con resultados su capacidad de entregar valor a las organizaciones, lo que se alinea con su nivel de madurez. Por su parte, el Estado peruano, mediante el Decreto Supremo N° 288-2019-EF, aprobó lineamientos para la contratación del servicio de consultoría para la gestión de inversiones, programas de inversión o cartera de inversiones. Ello mediante la implementación de la herramienta de la oficina de gestión de proyectos, PMO, lo que se resalta en detalle en el Informe de Competitividad 2022, publicado por la institución Perú Compite.

En este contexto, en febrero de 2022, Rafael Ugaz, director ejecutivo de ProInversión, señaló al diario El Comercio la posibilidad de implementar PMO en los diversos sectores para que acompañen desde la etapa de planeamiento y programación del proyecto, pasando por la formulación, estructuración, transacción y ejecución contractual.

Alexandres, ¿qué debemos entender por una PMO y qué funciones debe desarrollar?

Una oficina de proyectos es un área organizacional que se instala dentro de una empresa y puede tener un alcance funcional o corporativo, dependiendo de lo que necesite la organización. Las funciones que se desarrollan en las oficinas de gestión de proyectos deben tener un enfoque flexible, es decir, que se adapte a las necesidades de la organización. Hay PMO que gestionan portafolios, programas y proyectos, mientras otras se dedican a monitorear, controlar, capacitar y proveer herramientas de gestión. En ese sentido, las PMO pueden gestionar conocimiento a través de las lecciones aprendidas. Típicamente, si vamos a funciones básicas, una PMO debe ayudar a estandarizar

la forma de trabajo, lo que implica proveer algo importantísimo: una metodología de gestión. Cuando las PMO gestionan proyectos, los jefes de proyectos tendrían que formar parte de la oficina de Proyectos. En resumen, lo que tiene que buscar la PMO es incrementar la capacidad de gestión de proyectos dentro de una organización y, al mismo tiempo, fortalecer la cultura de gestión de proyectos de una empresa.

"El líder de la PMO debe estar constantemente enfocado en demostrar que genera valor para la organización y debe realizar mediciones, tal vez mediante encuestas a los interesados de la empresa".

¿En qué momento las organizaciones pueden evaluar la implementación de una oficina de gestión de proyectos?

Normalmente se requiere una PMO cuando la organización empieza a gestionar varios proyectos simultáneamente y necesita ordenarse. De acuerdo a mi experiencia a nivel de consultorías, sé que muchas veces todo este trabajo inicia al realizar un diagnóstico organizacional de cómo la empresa gestiona sus proyectos, programas y portafolios, para identificar fortalezas y oportunidades de mejora en el manejo de sus prácticas. Entonces, surge la gran pregunta: ¿quién se va a encargar de implementar las mejoras? Es en este punto donde, a veces, nace la necesidad de contar con una oficina de gestión de proyectos.

Un segundo aspecto a tomar en cuenta es el tamaño de las empresas. Según mi experiencia, las empresas medianas a grandes que poseen una cartera interesante de proyectos trabajados en paralelo, necesitan ordenar la forma en que se gestionan y generar un impacto en el desempeño de las inversiones. Además, cuando la organización gestiona un proyecto de magnitud, también llamado megaproyecto, puede implementar un esquema de programas; es decir, subdividirlos en varios proyectos. Esto podría requerir una oficina de proyectos temporal para brindar soporte al programa, canalizar la información, encargarse de estandarizar

el trabajo e implementar herramientas... Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos Lima 2019 se implementó una oficina de proyectos de control para hacer seguimiento a toda la gama de proyectos que conformaba parte del citado megaproyecto.

¿Se puede considerar a la PMO como un vehículo para lograr los objetivos estratégicos de las organizaciones?

Sí, podríamos decir que es un vehículo, un habilitador que, de alguna manera, ayuda a una organización que maneja un conjunto de proyectos a desarrollar una capacidad fundamental: la capacidad de ejecución. Dicho sea de paso, las estrategias se construyen a través de los proyectos; eso es algo importante a tener en claro.

¿Cuáles son las diferencias de implementar la PMO en una organización pública o privada?

En las organizaciones públicas el cambio frecuente de gobernanza y de las autoridades incide mucho en el éxito de implementación de la PMO, pues se requiere continuidad en la gestión para asegurar la difusión permanente de las prácticas de gestión. De otro lado, en las empresas privadas los cambios de directivos pueden ser menos frecuentes; sin embargo, también se presenta este riesgo cuando un nuevo gerente implementa otra filosofía. El reto para la implementación de una PMO en ambos casos es que debe demostrar que genera valor de manera continua. ¿Cómo? Conectando lo que necesitan los stakeholders de la PMO con lo que esta área ofrece. Es importante monitorear los resultados mediante indicadores de desempeño, los mismos que se mostrarán luego de cierto tiempo. No esperemos resultados en dos o tres meses.

¿En el diseño de la PMO deben participar todos los directores y gestores de proyectos o solo los gerentes?

En mi experiencia, apoyado en la metodología PMO Value Ring, lo que se recomienda es trabajar en conjunto con los principales *stakeholders* e identificar sus expectativas; en otras palabras, lo que esperan de la PMO, y, sobre ello, plantear las funciones que esta PMO va a realizar y si efectivamente uno tiene que cocrear con ellos. El

especialista de diseño valida con los interesados de forma conjunta, para minimizar el efecto de resistencia al cambio.

¿Existen estándares internacionales para medir la madurez de una PMO o para la implementación de una oficina de proyectos?

Para la medición de la madurez de la PMO no existe un estándar, no se tiene un PMOBOK; lo que existen son organizaciones que han ido difundiendo lineamientos de cómo diseñar e implementar una PMO. Una de ellas es la PMO Global Alliance, con la metodología Value Ring ya mencionada; otra es Wellington, institución inglesa que plantea un esquema para diseñar una PMO; y PMO Officers, entidad española que también plantea cómo diseñar una PMO. Y existen, además, otras consultoras de renombre que, de alguna manera, han promovido lineamientos.

¿Quién propuso la metodología PMO Value Ring? ¿Quién la diseñó?

Partió de una investigación que se hizo en Río de Janeiro en 2015, mediante una serie de encuestas locales, y ello se expandió a nivel mundial. Así, fue identificándose una serie de pasos de cómo diseñar una oficina de proyectos y se construyó la metodología Value Ring. El diseñador se llama Américo Pinto, que es el chair/founder de PMO Global Alliance. Estoy convencido de que esta metodología tiene cosas muy buenas, pues plantea que la PMO es un área flexible, lo que significa que sus funciones se conectan con las expectativas de los interesados. En esto difiere en relación a otros autores que postulan que existen tres tipos de PMO: de apoyo, directiva y de soporte. Sin embargo, considero que es conveniente, primero, identificar lo que la empresa necesita y, sobre ello, definir funciones directivas, de apoyo o de soporte, o una combinación de las tres.

¿Qué referencias nos puedes brindar acerca de la OPM3 del PMI?

La OPM3 es un modelo para medir la madurez de cómo se gestionan los proyectos, programas y portafolios y un soporte para hacer diagnóstico, especialmente para aquellas organizaciones que manejan proyectos predictivos.

¿Por qué causas puede fracasar una PMO?

Las PMO que fracasan son aquellas que no satisfacen las expectativas de los interesados. Como si se tratara de una empresa de servicios, al no satisfacer no genera consumo y termina cerrando. Otra de las causas es porque las PMO se dedican solo a reportar y a controlar y no evolucionan hacia el diseño de una metodología, capacitar al equipo, gestionar las lecciones aprendidas y los proyectos... El líder de la PMO debe estar constantemente enfocado en demostrar que genera valor para la organización y debe realizar mediciones, tal vez mediante encuestas a los interesados de la empresa.

¿Qué pasos a seguir recomiendas a las empresas para el diseño y/o implementación de una PMO?

Primero, realizar un diagnóstico, determinar si es que se cuenta con el capital humano para hacerse cargo, porque el diseño de implementación de una PMO es, de por sí, un proyecto. Si es de manera interna, ver si se tiene el personal adecuado que cuente con la visión de una oficina de proyectos y pueda diseñar un esquema colaborativo con las distintas áreas teniendo en cuenta el impacto a nivel organizacional que puede generar la PMO. Esto nos lleva a que el personal considere las prácticas de gestión del cambio. Si no se cuenta con estas prácticas, lo que se sugiere es que se tenga un acompañamiento profesional; y que si se trata de una entidad externa, trabaje de la mano con un líder interno para que se cocree el diseño en conjunto, empezando por un diagnóstico con un plazo establecido, un diseño de PMO y un acompañamiento temporal para la implementación. Es importante indicar que la implementación debe ser liderada por la misma gente que trabaja en la organización.

¿Qué beneficios se obtienen con la implementación de una PMO?

Para mí son cuatro claves:

- 1 Estandarizar la forma de trabajo.
- 2 Fortalecer la cultura del manejo de los proyectos.

- 3 Mejorar el desempeño de la gestión en inversiones.
- 4 Ahorrar en costos de proyectos.

¿Qué roles y competencias consideras que deben tener los profesionales encargados de la oficina de gestión de proyectos?

Dependerá de lo que la PMO va a realizar. A continuación, algunos alcances:

- Debe contar con un conjunto de competencias como capacidad de integración, manejo de procesos, gestión del cliente y del conocimiento...
- Ser especialista en temas de proyectos; debe ayudar a implementar las metodologías.
- Ser especialista en monitoreo y control si la PMO se va a encargar de controlar.
- Ser especialista en temas de gestión de portafolios si la PMO va a gestionar un portafolio.
- Y especialista en temas de agilidad, en caso se realicen prácticas ágiles.

Finalmente, ¿qué recomendaciones puedes brindar a los profesionales interesados en trabajar en una oficina de gestión de proyectos?

- 1 Que conozcan de gestión de proyectos.
- 2 Que se especialicen en los temas de oficinas de gestión de proyectos. Hay algunos cursos en el mercado y programas de especialización bastante competitivos que los animo a investigar.
- 3 Que se capaciten en el manejo de portafolios, que es lo que ayuda mucho a complementar.
- 4 Que fortalezcan sus capacidades, tomando en cuenta que las competencias de un profesional que trabaja en una PMO van más allá de solamente gestionar proyectos.

LA PMO COMO LÍDER DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN UNA ORGANIZACIÓN



Jose Luis Apaza Vargas

Ingeniero de Sistemas con un posgrado en Gerencia de Proyectos. Especialista en planeamiento y control de proyectos con más de 25 años en la industria de la construcción.

*Las PMO no solamente son oficinas donde se recopilan formatos con datos de los proyectos de la organización o una biblioteca de procedimientos y documentos estandarizados que se van distribuyendo en cada proyecto. **Ahora más que nunca, las PMO tienen la responsabilidad de liderar la madurez de la organización.***

Podemos decir que una organización alcanza la madurez cuando funciona con todas sus capacidades, lo que se expresa a través de las personas, procesos, datos y tecnologías. En mi experiencia dentro de las organizaciones de proyectos de la industria de la construcción, he podido observar que la PMO tiene la capacidad de convocar y promover el *know how* de cada proyecto entre todos los líderes de la organización.

Cuando invitamos a los gerentes de proyectos a que expresen las dificultades y/o aciertos de sus proyectos con todos los demás stakeholders, la organización se nutre de nuevas experiencias y, de esta manera, va creando una cultura nueva, que permite resolver dudas y asimilar nuevas experiencias. Además, la PMO identifica las nuevas estrategias o modelos a implementar, para que todos los involucrados cuenten con el mismo nivel de información. Esto permite que la organización alcance mayor madurez en cuanto al negocio y se robustezca con los conocimientos aportados. Hay que tener presente que, en una organización de la industria de la construcción, cada proyecto representa un reto diferente, con características distintas.

Por lo general, una organización de la industria de la construcción maneja muchos proyectos a

la vez, y cada uno de diferentes rubros. Pueden ser de edificación, de saneamiento, viales, hospitalarios, de electrificación... Cada uno es único. Esto hace que la PMO disponga de mucha información, pero lo crucial es que esta información es el *know how* de la organización y se vive intensamente en cada proyecto (que, en promedio, tiene una duración de uno a dos años). Lo relevante es que cada gerente de proyecto comparta los logros, estrategias o dificultades que sirven tanto para los otros proyectos en ejecución como para los futuros.

Sabemos que uno de los roles de la PMO es divulgar y capacitar, pero también debe liderar la convocatoria y lograr que los PM (project managers) de los diferentes proyectos compartan este crecimiento. Algunos de los puntos a deliberar o disertar en periodos mensuales por parte de los gerentes de proyectos pueden ser:

- Logros y retos que se obtuvieron.
- Dificultades.
- Innovaciones en el proyecto.
- Optimizaciones del proyecto.
- Amenazas y oportunidades.

- Retos del mes siguiente.
- Indicadores de gestión CPI, SPI.
- Histogramas de mano de obra y equipos.
- Curva S.
- Flujo de caja.

En dichas disertaciones los PM pueden expresar sus molestias, diferencias o dificultades frente a un determinado formato o procedimiento. Esto contribuirá a mejorar los documentos estandarizados que produce la PMO. Es vital escuchar en vivo (presencial o por videoconferencia) las disertaciones e interactuar; es muy distinto que leer un informe que solo contiene números.

Como hemos mencionado al inicio, una organización alcanza su nivel de madurez cuando funciona con todas sus capacidades y logra todos sus objetivos. En una empresa de la industria de la construcción los proyectos son de corto y mediano plazo, existe mucha rotación de personal y los conocimientos que se adquieren en cada proyecto muchas veces se pierden con el personal cesado. Por ello, es necesario un *feedback* permanente con los líderes de la organización. Para liderar esta convocatoria juega un papel importante la PMO.

Para la PMO es una gran ventana y oportunidad difundir lo que sucede en el día a día de los proyectos, tanto los éxitos como las dificultades.

He tenido la oportunidad de participar en sesiones con más de quince proyectos diferentes, cada uno con su respectivo PM. La PMO tenía la autoridad para liderar, ya que cada PM debía proyectar su informe con ciertos parámetros que servían a todos los presentes y los líderes de la organización interactuaban con cada PM la situación de sus proyectos. En mi experiencia, la PMO de la oficina matriz es la que daba las directrices y los principales líderes de la organización estaban presentes y comprometidos con el negocio, porque

finalmente se analizaba el *dashboard* de toda la organización y esto demostraba transparencia e interés de parte de los involucrados. Los líderes que siempre estaban presentes eran:

- Gerente de PMO.
- CEO de la organización.
- Gerente de Logística de la organización.
- Gerente de Planeamiento.
- Gerente de Finanzas.
- Gerente de Contabilidad.
- Gerente de Producción.
- Directivos de la organización.
- Gerentes de Proyectos de Obras (PM).
- Administradores de obra.

Cuando un disertador planteaba un problema, todos los presentes ayudaban a resolverlo de acuerdo a su experiencia. El realizar este tipo de reuniones *full day* propicia que los presentes participen y colaboran, fomenten la unidad y la cultura organizacional.

Toda organización tiene niveles de madurez. Según el CMM (Capability Maturity Model), existen cinco:

- 1 Inicial.** donde la organización implementa y alcanza los objetivos de los procesos.
- 2 Gestionada.** donde se gestionan los procesos, se controlan y se mantienen*.
- 3 Establecida.** donde se utilizan los procesos definidos de acuerdo a estándares.

4

Predecible. se gestionan cuantitativamente los procesos.

*A partir del nivel 2, las PMO juegan un papel importante en el desarrollo de las organizaciones.

5

Optimizada. se mejoran continuamente los procesos para cumplir los objetivos del negocio.

Durante mis últimos cinco años de experiencia, participé y compartí en periodos mensuales con todos los gerentes de proyectos y líderes de la organización en las llamadas sesiones *full day*. Puedo asegurar que escuchar y contribuir a los distintos logros y retos que se plantearon para cada proyecto fue realmente enriquecedor.



LA PMO COMO INSTANCIA ARTICULADORA DE LA ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL



Rocio Rios Rios

Administradora de empresas con maestría en Proyectos, postgrado en Educación Superior y PMP®. Especialista en gestión estratégica, de portafolios y de proyectos con más de 15 años en el ámbito bancario y bursátil.

La estrategia es el norte que las organizaciones se plantean dentro de un determinado horizonte de tiempo y se materializa, principalmente, a través de la ejecución de proyectos. Muchas organizaciones cuentan con estrategias organizacionales (formal o informalmente establecidas) con diferentes grados de robustez; sin embargo, presentan dificultades con la ejecución, pues, como decía Peter Drucker, uno de los gurús más importantes del management, "la estrategia es un commodity y la ejecución es un arte". Es en este contexto donde la PMO (Project Management Office u oficina de Gestión de Proyectos) cobra relevancia, coadyuvando a la organización a ejecutar su estrategia.

La PMO es la instancia que, además de capacitar a la organización en gestión de proyectos, brindar herramientas estandarizadas de gestión de proyectos y comunicar el estado del portafolio a los stakeholders, entre otras funciones, lidera el proceso y dota a la organización de herramientas y criterios que le permiten seleccionar, dadas las restricciones, la combinación de iniciativas que le agregue mayor valor para materializar su estrategia y conformar el portafolio.

Priorizando la lista de deseos

Uno de los primeros pasos para conformar el portafolio que será ejecutado por la organización es la recopilación, por parte de la PMO, de los componentes o iniciativas que se originan en diferentes instancias, tanto internas como externas, y conformar, así, la denominada "lista de deseos": el punto de partida sobre el cual se aplicará un modelo de priorización considerando las restricciones y la optimización de los recursos humanos, financieros y físicos.

Antes de comenzar a priorizar es importante que cada uno de los componentes o iniciativas cuente con un caso de negocio, documento que permitirá visualizar el problema que atiende la iniciativa, conocer las alternativas que podrían resolverlo,

analizar dichas alternativas y, por último, llegar a una conclusión que sintetice el análisis realizado.

Posteriormente, el conjunto de casos de negocio ingresará al análisis de priorización de iniciativas, liderado por la PMO. Este permitirá que el equipo que realice la priorización pueda tener un entendimiento de las iniciativas candidatas a ser parte del portafolio. Si bien cada organización puede establecer el modelo de priorización que considere más conveniente, el más usado es el análisis multicriterio¹.

Dentro del proceso de materializar la estrategia, la cultura juega un rol fundamental.

Peter Drucker lo reconoció al mencionar que "la cultura se come a la estrategia en el desayuno".

Una vez que la organización ha asignado una calificación a los componentes o iniciativas, estará en condición de ordenarla "lista de deseos" de forma descendente, para poder armar un roadmap y ajustarlo según la evaluación de disponibilidad de recursos humanos, financieros y físicos transversales. Así, se generarán dos listas: la de aquellos componentes o iniciativas que sí se

¹ El análisis multicriterio es una rama de la investigación de operaciones que evalúa múltiples criterios en conflicto para la toma de decisiones. Tomado de: <http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n36/n36a14.pdf>

puedan ejecutar dentro del horizonte temporal de la estrategia, y la de las iniciativas no seleccionadas, que serán reservadas para analizarse cuando corresponda una revisión del portafolio. De esta manera se aplica, en la práctica, otra de las frases de Peter Drucker: "La esencia de la estrategia es elegir qué no hacer". Cuando el trabajo de priorizar concluye, es deber de la PMO gestionar que, en el marco de la difusión estratégica del portafolio priorizado, la comunicación llegue a toda la organización, de modo que esta pueda dirigir sus esfuerzos en ese sentido.

Materializando la estrategia

Dentro del proceso de materializar la estrategia, la cultura juega un rol fundamental. Peter Drucker lo reconoció al mencionar que "la cultura se come a la estrategia en el desayuno". Esta sutil pero poderosa frase nos recuerda que si bien puede haberse seguido un proceso consistente de formulación estratégica, es en este punto de ejecución donde se contrastan las intenciones con las acciones, pues son las personas y sus interacciones, apoyadas en creencias y actitudes tanto personales como organizacionales, las que permiten hacer realidad todo lo que se plantea en la estrategia. Por ello, tanto la PMO como el resto de la organización deben tener en cuenta cuándo desean implementar temas nuevos.

Mediante un puente invisible se vincula la formulación con la ejecución estratégica, y la PMO continúa teniendo un rol relevante, pues, apoyada en los servicios que provee a la organización, permite materializar la ejecución de los componentes o iniciativas seleccionadas.

A nivel general, los servicios que proveen las PMO han ido evolucionando en el tiempo y enriqueciéndose con el propósito de buscar aportar cada vez mayor valor a la organización. Sin embargo, no es necesario que las PMO provea todos, sino solo aquellos que la organización perciba como de valor agregado, e irá adicionando nuevos en la medida de las necesidades. Estos pueden clasificarse, principalmente, en servicios de gobierno del portafolio, gestión del cambio y mejora continua.

Dentro de los servicios vinculados al gobierno del portafolio pueden incluirse la priorización y el monitoreo del portafolio (uso de recursos humanos, financieros y materiales) y la correspondiente reportería bajo modelos *push* o *pull*, análisis de


impacto de la inclusión de nuevos componentes o iniciativas, la provisión de herramientas homogéneas para gestión de proyectos, la capacitación a los equipos ejecutores de proyectos, el coaching o acompañamiento a los equipos de proyectos, la gestión de *stakeholders* y el soporte en la gestión de riesgos.

De manera paralela, los servicios vinculados a la gestión del cambio contemplan la planificación del mismo, así como la gestión de campañas que acompañen el cambio generado por los proyectos.

Por su parte, entre los servicios relacionados a la mejora continua están la adopción de nuevas tecnologías, la gestión de lecciones aprendidas, la adopción de nuevas metodologías y marcos de trabajo, la gestión de repositorios de proyectos y la gestión de innovación.

Todos los servicios ofrecidos por las PMO contribuyen desde diferentes perspectivas a la materialización de la estrategia; algunos de forma más tangible y visible para todos; otros más evidentes para un grupo más reducido de *stakeholders*, y otros en momentos puntuales de la vida del proyecto, pero, sin duda, todos resultan valiosos para la organización.

Lo antes mencionado visibiliza el hecho de que la PMO participa en diferentes instancias dentro del proceso de articulación de la estrategia, pudiendo iniciar en fases tempranas o, incluso, desde la formulación estratégica, pasando por los procesos de difusión del portafolio aprobado, capacitación a los equipos ejecutores, mentoreo, acompañamiento, gestión del cambio y gestión de la innovación. Ello pone de manifiesto la necesidad de que las organizaciones cuenten con PMO internas o externas (tercerizadas) que las acompañen durante el proceso de transformación de la estrategia, desde la formulación hasta la ejecución, de manera que se incremente el éxito en la entrega de valor a la organización y la sociedad.



HOTEL BELMOND MIRAFLORES



11 | **KANBAN DAY**
NOV | **PERÚ 2022**

El camino alternativo
hacia la agilidad

CON EL RESPALDO DE:



ORGANIZA:



WWW.KANBANDAYPERU.COM

CÓMO IMPLEMENTAR UNA OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA



Javier R. Rodríguez Marrón

Especialista en Marketing and New Business Management. Gerente de Comercialización y Nuevos Negocios en Oil & Gas -Engineering & Construction, C.A.

Una organización de gestión de proyectos requiere conocer los procedimientos y procesos referentes al ciclo de vida de cada proyecto, con la finalidad de implementar los planes de negocio y estudiar los portafolios de oportunidades según los criterios de la organización. Para ello, debe centralizar y coordinar los proyectos asignados bajo su autoridad y aplicar procedimientos como los que describe la guía PMBOK del Project Management Institute (PMI).

Una oficina de gestión de proyectos de ingeniería requiere elaborar planes y procedimientos de trabajo según la disciplina que corresponda (procesos, mecánica, civil, electricidad, instrumentación, telecomunicaciones, entre otras); elaborar la lista de actividades, documentos y planos entregables; establecer los organigramas requeridos de acuerdo al alcance del proyecto; y elaborar las listas de verificación y procedimientos de aprobación, mecanismos, registros y verificación de trazabilidad para el avance de entregables (esto según los hitos de medición de avance preestablecidos entre la organización, o consultora de ingeniería o gestión, y el cliente).

Una oficina de gestión de proyectos (PMO) se encarga de generar las estrategias para alcanzar los objetivos, cumpliendo el alcance y estableciendo los controles y la planificación oportunos, con la finalidad de aplicar estrategias para minimizar los costos, las desviaciones y los riesgos en cada etapa de ejecución de los proyectos de ingeniería. De esta manera, conseguirá optimizar los recursos y gestionará las acciones necesarias para dar continuidad a los proyectos.

Se debe contar con un director de proyectos que comprenda el alcance, gestione los

recursos, apoye y comunique de forma eficiente a todas las unidades y departamentos de su organización los objetivos del proyecto, así como las acciones necesarias para que se desarrolle de forma continua y eficaz. A través de la directiva de la organización, se debe gestionar los recursos con los demás integrantes de la misma, según actividades planificadas. Se han de gestionar, asimismo, los riesgos y emergencias, y controlar el presupuesto y los tiempos de ejecución, asumiendo las responsabilidades necesarias para asegurar el éxito del proyecto.

Una oficina de gestión de proyectos (PMO) se encarga de generar las estrategias para alcanzar los objetivos, cumpliendo el alcance y estableciendo los controles y la planificación oportunos, con la finalidad de aplicar estrategias para minimizar los costos, las desviaciones y los riesgos en cada etapa de ejecución de los proyectos de ingeniería.

Para establecer una PMO, recomiendo desarrollar un acta de constitución, donde se establece su autoridad, alcance y responsabilidades iniciales de cara a satisfacer las necesidades y expectativas de la organización. Debe establecerse y firmarse un acta de inicio del proyecto como documento legal, con la fecha de arranque según el alcance del proyecto de implementación, y establecerse, además, el organigrama, la programación del trabajo y los mecanismos de control.

El director del proyecto tiene que contar con las habilidades necesarias para saber comunicar y gestionar las acciones pertinentes, procurando estimular a su equipo de trabajo y transmitir de manera eficiente, a las partes interesadas, el alcance del proyecto, los acuerdos contractuales, los factores ambientales y los riesgos de las actividades, así como consultar o proveer las recomendaciones de los especialistas, disponer de una visión global de la cartera de proyectos y de sus planes estratégicos, conjuntamente con los planes financieros de la ejecución de los proyectos a su cargo. Es esencial, en paralelo, conducir de manera eficiente las relaciones internas y externas con los clientes y entes gubernamentales, grupos sindicales o comunidades donde se desarrolle el proyecto.

Finalmente, como ejemplo, puedo hacer referencia a un proyecto de hidrocarburos que desarrollamos años atrás. En él definimos las

estrategias de ejecución teniendo en cuenta que el control adecuado de gerencia implicaba un alcance muy amplio que incluía el diseño, la procura y la construcción de equipos como tanques, bombas, tuberías, trazas de vapor, entre otros.

La estrategia de ejecución de este proyecto, a través de la oficina de Gestión de Proyectos, sugirió la contratación de una empresa consultora de ingeniería para realizar los entregables (documentos y planos) y apoyar en la procura, ya que la empresa ganadora del contrato era netamente de construcción. Sin duda, fue una decisión acertada, ante la propuesta de crear una oficina técnica, contratar y conformar el equipo multidisciplinario de ingenieros y proyectistas por parte de la empresa contratista. Esta decisión permitió agilizar la etapa de ingeniería necesaria y multidisciplinaria, para minimizar los tiempos de procura y realizar las labores tempranas con miras a comenzar las obras civiles y comprar equipos mayores aprobados por la ingeniería básica, antes de llegar a la etapa de ingeniería de detalles.

El desarrollo de obras civiles, mecánicas, de electricidad e instrumentación permitió dar un mayor avance al proyecto en cuestión, de acuerdo con las decisiones evaluadas por la oficina de Gestión de Proyectos asignada por la empresa contratista.



EXPERIENCIAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA PMO



Julio César Regalado Crisanto

Ingeniero mecánico-eléctrico por la Universidad de Piura (UDEP). Magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional de Piura (UNP). Cuenta con experiencia gestionando proyectos en los sectores de energía, telecomunicaciones y agroindustria. Project Manager certificado como PMP y PMI-RMP.

Las personas con altos cargos directivos se preguntan en algún momento por qué su organización necesita una PMO (oficina de Proyectos). La respuesta a esta pregunta es simple: las PMO pueden ayudar a las organizaciones a mejorar sus resultados de negocio, aunque no siempre tengan claro cómo, pues casi siempre existe la duda de si una PMO genera un valor real a la alta dirección.

Si analizamos el ámbito empresarial de Latinoamérica, y particularmente el peruano, podemos apreciar que existe una tendencia creciente vinculada con el desarrollo de metodologías para la gestión de proyectos. Estas incluyen la definición y uso de formatos, la estandarización de procesos en las diferentes áreas de conocimiento y, sobre todo, la contratación de project managers certificados. Lo antes mencionado constituye en un elemento motivador para aquellas organizaciones que, pudiendo o no tener alguna experiencia en gestión de proyectos, deciden implementar una PMO que les ayude a alcanzar sus objetivos estratégicos. Mi experiencia en la dirección de proyectos, principalmente en los sectores de agroindustria y telecomunicaciones, me permite confirmar el acierto de implementarlas.

En primer lugar, debo afirmar que no existe una única hoja de ruta a seguir para la implementación de una PMO. La razón es simple: cada organización tiene diferentes necesidades derivadas de sus problemas y expectativas. A esto hay que añadir el grado de madurez en sus capacidades y competencias técnicas y administrativas, lo que genera que cada proyecto de implementación sea diferente y, por tanto, tenga una planificación a la medida de cada organización.

¿Cómo debo iniciar el proyecto de implementación de una PMO?

En todos los casos debemos empezar con la recopilación de las necesidades de los stakeholders y la evaluación del grado de madurez organizacional en gestión de proyectos, para poder definir las funciones de la PMO que satisfagan las expectativas.

La principal limitación que podemos encontrar para implementar una PMO en las organizaciones es la pobre o nula cultura en gestión de proyectos que pueden poseer. Muchas veces esta situación se evidencia con actitudes típicas, como la aversión al riesgo de parte de la alta dirección, la resistencia al cambio organizacional del personal, la verticalidad funcional de las organizaciones y el manejo informal de una parte de sus procesos.

Cuando tuve la experiencia de implementar dos PMO, me encontré con dos realidades muy diferentes: una de las organizaciones ya contaba con una metodología implementada sobre la base del modelo predictivo del PMBOK®, y con un project manager que tenía el soporte de un planner y de un gestor logístico. Esta metodología se desarrolló, inicialmente, con el apoyo de la casa matriz de la organización. Por otro lado, en la segunda empresa se tenía un proceso de

transformación organizacional a todo nivel, que contemplaba como uno de sus pilares la implementación de una PMO que les permitiera ofrecer un elemento diferenciador para agregar valor a los proyectos que estaba ejecutando; sin embargo, no se tenía una metodología definida y la experiencia de los gestores de proyecto fue adquirida con la práctica.

El éxito de la implementación de una PMO reside en el compromiso y apoyo de la alta dirección de la organización y el liderazgo del PMO manager para lidiar con la resistencia al cambio organizacional y, al mismo tiempo, desarrollar una estructura organizacional con capacidad para soportar los servicios que serán ofrecidos por la PMO.

Claramente, en el segundo caso se tuvo un mayor trabajo al momento de planificar las tareas para la implementación de la PMO. Lo detallaré más adelante. Pero, en ambos casos, el uso apropiado de la comunicación a todo nivel y el compromiso de la alta dirección fueron factores que ayudaron a reducir o mitigar los riesgos identificados inicialmente y podrían haber comprometido el éxito de esta iniciativa.


¿Cómo implementar una PMO?

Lo primero es evaluar el nivel de madurez actual y definir el nivel de madurez objetivo de la organización. Hay que considerar, también, que debemos preparar a la organización para el cambio y, así, disminuir la resistencia al mismo.

En el caso de la primera empresa a la que hice mención anteriormente, no fue necesario realizar la evaluación del nivel de madurez, pues teníamos los resultados de una auditoría interna en gestión de proyectos, que evidenciaba las oportunidades de mejora que debíamos implementar. A partir del informe de auditoría, empezamos a definir la estructura organizacional que debía tener la PMO, así como también los procedimientos y formatos necesarios para la mejora de los procesos de gestión de los proyectos.

Luego de un año durante el cual, además, contratamos personal con experiencia para algunas posiciones, y tras varios procesos iterativos relacionados con la definición de los indicadores de gestión de proyectos, pasamos una nueva auditoría interna para verificar los avances en la implementación de la PMO. Obtuvimos un resultado satisfactorio, con el 95% de las observaciones levantadas. El 5% restante se vinculaba con procesos que estaban fuera del ámbito operacional de la PMO.

Para la segunda empresa, realicé la evaluación del nivel de madurez con la ayuda de un cuestionario aplicado a todos los niveles de la organización y preparado sobre la base de la herramienta OPM3® (Organizational Project

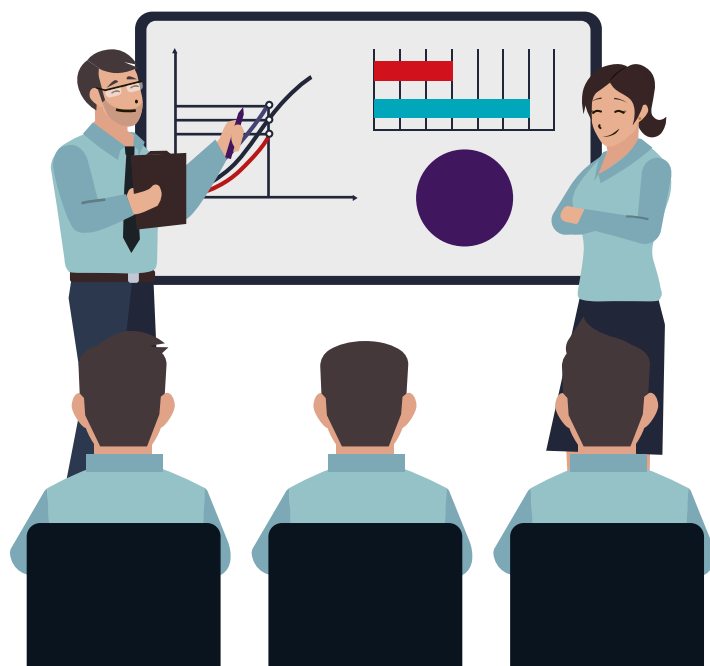

Management Maturity Model) desarrollada por el PMI (Project Management Institute). Una vez identificado el nivel de madurez y definida la metodología a implementar, se trazó una hoja de ruta para la implementación de la PMO, cuyas actividades paso a mencionar*:

- Definición de la visión, misión y objetivos de la PMO alineada con sus homónimos de la organización.
- Definición de la estructura de la PMO (organigrama) y de los roles y funciones de cada uno de sus miembros.
- Actualización de los flujogramas y procedimientos existentes.
- Actualización de formatos, métricas e informes existentes y definición de nuevos documentos, según la necesidad descrita en el flujograma.
- Definición de KPI de desempeño para los proyectos a ser gestionados.
- Definición de KPI de servicio para la PMO.

*Al término de cada actividad, se procuró elaborar un informe que documentara todo el proceso junto con la información de sustento correspondiente.

Una vez concluidas estas actividades, todo quedó listo para la implementación de la PMO, durante un tiempo en el cual se capacitaría al personal y se monitorearía el uso de los

procedimientos y formatos de registro. Este proceso de implementación depende de factores como la disponibilidad de recursos para las capacitaciones que cubran los vacíos de competencias del personal que formará parte de la PMO, la resistencia al cambio para el uso de la metodología definida, entre otros.

El rol del PMO manager es fundamental durante todo este tiempo. Debe ser un profesional versátil y con dotes de liderazgo, que sepa transmitir la información relacionada con el proceso al resto de profesionales y a todo nivel.

Como conclusión, y de acuerdo a mi experiencia, el éxito de la implementación de una PMO reside en el compromiso y apoyo de la alta dirección de la organización y el liderazgo del PMO manager para lidiar con la resistencia al cambio organizacional y, al mismo tiempo, desarrollar una estructura organizacional con capacidad para soportar los servicios que serán ofrecidos por la PMO.

A pesar de que una PMO proporciona múltiples beneficios a la organización, también es una realidad que no todas concluyen exitosamente su implementación. La estadística nos muestra que un gran porcentaje de implementaciones termina fracasando en un periodo menor a dos años desde su creación. La forma en que se implemente la PMO es clave; para ello, debemos poner énfasis en seguir una metodología, planificar el proceso como si fuese un proyecto y, sobre todo, realizar una buena gestión del cambio organizacional, especialmente si la empresa donde queremos establecer la PMO no tiene una cultura de gestión proyectos.

¿Quieres ser parte de las siguientes ediciones de la revista?



Completa el formulario

GP GESTIONA PROYECTOS



EDICIÓN N°3



GP GESTIONA PROYECTOS

revistagp@malbapmc.com

f / in: Gestiona Proyectos
