

GPD GESTIONA PROYECTOS



LECCIONES APRENDIDAS

Febrero - Marzo 2022

EDICIÓN N°3

SEMINARIO PRÁCTICO
ONLINE EN VIVO:

"FUSIÓN DE HABILIDADES DURAS Y BLANDAS EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS"

25 AL 30
ABRIL

Manejo de
conflictos

Toma de
decisiones

Resiliencia

Soft Skills

Comunicación

Liderazgo consciente

Empatía

informes@malbapmc.com



CARTA DEL DIRECTOR



Estimados amigos:

Me complace presentar la tercera edición de la revista *Gestiona Proyectos*, que en esta oportunidad desarrolla el tema central de las lecciones aprendidas. Se trata de una herramienta poderosa en el marco de la mejora continua para las organizaciones que implementan proyectos y requieren ser competitivas mediante la capitalización de sus propias experiencias para mejorar sus procesos, generar eficiencias y alcanzar los objetivos de sus respectivos casos de negocio.

En esta edición el tema de las lecciones aprendidas no solo resalta la importancia de registrar los eventos que generaron aprendizajes, sino también la trascendencia de difundirlos y de contar con un repositorio a nivel sistema o portal, que permita a las empresas mantener la información organizada y con acceso a los colaboradores que implementarán los proyectos venideros. Es así que los autores comparten los fundamentos de las lecciones aprendidas como eje de la gestión del conocimiento y creación de valor, su impacto en procesos como la gestión de riesgos, e invitan a la aplicación de dichas lecciones como herramientas para la toma de decisiones. Además, en nuestra sección de Experiencias, encontrarán lecciones a tomar en cuenta a partir de situaciones vividas en proyectos reales, que reafirman la relevancia de este tema.

En nuestra entrevista central nos acompaña Bernardo García, director general de BOGE Consultores en Venezuela, quien nos muestra la relación de las lecciones aprendidas con la cultura de gerencia de proyectos y su grado de madurez. Asimismo, nos brinda recomendaciones para realizar el registro y la difusión de las lecciones aprendidas, con miras a transformar el conocimiento tácito en conocimiento explícito y, de esta manera, lograr la competitividad y la excelencia en las organizaciones.

En esta ocasión también compartimos plantillas para el registro de lecciones aprendidas como bono especial para nuestros lectores; plantillas que pueden descargar junto a los artículos de acuerdo a cada temática.

Finalmente, estamos muy agradecidos con nuestros seguidores que nos acompañan en cada edición; con los autores, por su disposición a compartir sus conocimientos; los editores de contenido y de gráfica, que se lucen en cada detalle para ofrecer la mejor experiencia de lectura, y, en general, con todo el equipo de la revista *Gestiona Proyectos*.

¡A disfrutar de esta tercera edición! Continuamos con nuestro compromiso de aportar a la comunidad de gestores de proyectos.

Con aprecio,

Miguel Ángel Alba Luis


MÁS DE
4,000
CERTIFICADOS

Diplomados y cursos

Más de 14 años capacitando profesionales en América Latina en Dirección de Proyectos, Innovación, Metodologías Ágiles y Transformación Digital.

NUESTROS LIBROS

- ◆ **GESTIÓN AVANZADA DE RIESGOS EN PROYECTOS**
- ◆ **PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS**



Director

Miguel Ángel Alba Luis

Autores

Lina María Avendaño Medina (Colombia)

Oscar Javier Cárdenas Rodríguez (Colombia)

Gatherine Violeta Cueva Torrico (Perú)

Jonathan Zerpa Zerpa (Perú)

Julio César Regalado Crisanto (Perú)

Manuel Orlando Human Chávez (Perú)

Miguel Ramos Bernales (Perú)

Jorge Roger Frank Castro Castillo (Perú)

Javier R. Rodríguez Marrón (Venezuela)

Jose Arturo Palomino Higaonna (Perú)

Edición

Mariano Olivera La Rosa

Diseño Gráfico y Diagramación

Harold Carrasco Rodríguez

Asesoría Legal

Dra. Raquel Díaz Gastelu

TALLER

LIDERAZGO EN EQUIPOS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

INFORMES@MALBAPMC.COM

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL PARA LOGRAR EQUIPOS DE PROYECTOS
DE ALTO DESEMPEÑO CAPACES DE AFRONTAR DESAFÍOS CONSTANTES EN TIEMPOS
DE GRANDES CAMBIOS.

1 APRENDIZAJES DESDE EL LIDERAZGO

| TENDENCIAS

8

¿LECCIONES APRENDIDAS O LECCIONES POR APRENDER?

| TENDENCIAS

10

CONVERSANDO CON BERNARDO GARCÍA

| ENTREVISTA

12

4 MEJORES PRÁCTICAS EN EL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

| ACADÉMICO

16

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE LA BASE DE LECCIONES APRENDIDAS

5

| ACADÉMICO

18

LECCIÓN APRENDIDA: BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE VALOR

| ACADÉMICO

6

20

LECCIONES APRENDIDAS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS

| REGULATORIO

7

23

LECCIONES APRENDIDAS EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS

| EXPERIENCIAS

8

25

APRENDIENDO LA LECCIÓN CON EL CLIENTE

| EXPERIENCIAS

9

27

UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES

| EXPERIENCIAS

10

30

¿HASTA QUÉ PUNTO DEBEMOS TOLERAR EL ERROR EN NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO?

| EXPERIENCIAS

11

32

APRENDIZAJES DESDE EL LIDERAZGO



Lina María Avendaño Medina

Administradora de empresas. Consultora y docente universitaria en Gestión de Proyectos, Estrategia, Liderazgo Consciente, Intra/Emprendimiento, Generación de Consciencia Organizacional - Personal y Habilidades Empresariales. Gerente de Proyectos Estratégicos de Outsourcing Asociados Colombia SAS.

El liderazgo en la gestión de proyectos, junto con las habilidades en planificación, organización, ejecución, gestión y control, desempeña un papel muy importante para poder cumplir los objetivos planteados y guiar de la mejor forma todo lo referente a un proyecto. En mi trayectoria laboral, siempre han llamado mi atención los diferentes estilos de liderazgo ante logros, desaciertos o situaciones cambiantes que he podido apreciar desde la teoría y la práctica. A continuación, quiero compartirles tres casos específicos.

Caso 1

Ingreso de una nueva gerente general en un buró de crédito

Desde su ingreso, demostró un verdadero liderazgo. Conocía al detalle todo acerca de la empresa, el sector a nivel interno y externo, y a cada una de las personas del equipo de trabajo. No solo con una actitud cercana, sino también reconociendo los talentos y las habilidades de cada cual, empoderándolas, inspirándolas y comunicando de forma clara y oportuna los pasos y metas a seguir. Tomaba las decisiones del caso y organizaba al equipo con miras a un sueño común, entregando herramientas y recursos para la ejecución y diseño de nuevos proyectos.

¿Cuáles fueron sus logros en su primer año? Duplicó las ventas del proyecto y logró contar con un equipo de trabajo totalmente cohesionado, empoderado y confiado, lo que sirvió para lanzar otros productos. Por supuesto que también se presentaron dificultades, pero se pudieron resolver de la mejor forma.

¿Cuáles fueron los aprendizajes? Hubo un proceso adecuado de selección para contratar al líder del proyecto, con el conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias, lo que generó que se ganara el respeto y la confianza del equipo. Asumió su responsabilidad y enfocó al equipo de trabajo en su individualidad, incentivando la autogestión y confiando en sus integrantes.

Caso 2

Un líder de un grupo empresarial en proceso de reestructuración

Debido a diferentes situaciones, incluyendo la crisis del sector de este grupo junto con la crisis financiera, pude ver, en la práctica, a un líder negativo y nocivo en acción. Guiaba el proyecto, pero en el sentido opuesto al que debía hacerlo: incumplía acuerdos, procesos, requerimientos y compromisos adquiridos con los colaboradores y los proveedores. Además, utilizaba un vocabulario irrespetuoso, manipulaba las situaciones, entre otros comportamientos inadecuados.

Si un líder no cambia o no lo cambian, se debe hacer un alto y reflexionar si conviene seguir participando o no de un proyecto que no está alineado con los valores personales.

¿Qué resultados se obtuvo en el tiempo? Se perdió credibilidad, empeoró la reputación del grupo empresarial en el sector, se generó un ambiente laboral tóxico, los equipos de trabajo se desmotivaron, hubo una alta rotación de personal y de proveedores y una operación bastante cuestionada, pues no se logró entender la intención de este estilo de liderazgo a lo largo de más de diez años.

¿Cuáles fueron los aprendizajes? Si un líder no cambia o no lo cambian, se debe hacer un alto y reflexionar si conviene seguir participando o no de un proyecto que no está alineado con los valores personales. Pude observar el cambio del comportamiento y la adopción de nuevos métodos de interacción de algunos miembros del equipo, que optaron por esto ante la imposibilidad de renunciar al proyecto. Se generó resiliencia, pero también insatisfacción.

Así, pues, este proyecto me hizo saber cómo no debe ser un líder, persona, proyecto o empresa, y aprender la lección de aceptar que siempre van a existir proyectos y empresas irresponsables que defienden lo indefendible a un costo muy alto.

Caso 3

Acción indebida de uso de recursos en un proyecto

En el año 2018, un miembro del equipo del proyecto detectó una acción cuestionable de parte de otro integrante del equipo, y la demostró con hechos y datos, lo cual generó caos e impacto. El líder a cargo, al momento de enterarse, lo primero que hizo fue agradecer a dicho miembro del equipo por exponer la situación y, con un gran manejo emocional y una adecuada ejecución, tomó el mando de la situación en todos los aspectos: conoció el modus operandi, las fallas de los sistemas de control, la trazabilidad, las auditorías internas, las medidas legales, entre otros factores, para poder detectar la falla, corregirla y realizar todos los ajustes necesarios que garantizaran que una situación de esta clase no volviera a ocurrir.

¿Qué resultados trajo consigo esto? La renuncia inmediata de la persona implicada, la recuperación del 100% del valor perdido mediante acuerdos directos, demandas en trámite y la detección de fallas en los procesos. Todo ello condujo a la actualización y difusión de los sistemas de control, y al reconocimiento de las fallas del sistema financiero ante la validación de información.

¿Cuáles fueron los aprendizajes? Frente a una situación tan compleja e incómoda, siempre prevalecen valores como la integridad, la responsabilidad y la capacidad de ejecución que este gran líder supo impartir. En paralelo a su trabajo diario, él debía abrir un espacio para conocer y corregir en detalle lo sucedido. A nivel personal, me llevo la experiencia de que, si bien se debe confiar en los miembros de un equipo, no se debe pecar de exceso de confianza.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, deseo que tengamos como referencia estos aprendizajes para saber cómo queremos enfrentar los futuros retos que nos demandarán nuestros proyectos personales y profesionales.



¿LECCIONES APRENDIDAS O LECCIONES POR APRENDER?



Oscar Javier Cárdenas Rodríguez

Ingeniero civil, con certificación PMP vigente. Magíster en Gestión de Proyectos y Construcción. Candidato a PhD. Cuenta con experiencia en gerencia de proyectos de construcción en el sector hospitalario, institucional, de infraestructura vial y oil & gas. Es profesor universitario de posgrado en universidades de Colombia y Latinoamérica.

Solo se puede hablar de "lección aprendida" cuando una experiencia vivida en un tiempo anterior es considerada y su conocimiento es aplicado en un tiempo futuro. Pero... ¿cómo hacer para asegurarnos de que una lección por aprender se convierta en una lección aprendida?

Aunque, en general, en la literatura de gestión de proyectos se habla de "lecciones aprendidas", recientemente se han generado algunas discusiones sobre si este es el nombre correcto o si deberían denominarse, más bien, "lecciones por aprender".

En realidad, y a pesar de que algunos profesionales opinan que este es un asunto meramente semántico, los dos términos tienen significados diferentes. "Lección aprendida", por su redacción ("aprendida" es el pretérito del verbo "aprender"), parte de la premisa de que el conocimiento ya fue adquirido por las personas, migró a la organización y, por ende, se encuentra a disposición de esta para ser de utilidad en los proyectos futuros.

Por su parte, a pesar de que en la bibliografía no es común encontrar el término "lección por aprender", resulta muy importante que se conozca su existencia y que, a partir de ella, se fomenten los mecanismos para asegurar su trascendencia hasta convertirse en lección aprendida.

A continuación, se explicará la coexistencia de los dos conceptos ("lección por aprender" y "lección aprendida") en la gestión de los proyectos.

Tanto la lección por aprender como la lección aprendida hacen referencia al conocimiento generado a raíz del desarrollo de un proyecto,

en respuesta a una experiencia negativa (ejemplo: un error o un proceso deficiente) o positiva (ejemplo: una buena práctica, una forma más eficiente de ejecutar un proceso o actividad).

Bajo una perspectiva de mejora continua, ambas podrán permitir a una organización ser más eficaz y/o eficiente en el futuro, de manera que evite caer en los errores del pasado y/o incorpore buenas prácticas ya probadas en otros proyectos.

Tanto la lección por aprender como la lección aprendida hacen referencia al conocimiento generado a raíz del desarrollo de un proyecto, en respuesta a una experiencia negativa o positiva.

Tal vez la principal diferencia radica en que, como ya se mencionó, la lección por aprender aún no ha trascendido, porque no se han asegurado los mecanismos para que sea explotada frecuentemente y aporte beneficios a la organización. Se podría decir, entonces, que, para poder hablar de "lección aprendida", no solo basta con haber generado conocimiento a raíz de un proyecto, sino que

el requisito principal será que el conocimiento generado haya migrado desde las personas hacia la organización (entendida como un conjunto de personas).

Algunas organizaciones, conscientes de la importancia de la gestión del conocimiento, han incluido en sus modelos de gestión/maduración de proyectos, requisitos para que dicho proceso pueda darse. Herramientas tales como portales para consulta de lecciones originadas en otros proyectos, procedimientos de gestión de lecciones aprendidas, dependencias encargadas de la gestión del conocimiento e, incluso, modelos de gestión/maduración de proyectos que exigen como requisito aplicar un número mínimo de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, forman parte del arsenal de herramientas con el que cuentan.

Tal vez no sea suficiente, pero sí es un claro intento por asegurar los requisitos mínimos para que una lección por aprender se convierta en una lección aprendida. Estos requisitos son:

1. **Que se documente.**
2. **Que pueda y sea consultada.**
3. **Que se aplique en el futuro.**

Los mecanismos para asegurar su trascendencia dependerán de cada organización y pueden incluir sesiones específicas no solamente al término de una fase o hito del proyecto, sino también luego de haber superado una situación desafiante que haya generado conocimiento para el equipo del proyecto.

En conclusión, no es suficiente con generar conocimiento. Si este es instantáneo, efímero y muere en el olvido, no servirá de mucho. Se requiere de su uso futuro para que realmente podamos hablar de lecciones aprendidas. Es probable que en ello pensara Winston Churchill cuando escribió esta célebre cita: "Todos los hombres cometen errores, pero solamente los hombres sabios aprenden de sus errores".



"RECOPILAMOS LAS LECCIONES APRENDIDAS DURANTE LA TRAVESÍA, DESDE EL INICIO HASTA EL CIERRE"



Conversamos con Bernardo García, director general de BOGE Consultores en Venezuela. Con una amplia trayectoria, tanto en la industria de construcción y Oil & Gas como del software, nos habla acerca de la importancia de las lecciones aprendidas en los proyectos como uno de los ejes fundamentales para reducir el impacto de los riesgos.

Por Miguel Ángel Alba Luis

Los proyectos permiten incrementar la capacidad de generar valor en las organizaciones promotoras, sea que pertenezcan a instituciones públicas o privadas. Esta generación de valor, a su vez, permite a los usuarios contar con productos o servicios que les generan beneficios en los sectores de energía, transporte, educación, telecomunicaciones, salud, entre otros. Por ello, reviste importancia administrar los proyectos con las herramientas probadas, para acercarnos al éxito de la implementación de cada uno.

Si bien existen muchas herramientas, tal vez unas de las más poderosas son las lecciones aprendidas. Según la Guía PMBOK, en su sexta y séptima edición, estas se refieren al conocimiento adquirido de proyectos anteriores, que permite mejorar el desempeño de proyectos futuros.

Bernardo, según la publicación de Gartner Business Quarterly, editada durante el cuarto trimestre de 2021, las organizaciones proyectan colocar como prioridad la gestión de riesgos. En tu opinión, ¿cómo contribuye la gestión de las lecciones aprendidas a este esfuerzo que hoy las empresas enfocan como prioridad?

Inicialmente, les comento que la gestión de riesgos define el éxito de un proyecto, no lo hace solo la triple restricción ampliada (tiempo, costos, calidad, recursos, alcance, riesgo y la satisfacción del cliente). En consecuencia, el no poder contar con datos históricos de planes de respuestas frente a amenazas u oportunidades, matrices de probabilidad e impactos, registros de riesgos conocidos, o la aplicación del EVM (valor Monetario Esperado – Árboles de Decisión) de los proyectos realizados recientemente, indica que nuestro proyecto adolece de lecciones aprendidas (activos de los procesos

de la organización, base de datos del conocimiento – Guía PMBOK, sexta edición). Como consecuencia de esto, el proyecto transita por la vía de la incertidumbre. En este contexto, ¿lograremos completar los objetivos del proyecto?... Esa es la gran pregunta. Recopilamos las lecciones aprendidas durante la travesía, desde el inicio hasta el cierre.

¿Cómo define Bernardo García las lecciones aprendidas en los proyectos? ¿Por qué son tan importantes?

Mis mentores en *project management*, como Harold R. Kerzner, PhD, me mostraron la importancia de escribir las lecciones aprendidas de un proyecto, desde el principio y antes del cierre del mismo. La razón es que debemos mejorar la gestión del conocimiento y realizar mejores estimaciones, resolver conflictos y ser exitosos en el proyecto y como directores de proyectos.

Las lecciones aprendidas se relacionan con la gestión del conocimiento de las organizaciones. ¿De qué manera podemos realizar esta gestión?

En mi experiencia, es sencillo: documentando todo lo que ocurre en los proyectos que generan valor, datos reales de tiempo, costos, desempeño y resolución de problemas del equipo. Es fundamental crear la cultura en el equipo de escribir todo esto en un cuaderno de notas durante todo el ciclo de vida de los proyectos. La gestión del conocimiento se basa en dicha información generada y recopilada por el proyecto, y organizada de manera sistemática. Así, se logra la generación de valor para la organización en futuros proyectos; pero antes, de acuerdo a mi experiencia, hay que fomentar la madurez en el equipo.

De lo anterior, encontramos que no solo debemos registrar las lecciones aprendidas, sino también difundirlas al interior de la organización. ¿Por qué es importante hacerlo y cómo podemos llevarlo a cabo?

Si la actividad se realiza y no se difunde, es trabajo engavetado en un escritorio electrónico: se escribió todo y se perdió el esfuerzo. Una de las sugerencias es difundir en la organización nuestras lecciones aprendidas, con la intención de aprender de los errores, problemas, solución de problemas del equipo, y convertirlos en las mejores prácticas de *project management*. La tecnología ayuda a que las organizaciones implementen en su intranet portales relacionados con la dirección de proyectos, de modo que los nuevos jóvenes profesionales entren rápidamente en el proceso productivo utilizando la experiencia de otros.

"Si una actividad se realiza y no se difunde, es trabajo engavetado en un escritorio electrónico: se escribió todo y se perdió el esfuerzo".

Respecto al repositorio de lecciones aprendidas, ¿qué recomendaciones puedes brindarnos para poder implementarlo en las organizaciones?

Según mi experiencia en las industrias de Oil & Gas y de las telecomunicaciones y obras civiles, los repositorios de las lecciones aprendidas deben estar organizados adecuadamente en la intranet de la organización, con una característica fundamental: el acceso a esa fuente de información debe ser sencillo, práctico y seguro. En mi trayectoria en desarrollo de PMO Directivas, tuve la responsabilidad de implementar estos portales y mantenerlos actualizados. Dicho de otra forma, se trata de un sitio web dentro de la intranet de la organización. De esta manera, toda la información generada por los proyectos se mantiene registrada a partir de las buenas

prácticas de control de los documentos del proyecto.

El aprendizaje que se encuentra en la mente de los miembros del equipo es conocido como "conocimiento tácito". ¿Cómo logramos que este conocimiento pueda hacerse explícito, de modo que permita a la organización intervenir en los procesos y mejorarlos?

El grado de madurez y la cultura de gerencia de proyectos de la organización hacen posible que ese conocimiento tácito de los miembros del equipo se pueda transferir a uno explícito. Esto permite a la organización intervenir en los procesos de gestión de proyectos y mejorarlos. En las organizaciones donde no existen estas características, se pierde mucho conocimiento y experiencia, porque el equipo del proyecto se la lleva consigo y, en algunos casos, también se lleva parte de la documentación generada por el propio individuo. Es la experiencia que tuve en organizaciones donde no existía esta cultura de gestión de proyectos, a pesar de que podían trabajar usando algunos aportes de la Guía PMBOK.

Finalmente, Bernardo, ¿cómo podemos aprovechar la potencia de las lecciones aprendidas de los proyectos anteriores para lograr la competitividad y la excelencia en las organizaciones?

Ciertamente, esa es una de las buenas prácticas de la dirección de proyectos, a partir de las cuales el potencial de las lecciones aprendidas se transforma en el logro de mejores proyectos y se traduce en la competitividad y la excelencia de la organización durante los procesos licitatorios en relación con otras organizaciones. Hay otra consideración importante al respecto: la experiencia acumulada (buenas prácticas de gestión de proyectos) y la gestión del conocimiento soportan las nuevas experiencias de los profesionales que ingresan a la organización a ejecutar futuros proyectos, ya que ellos se alimentan de dichas lecciones aprendidas. En consecuencia, todo esto repercute en el éxito de los proyectos.



BOGE
CONSULTORES
Training & Consulting



METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS

CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

MEJORES PRÁCTICAS EN EL REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS



Catherine Violeta Cueva Torrico

Directora de Desarrollo Profesional PMI Lima. Ingeniera industrial bilingüe con más de once años de experiencia en Gestión de Proyectos y Gestión de Riesgos. Certificación Internacional PMP®, PMI-RMP®, Scrum Máster Profesional. Certificado ISO 22301. Auditora Líder 9001 by IRCA.

¿El conocimiento nos da poder? Pues claro que sí. La información genera poder. Conocer las lecciones aprendidas antes de iniciar un proyecto implica tener ventaja sobre posibles escenarios desfavorables y, sobre todo, poder capitalizar oportunidades para propiciar escenarios favorables.

Un repositorio de lecciones aprendidas contiene el know how de una organización, que servirá de lectura previa a la hora en que se implementen proyectos futuros que pueden ser similares en procesos, objetivos u otros factores. En este sentido, es importante que los documentos del repositorio no solo nos informen sobre qué salió mal, sino también acerca de qué dio buenos resultados.

Es un gran desacierto no documentar las lecciones aprendidas de un proyecto que fue desestimado o dado de baja al poco tiempo de haber iniciado, ya que se estaría perdiendo el valor del porqué fue desestimado.

La Guía PMBOK, en su séptima edición, indica que “un registro de lecciones aprendidas se utiliza para registrar los conocimientos adquiridos durante un proyecto, fase o iteración, de modo que se puedan utilizar para mejorar el desempeño futuro del equipo del proyecto y/o de la organización”. Así, pues, es clave elaborar siempre un registro de lecciones aprendidas sobre cada proyecto.

¿Cómo explotar esta buena práctica? A continuación, expongo siete importantes consideraciones a tener en cuenta en relación a las lecciones aprendidas:

1

Un proyecto se debe iniciar luego de revisar las lecciones aprendidas de anteriores proyectos.

2

Las lecciones aprendidas deben documentarse cuando ocurre el suceso a tener en cuenta en el futuro. Esto implica evitar dejar las cosas para el final del proyecto, cuando generalmente ya no recordamos bien los hechos.

3

Es un gran desacierto no documentar las lecciones aprendidas de un proyecto que fue desestimado o dado de baja al poco tiempo de haber iniciado, ya que se estaría perdiendo el valor del porqué fue desestimado, pudiendo incluso repetirse estos motivos en un siguiente proyecto.

4 El repositorio no solo debe señalar los sucesos desfavorables, sino también sus posibles soluciones; del mismo modo cómo se aprovechó la oportunidad de los sucesos favorables.


5 Durante la redacción del repositorio, se debe reflexionar sobre la base de las siguientes preguntas: ¿Qué debemos hacer que no se hizo? ¿Qué debemos evitar hacer? ¿Qué debemos volver a hacer?

6 La información debe ser introducida en el registro por las personas que participaron activamente en el proyecto. Inequívocamente, a veces es completada por personas ajenas al proyecto.

7 Mientras más consolidado se tenga un repositorio de lecciones aprendidas, se estiman mayores probabilidades de éxito en futuros proyectos similares.

Si bien la Guía PMBOK, en su séptima edición, recomienda que cada entregable cuente con sus respectivas lecciones aprendidas, también llamadas retrospectivas, la frecuencia de registro debe ser evaluada y establecida por cada equipo de proyecto u oficina de proyectos, según sus recursos y metodología.

En conclusión, un buen repositorio de lecciones aprendidas debe contener la esencia de la información, de tal modo que a los *stakeholders* del nuevo proyecto les sirva de manera valiosa su contenido, tanto para detectar oportunidades como para prevenir amenazas en los proyectos en curso y futuros.

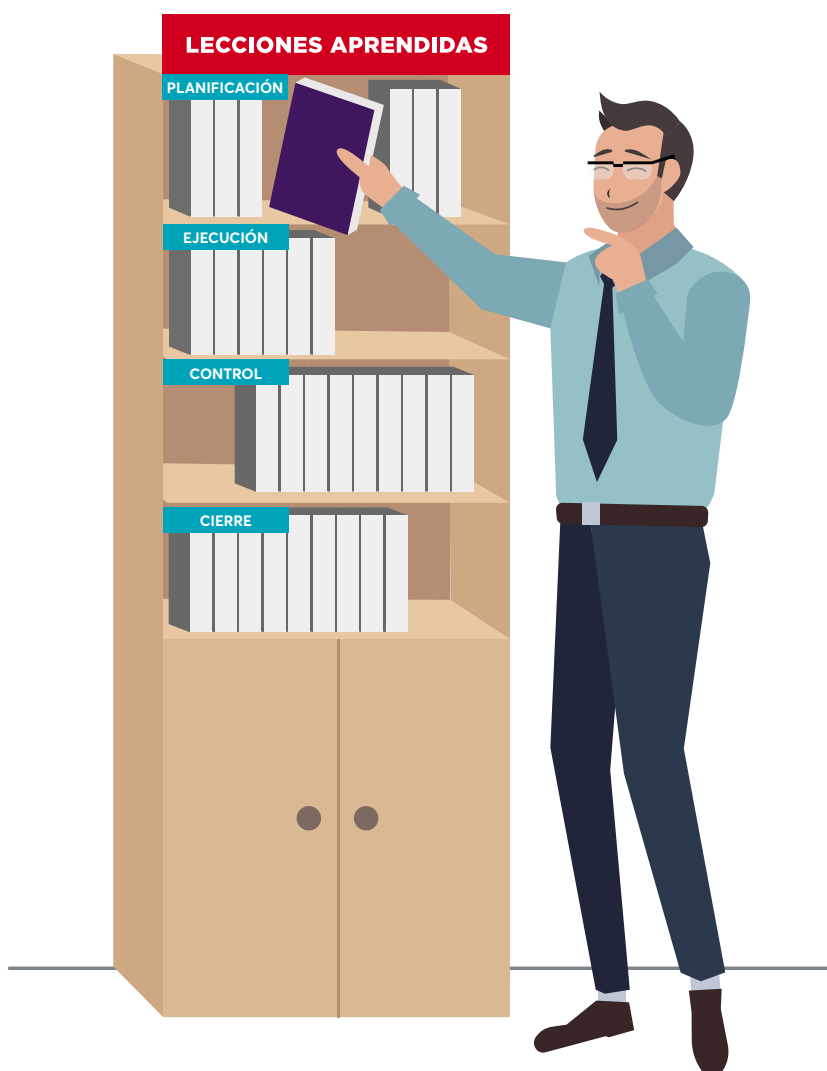

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA BASE DE LECCIONES APRENDIDAS



Luis Jonathan Zerpa Zerpa

Magíster en Project Management por la Universidad ESAN y la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Ingeniero de sistemas, actualmente Consultor Asociado PMO de PMOfficers España y CEO de la empresa Delta Project Management, que se dedica a la consultoría, asesoría en gestión de proyectos e implementación de oficinas de proyectos (PMO's).

A continuación, a partir de una realidad que nos involucra a todos, planteamos **tres recomendaciones esenciales con miras a gestionar de manera adecuada las lecciones aprendidas.**

En el año 2019 se llevó a cabo la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos en Lima. La majestuosa puesta a punto de este evento fue la culminación de uno de los proyectos de ingeniería más exitosos que se han desarrollado en el Perú, debido, entre otros factores, a la inclusión de medidas y buenas prácticas en gestión de proyectos y toma de decisiones.

En 2020, nuestro país, como el resto del mundo, enfrentó el reto de una pandemia global que nos trajo resultados completamente distintos, por no decir catastróficos. Esto en contraste con acciones que sí resultaron en la gestión de la pandemia, como, por ejemplo, las realizadas en el municipio de Cape Town, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, donde se implementaron buenas prácticas de gestión de proyectos para la atención del cerco sanitario y cuarentenas a ciudadanos con covid-19; o las llevadas a cabo en el hospital NHS Nightingale de Londres, donde se puso en marcha una oficina de gestión de proyectos para implementar iniciativas de mejora en sus servicios en medio de la pandemia.

¿Hubiéramos podido reaccionar de manera óptima si hubiéramos adoptado estas buenas prácticas en gestión un año antes y las hubiéramos aplicado durante la pandemia? ¿Por qué no logramos aprender de lo que ya habíamos hecho bien o mal en el pasado? ¿Por qué no aplicamos estas lecciones aprendidas? Recopilar buenas prácticas y gestionar el conocimiento adquirido son, usualmente,

costumbres poco difundidas y valoradas, pues, por lo general, se castiga el error en vez de validar el conocimiento y la enseñanza que puede traer consigo.

Por lo general, se castiga el error en vez de validar el conocimiento y la enseñanza que puede traer consigo.

Así, para una adecuada gestión de las lecciones aprendidas, podemos redactar una serie de recomendaciones generales a tomar en cuenta:

1

Recopilar adecuadamente los hallazgos en el momento de su aparición.

Esto, más allá de lo obvio en el espacio-tiempo, implica que los gestores y líderes de los proyectos tengan las capacidades técnicas y blandas para identificar de manera correcta una lección aprendida. Al momento de redactar los hallazgos, podemos tomar en cuenta las recomendaciones del BID acerca de su enunciado: describir las condiciones en las que se identificaron los hallazgos, las causas o factores que dieron lugar a ellos, la situación final como resultado o consecuencia de las decisiones tomadas y la acción correctiva e ideal basándose en la buena práctica propuesta.



2

Desarrollar la gestión del conocimiento en la organización.

Luego de la recopilación, su uso depende de que no solamente exista un repositorio centralizado y disponible, sino también de que se ejecute una gestión de conocimiento constante y transversal a todos los proyectos de la organización, de modo que estas lecciones aprendidas y buenas prácticas se puedan reimplementar y el nuevo conocimiento generado pueda seguir el mismo proceso inicial. Esta gestión viene siendo muy promovida dentro de la implementación de las oficinas de proyectos alrededor del mundo.

3

La cultura de proyectos debe existir a todo nivel.

Si bien es cierto que las lecciones aprendidas se extraen de los errores y los éxitos, es importante que la cultura organizacional permita que haya un reconocimiento e identificación adecuados de ambos escenarios, para evitar que estas lecciones se pasen por alto (sea por modestia, en caso se trate de un logro, o por miedo a la reprimenda jerárquica, en caso se trate de un fallo).

Actualmente, en el marco de un entorno pospandémico, estamos entrando a una etapa distinta en cuanto a las relaciones profesionales. Nos encontramos, sin duda, en un contexto cambiante, por lo que el uso y la gestión adecuada de las lecciones aprendidas, y la misma gestión de conocimiento en sí, son esenciales de cara al éxito de los proyectos y las organizaciones.

LECCIÓN APRENDIDA: BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE VALOR



Julio César Regalado Crisanto

Ingeniero mecánico-eléctrico por la Universidad de Piura (UDEP). Magíster en Ingeniería Ambiental por la Universidad Nacional de Piura (UNP). Cuenta con experiencia gestionando proyectos en los sectores de energía, telecomunicaciones y agroindustria. Project Manager certificado por el PMI.

En algún momento de nuestras vidas debemos haber experimentado la sensación de que el resultado final de aquello que tanto nos costó planificar pudo ser mejor si hubiésemos considerado realizar determinada acción de una manera diferente. Esta situación cotidiana constituye una forma de aprendizaje personal que puede ser extrapolado a la gestión de proyectos bajo el nombre de "lecciones aprendidas".



Se trata de una herramienta muy importante de la gestión del conocimiento. Como project managers, debemos manejarla en nuestro trabajo, especialmente cuando planificamos la ejecución de un proyecto sin importar el grado de complejidad del mismo.

Son pocas las entidades que cuentan con un repositorio de lecciones aprendidas. En otras palabras, está poco desarrollado el hábito de registrar apropiadamente el conocimiento adquirido a través de la ejecución de un proyecto. La idea es que, al hacerlo, pueda estar disponible como parte de los activos de los procesos de una organización.

Pero las lecciones aprendidas no tienen por qué describir solamente los errores cometidos; al contrario, es importante e imprescindible que también nos ilustren sobre todas las situaciones de éxito experimentadas. Estas servirán de referencia para que, en el futuro, puedan aumentar las probabilidades de repetir los resultados deseados y evitar aquellos que incentiven el fracaso de los proyectos.

Si bien puede asumirse que las lecciones aprendidas tienen que desarrollarse al final de un proyecto, la guía PMBOK, en su sexta edición, recomienda que la práctica de registrarlas debe mantenerse constante a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto.

Para ello, debemos utilizar los medios más apropiados como formatos de registro individuales o colectivos, que luego serán almacenados en un repositorio digital para su consulta posterior.

La práctica de registrar las lecciones aprendidas debe mantenerse constante a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto.

Los formatos de registro de lecciones aprendidas pueden resultar muy básicos en su primera versión. Sin embargo, conforme van registrándose, podrán ir evolucionando de forma positiva hasta alcanzar la madurez de la organización en las competencias de gestión de proyectos. Es importante sumar el aporte de los miembros del equipo, mientras estos se adaptan a la metodología establecida de antemano.

Luego del registro, la difusión de este conocimiento es fundamental. El poder programar un espacio para su presentación dentro de las reuniones de seguimiento debe convertirse en un buen hábito de gestión a través del ciclo de vida de un proyecto. En este contexto, dejar esta presentación para la reunión de cierre puede implicar el riesgo de que la información en cuestión no se trate con la profundidad necesaria.

La Guía PMBOK menciona que la base del conocimiento forma parte de los activos de los procesos de la organización. Además, establece que las lecciones aprendidas constituyen en sí mismas una herramienta fundamental dentro de la propia organización. Es aquí donde toma un sentido

integral la práctica de registro y difusión, como fuente de conocimiento en el marco de la mejora continua.

Entonces, ¿cómo podemos realizar el registro de las lecciones aprendidas?

Pese a las múltiples referencias que se mencionan en la mayoría de procesos, no es posible encontrar en la Guía del PMBOK una descripción clara de cómo se debería registrar una lección aprendida. Una sugerencia práctica es que, al momento de llevarlo a cabo, se haga uso de un sistema de clasificación que podría basarse en las diferentes áreas de conocimiento de la gestión de proyectos. De esta manera, se obtendría una estadística que permitiría identificar, luego, aquellas situaciones que resultaran frecuentes y propiciarán implementar las mejoras correspondientes.

Para el registro, también se pueden considerar otros aspectos, como la etapa o fase en que se produjo el evento, la lección propiamente aprendida y una recomendación para los futuros proyectos. El llevar a cabo este registro permitirá formar una base de información valiosa para la organización.

Debemos recordar que el conocimiento es considerado un activo intangible de las organizaciones y que, a su vez, juega un papel estratégico en la creación de valor dentro del ámbito empresarial. Hoy en día, es impulsado por la globalización, un marco en el cual el éxito solo será alcanzado por aquellas empresas que sean flexibles y posean la capacidad de aprender y reaprender, con miras a mejorar continuamente y generar un verdadero valor agregado en cada uno de sus procesos.

Si necesitas plantillas de registro de lecciones aprendidas, te ofrecemos esta versión gratuita aquí:

Registro de lecciones aprendidas



CURSO - TALLER

GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y ELÉCTRICOS

INFORMES@MALBAPMC.COM

UNA COMPRENSIÓN AMPLIA SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS
DE INFRAESTRUCTURA, CONSIDERANDO LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN,
SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

LECCIONES APRENDIDAS EN A GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS



Manuel Orlando Human Chávez

Ingeniero ambiental por la Universidad Nacional de Cajamarca. Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental por UEMC. Especialista en Regulación y Fiscalización Ambiental por la UPC. Especialista en Gestión Ambiental.

Durante el proceso de gestión de proyectos surge una serie de dificultades que los ponen en riesgo.

Superar estos eventos implica el uso adecuado de un amplio abanico de estrategias, destrezas, técnicas y procedimientos desplegados por la organización. Por el contrario, el fracaso evidencia alguna carencia (comunicacional, de recursos humanos, de procesos, etc.). No obstante, ambas situaciones constituyen una fuente de información que permite obtener lecciones aprendidas.

Hay que tener presente que las lecciones aprendidas representan activos de la organización. Al respecto, la sexta edición de la Guía PMBOK establece el registro de las lecciones aprendidas como parte de los documentos de un proyecto.

En el desarrollo de la gestión ambiental de proyectos de infraestructura debemos utilizar todas las herramientas que nos permitan anticiparnos a la manifestación de riesgos. Dentro de ellas, se resalta la importancia del empleo de lecciones aprendidas.

De acuerdo al Informe de Riesgos Globales 2022 del Foro Económico Mundial (*The Global Risks Report 2022, 17 edición*), dentro de los diez principales riesgos globales se sitúan los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los daños humanos al medio ambiente y la crisis de recursos naturales. A nivel nacional, atravesamos graves problemas de pérdida de biodiversidad, deforestación, cambio climático, riesgo de desastres, deterioro de la calidad y disponibilidad del

agua, contaminación del aire en las ciudades, etc. En este contexto de crisis ambiental, los proyectos de infraestructura afrontan cada vez mayores desafíos y resistencia social debido a su potencial de generar impactos en el ambiente. En vista de ello, en el plano gubernamental la regulación ambiental de nuestros países es cada vez más exigente; y, en el plano empresarial, han tomado preponderancia aspectos reputacionales basados en criterios de sostenibilidad.

Por esta razón, en el desarrollo de la gestión ambiental de proyectos de infraestructura debemos utilizar todas las herramientas disponibles que nos permitan anticiparnos a la manifestación de riesgos. Es aquí donde reside la importancia, para la gestión ambiental, del uso de las lecciones aprendidas de una organización. Estas pueden haberse obtenido de proyectos anteriores, de otros proyectos en ejecución o de un mismo proyecto en marcha.

De hecho, llevar adelante la gestión ambiental de proyectos de infraestructura sin usar las lecciones aprendidas de la organización, es decir, usando solamente los conocimientos y la "intuición" del equipo, pone en riesgo el proyecto. Esto porque podrían materializarse los mismos riesgos del pasado y obtenerse los mismos resultados de proyectos anteriores o similares, sin ninguna mejora.

Pongamos un ejemplo:

La empresa Carreteras SA, desde el año 2004, ejecuta sus proyectos bajo la metodología PMI y dispone de un banco de lecciones aprendidas con aportes de todas sus áreas. En sus últimos dos proyectos, la empresa tuvo serias dificultades debido a demoras en la elaboración y aprobación del estudio de impacto ambiental y por el surgimiento de conflictos sociales que ocasionaron que un proyecto se cancelara con el 60% de avance y que el otro culminara con pérdidas económicas superiores al 10% de la utilidad prevista.

En ese contexto, y por incremento de actividades, se contrataron a dos jefes de Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias, adicionales a los dos existentes. Al primero se le asigna un proyecto que consiste en una vía de 250 kilómetros que une dos departamentos, cuyo tramo inicia en la ciudad "M", a 4,000 msnm, y culmina en el puerto "H", en la costa peruana. Al segundo se le asigna una vía de 280 kilómetros que une tres departamentos, cuyo tramo inicia en la localidad "O", a 5,000 msnm, y finaliza en la ciudad "C", en la costa peruana.

Así, en el proceso de certificación ambiental surgen los siguientes riesgos:

- 1** Entrega tardía por el área de Ingeniería de la memoria descriptiva y el plano de distribución física del proyecto.
- 2** Carencia de consultores especializados en ecosistemas altoandinos.
- 3** Reclamos de comunidades campesinas ubicadas fuera del área de influencia.

Frente a estos riesgos, estos jefes actuaron del siguiente modo:

El primero empleó "criterios propios" y omitió aplicar las lecciones aprendidas de la organización. En ese sentido, estableció: i) Reuniones con los gerentes de Ingeniería, Logística y Presupuesto para requerir las memorias descriptivas y planos. ii) Prosiguió el proceso y contrató consultores no especializados.

iii) Generó reuniones de coordinación con las comunidades reclamantes. Al final, los riesgos de proyectos anteriores no tomados en cuenta se materializaron y el proyecto tuvo retraso en la certificación, estudios de baja calidad y supuso el descontento general de todas las comunidades cercanas con amenazas de paralización.

El segundo jefe revisó e implementó las lecciones aprendidas de la organización y, frente a estos riesgos, llevó a cabo las siguientes medidas: i) Generó un sistema de reuniones técnicas entre el personal de las áreas de Medio Ambiente, Ingeniería, Logística, Presupuesto y Administración, para obtener, de manera oportuna, información validada y útil para la elaboración de los estudios ambientales. ii) Amplió la cartera de consultores y capacitó al consultor adjudicado en ecosistemas altoandinos sobre la base de las experiencias previas de la empresa. iii) Elaboró un programa de gestión social preventiva. Al final, los riesgos registrados fueron mitigados y el proyecto se mantuvo dentro de las holguras del cronograma, tuvo estudios ambientales adecuados y manejó estratégicamente a las comunidades cercanas.

El ejemplo anterior es una simplificación de los beneficios que derivan del uso de las lecciones aprendidas en la gestión ambiental de proyectos. Dichas lecciones constituyen una herramienta muy potente para la gestión en general, incluso para la vida misma. Lo que busca es lograr la mejora continua a través de la identificación y el registro de las mejores prácticas frente a situaciones riesgosas.

Es importante resaltar que el término "lecciones aprendidas" no equivale a la experiencia o expertise de cada integrante de la organización. Por el contrario, las lecciones aprendidas conllevan una visión sistémica; es decir, reflejan el modo exitoso que tiene una organización para afrontar las situaciones riesgosas que se le presentan. En ese sentido, omitir el uso de esta herramienta implicaría realizar la gestión "con los ojos vendados", situación que resulta inadmisible si buscamos el éxito organizacional en cada proyecto en que participamos.

LECCIONES APRENDIDAS EN LA CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIOS



Miguel Ramos Bernalles

Profesional en Ingeniería de Sistemas y Gestión de Proyectos de Tecnología. Certificado como PMP y PMI-RMP por el Project Management Institute. Docente en cursos de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI.

Una de las claves que contribuye a llevar a cabo una adecuada gestión de proyectos es la revisión y análisis de la información histórica. Las buenas prácticas recomiendan que toda organización debe contar con un repositorio de información que pueda ser consultada y utilizada por otros proyectos que lo requieran. En este artículo quiero compartir la experiencia que viví hace algunos años en relación al proceso de adquisición de servicios de un proveedor para el desarrollo de un sistema.

Según la estructura organizativa de una empresa, se puede saber qué área, departamento o grupo de persona administra la información histórica. Puede estar bajo la responsabilidad de la Oficina de Gestión de Proyectos, también conocida como PMO (Project Management Office), que, en este caso, será la encargada de gestionar dicha información y brindar acceso a los diferentes equipos de proyectos que lo soliciten.

En el marco de la información histórica, las lecciones aprendidas son de las más importantes a utilizar, ya que contienen información relevante sobre las experiencias de proyectos pasados. Considerar como referencia estas experiencias resulta de suma importancia, pues permite tomar decisiones acertadas o mejorar algún aspecto del proyecto a desarrollar.



En líneas generales, el alcance del proyecto en que participé consistía en desarrollar para los usuarios un sistema de vigilancia de enfermedades. Incluía un sistema IVR (Interactive Voice Response), por el cual el usuario llamaría a un número telefónico y una grabación lo dirigiría a través de las distintas opciones disponibles, de acuerdo a lo que fuera eligiendo.

Para desarrollarlo, se tomó la decisión de contratar a un proveedor que contara con el conocimiento y la experiencia necesarios. Se comenzó la búsqueda de proveedores que brindaran este tipo de servicio. Se hizo a través de la web y/o preguntando a otras personas o contactos si conocían a alguna empresa con experiencia en el tema. En primera instancia, se contactó a una empresa con la cual se tuvo una reunión para conocerla un poco más. Se le explicó el componente IVR que se necesitaba, y luego esta empresa envió su propuesta.

Posteriormente, se contactó a otra empresa que, según su página web, poseía mucha experiencia en el tema y había prestado el servicio de desarrollo de sistemas IVR a varios clientes. Se le convocó a una reunión y esta empresa hizo una presentación muy buena: destacó con solidez sus conocimientos y trayectoria a nivel profesional. Además, comercialmente, logró establecer una conexión con todo el equipo, ya que ejecutó un buen manejo de habilidades interpersonales.

como la comunicación, la escucha activa, la influencia y la confianza. La citada empresa, entonces, envió su propuesta y, finalmente, fue aceptada.

Durante las primeras semanas, el trabajo se llevó a cabo de forma cercana y coordinada. El proveedor respondía los correos, asistía a las reuniones planificadas, había mucha comunicación, ideas, retroalimentación de ambas partes, y se estaba avanzando muy bien con el trabajo.

Sin embargo, poco a poco se comenzó a crear una distancia, dado que el proveedor dejó de responder los correos a tiempo, cancelaba algunas reuniones, no informaba sobre los avances, y el seguimiento del trabajo, en consecuencia, se hizo más complicado.

No todo lo que se muestra en una página web o cualquier red de contacto acerca de un potencial proveedor es información real o válida.

Así, llegó el momento en que el proveedor debía presentar la primera parte del sistema IVR y, lamentablemente, se comenzaron a encontrar muchos errores. El flujo de opciones no era el adecuado, o el sistema se caía y dejaba de funcionar, o al elegir cierta opción no empalmaba correctamente con las demás opciones.

Ante este panorama, se documentó y se informó al proveedor sobre todos los errores encontrados y este se comprometió a subsanarlos. Pero otra vez se generó una distancia fomentada por ellos: no informaban sobre los avances y la comunicación, una vez más, se tornó difícil. La buena relación que se tenía en un principio se resquebrajó por el incumplimiento, la propia falta de comunicación y la mala calidad del producto que estaba presentando el proveedor. Luego se comprometió a cumplir con el alcance, pero su desempeño no mejoró.

Llegó, pues, el momento de tomar la decisión de rescindir por incumplimiento el contrato con el proveedor, y de aplicar todas las penalidades correspondientes.

Definitivamente, esta experiencia sirvió a todo el equipo del proyecto para aprender una serie de lecciones aprendidas. Entre las principales se puede mencionar las siguientes:

- Definir criterios de selección para evaluar, a través de atributos, a los posibles candidatos o proveedores.
- Establecer un sistema de ponderación que otorgue un peso (importancia) a cada criterio que se va a evaluar.
- Revisar información histórica de proyectos anteriores para conocer los criterios de selección que se utilizaron en el pasado y analizar si estos pueden considerarse en el proyecto actual.
- Analizar de forma más exhaustiva a los posibles candidatos que cumplen con los criterios de selección utilizados. Ojo, no todo lo que se muestra en una página web o cualquier red de contacto es información real o válida.
- Pedir a los posibles proveedores referencias de trabajo y de clientes anteriores, para contactarlos y solicitar algún comentario o recomendación acerca del trabajo realizado por dichos proveedores.
- Contar con una lista o base de datos de proveedores que ofrezcan el mismo producto o servicio, para contactarlos inmediatamente como reemplazo en caso se originen situaciones no deseadas.

Como conclusión final, se puede decir que, si bien es cierto que la primera impresión y la presentación de un proveedor son importantes porque crean una conexión o sentimiento de confianza, estas no garantizan que realizará un buen trabajo o que entregará el producto o servicio de acuerdo a los estándares de calidad requeridos. Hace falta una mayor investigación o análisis para evaluar si realmente todo lo que muestra o dice que hace es fidedigno, o si se limita a exhibir una buena carta de presentación con riesgos ocultos que saldrán a la luz durante la ejecución del trabajo contratado.

APRENDIENDO LA LECCIÓN CON EL CLIENTE



Jorge Roger Frank Castro Castillo

Ingeniero mecánico-eléctrico, MBA, PMP®, docente universitario en Universidad de Piura (UDEP)

Como cada proyecto es un conjunto de actividades delimitadas en un marco temporal para lograr un objetivo, es lógico esperar que, mientras el equipo de proyectos adquiere "horas de vuelo", sus métodos y acciones vayan "pulíéndose" paulatinamente sobre la base de la experiencia acumulada. Este proceso de mejora continua puede darse a través de la herramienta de las lecciones aprendidas.

En su sexta edición, la Guía PMBOK define este proceso de mejora continua como la recopilación del "conocimiento adquirido durante un proyecto, que muestra cómo se trataron los eventos del proyecto o cómo deberán abordarse en el futuro con el propósito de mejorar el desempeño futuro". Supone, pues, un momento de reflexión necesario por parte del equipo de trabajo, a fin de revisar y rescatar los hechos que tuvieron más impacto, tanto positivo como negativo, durante el desarrollo de un proyecto.

Sin embargo, repasar las lecciones aprendidas puede tener una eficacia aún mayor si se involucra también al cliente. Esto lo comprobé hace algunos años, durante la puesta en marcha de un proyecto para una empresa referente en la distribución de energía eléctrica en el país, experiencia que trataré de resumir en las siguientes líneas.

El proyecto consistía en desarrollar la ingeniería, fabricación, instalación y pruebas de comisionamiento de un equipamiento de tecnología de punta para una subestación de alta tensión (220,000 voltios) en una zona urbana de Lima. Dos particularidades hacían más retador el proyecto: de un lado, se trataba de un modelo relativamente nuevo que, a la larga, terminó representando para la fábrica el primer lote de dichos equipos instalado a nivel mundial. De otra parte, el cliente nos contrataba para un proyecto por primera vez. Esto representaba una apuesta clara del

cliente, tanto por el equipo como por la marca. Todo parecía marchar bien al inicio, con el desarrollo de una ingeniería que tuvo pocos contratiempos y cuya aprobación se obtuvo en el tiempo esperado. La primera dificultad se presentó durante las pruebas en fábrica, cuando una de las unidades no obtuvo los resultados esperados, por lo que su prueba debió reprogramarse. A pesar de que se superó la prueba pendiente a dicha unidad en un lapso de tres semanas después de la primera prueba, dicha reprogramación impactó en el cronograma del proyecto.

Después de que sobrevino la pandemia, el cliente, la fábrica y la organización local decidieron tomar el toro por las astas y realizar una meticulosa planificación sobre la base de las lecciones aprendidas hasta ese momento.

El siguiente problema tuvo que ver con la fabricación. La entrega abarcaba cinco equipos, pero en las pruebas en fábrica solo se habían probado dos unidades. Quedaba pendiente fabricar las tres restantes, a fin de tener el 100% de los equipos listos para su despacho por vía marítima al Perú.

El arribo de todo el lote estaba previsto para finales de setiembre de 2019. No obstante, debido a problemas con algunos componentes en el proceso de manufactura, el despacho se retrasó y la fábrica optó por realizar despachos parciales, con la finalidad de no demorar el inicio del montaje del equipamiento y dar prioridad a las unidades con las cuales se podía iniciar la instalación.

De otro lado, el envío del supervisor especialista de fábrica destinado originalmente a este proyecto se complicó, a causa de una inadecuada planificación del trámite de aprobación de su documentación. Este contratiempo trató de mitigarse enviando temporalmente a otro supervisor de menos experiencia para empezar con el montaje. Pero dicho plan de acción, que tenía como objetivo final cumplir con la fecha de entrega contractual del proyecto, no tuvo éxito

porque algunos de los despachos parciales no fueron informados al cliente ni planificados adecuadamente, y, además, porque, a un par de semanas de empezar con las pruebas finales de comisionamiento, la fábrica informó acerca de una falla en el proceso de control de calidad de un lote de piezas perteneciente a un componente interno crítico de las unidades fabricadas para nuestro proyecto y otros, alrededor del mundo. Esto supuso tener que sugerir paralizar el proyecto y postergar la energización de la subestación hasta que las piezas nuevas estuvieran disponibles, algo que el cliente rechazó de manera categórica desde un inicio, debido a que superaba largamente el plazo de ley que tenía para poner en servicio la subestación.

Afortunadamente, después de una evaluación exhaustiva, se llegó a una solución satisfactoria para ambas partes. Se energizó



la subestación con la condición de "inhabilitar" previamente el componente dañado en cada unidad y realizar, al mismo tiempo, una modificación en la instalación para suplir su función, evitando así cualquier falla del equipamiento durante su funcionamiento. Esta, por supuesto, era una solución temporal. Luego de la energización del equipamiento, sobrevino la pandemia y, consigo, un entendible atraso en la fabricación de los componentes nuevos y la programación de los trabajos de reemplazo. Es en este punto donde el cliente, la fábrica y la organización local decidieron tomar el toro por las astas y realizar una meticulosa planificación sobre la base de las lecciones aprendidas hasta ese momento.

En primer lugar, se corrigieron detalles en la logística de origen respecto a los documentos de exportación y programación de embarques. Esto logró mayor exactitud en las fechas estimadas de llegada de las piezas y herramientas, y supuso limitar los despachos únicamente a dos envíos.

En paralelo, se informó al cliente con la debida anticipación respecto al cubicaje de la carga, a fin de poder descargar directamente en un área de la subestación. También resultó muy valioso el retorno de la experiencia en subestaciones de otras partes del mundo donde ya se había llevado a cabo este trabajo de reemplazo de los componentes, lo que permitió retroalimentar al personal técnico

del contratista local seleccionado. Asimismo, se hicieron las gestiones necesarias con la fábrica para que se enviara al Perú a un supervisor con experiencia previa en este tipo de trabajos.

Finalmente, solo restaba definir la fecha de inicio de las actividades, lo cual estaba supeditado al levantamiento de las restricciones de ingreso al país debido a la coyuntura pandémica. Mientras tanto, el equipo del proyecto logró beneficiarse de este tiempo en stand by, pues preparó con antelación el trámite documentario interno necesario para obtener la visa del supervisor y la aprobación de su documentación por parte del cliente. Esto permitió que los trabajos pudieran comenzar tan solo dos semanas después de que se reabrieran las fronteras, a finales de octubre de 2020, lo cual posibilitó su conclusión en la quincena de diciembre del mismo año.

En resumen, las lecciones aprendidas durante este proyecto fueron capitalizadas en conjunto con el cliente. Fueron muy valiosas para todo el equipo y para la organización, tanto a nivel local como a nivel de la fábrica. Si algo adicional puedo rescatar es la importancia de sostener reuniones conjuntas periódicas entre el cliente y el vendedor, con el objetivo de revisar el avance del proyecto y corregir errores sobre la marcha. No obstante, aun así, un proyecto no está exento de dificultades o contratiempos, lo cual espero poder compartir en un próximo artículo.

**¿Quieres ser parte
de las siguientes ediciones
de la revista?**



Completa el formulario

GP GESTIONA
PROYECTOS



EDICIÓN N°3

UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES



Javier R. Rodríguez Marrón

Marketing and New Business Management. Gerencia de Comercialización y Nuevos Negocios en Oil & Gas -Engineering & Construction, C.A.

De acuerdo con la sexta edición de la Guía PMBOK, una fase de un proyecto es definida como "un conjunto de actividades, relacionadas de manera lógica, que culmina con la finalización de uno o más entregables". Dentro de estas actividades está la implementación de las estrategias de conocimiento adquirido a través de las lecciones aprendidas.

Esta definición es adquirida por las oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), que se encargan de elaborar los procesos, las políticas y los procedimientos sobre la base de información histórica de proyectos ya ejecutados. Esta información puede incluir documentación técnica o financiera, actas de cierre, libros de obra y otros documentos que reflejen acontecimientos ocurridos; es decir, el resultado de decisiones tomadas y acciones realizadas para resolver problemas que puedan ser considerados en nuevos proyectos o en próximas fases de un proyecto en curso.

Se debe establecer los métodos de toma de decisiones bajo acciones preventivas y correctivas.

Para asegurar que el aprendizaje sea incorporado debidamente en los procesos de una organización, las lecciones aprendidas deben ser documentadas estableciendo registros y directrices según el sistema de gestión de cada empresa.

A manera de ejemplo, se puede indicar que la ingeniería conceptual define tecnologías y sitios de implantación de equipos, entre otros, mientras que, en la fase posterior de ingeniería básica, se elaboran las especificaciones

técnicas para la adquisición de bienes y servicios. Lo anterior, en plazos determinados, para cumplir con los cronogramas de trabajo del proyecto; caso contrario, puede afectar los tiempos de ejecución en las fases siguientes de construcción y puesta en marcha. Este ejemplo práctico se puede revisar a partir de lecciones aprendidas de proyectos anteriores respecto de la toma de decisiones al realizar la procura temprana durante la etapa de definición de los equipos y materiales prioritarios que pueden llegar a la obra en la fase de implantación con oportunidad.

Podemos plantear otro ejemplo concreto, referido a una conocida empresa matriz de manejo de proyectos en el área de Oil & Gas. En todos los contratos de mantenimiento y limpieza de áreas verdes y áreas habitacionales en el campamento de los trabajadores, disponían de uso obligatorio de ambulancia, paramédico y chofer. Esto trajo como consecuencia aumentos considerables en los costos debido a esta partida de la obra, y el colapso de las vías internas del campamento. Se llevó a cabo, entonces, un estudio estadístico, el cual verificó que, habiendo un hospital industrial con ambulancias disponibles cerca de las áreas habitacionales, la partida de suministro de ambulancia podía ser excluida de los contratos siguientes. Esto, cómo no, suponía optimizar la movilidad vehicular interna y la disminución de los costos de los contratos.

De lo anterior, podemos reflexionar acerca de la importancia de aprender de los proyectos pasados para mejorar los siguientes, tal como señala la Guía PMBOK en su sexta edición. Siete aspectos resultan esenciales:

1 Afrontar futuros proyectos sobre la base de conocimientos, información histórica y eventos documentados con análisis de resultados positivos o negativos de las acciones tomadas y documentadas a través de las lecciones aprendidas.

2 Las lecciones aprendidas buscan mejoras en el desempeño y evitar incurrir en desviaciones, acciones o decisiones poco acertadas tomadas en el pasado.

3 En la medida que van documentándose las lecciones aprendidas, se puede ir mejorando la efectividad en la toma de decisiones sobre la base de la gestión del conocimiento.

4 El impacto generado por la toma de decisiones puede traer consigo resultados positivos o negativos. La documentación de acciones y decisiones debe quedar registrada para el respectivo análisis referido a riesgos, oportunidades y amenazas que las generaron.

5 Se debe establecer los métodos de toma de decisiones bajo acciones preventivas y correctivas, a través de indicadores de la efectividad y consecuencias de las mismas.

6 Los cambios de alcance, los registros de aumento o disminución en la cantidad de obras y sus justificaciones, los cambios en los diseños, y el impacto en los cronogramas o el presupuestos deben ser analizados y llevados a formatos que recopilen información para las lecciones aprendidas.

7 Finalmente, para potenciar la herramienta de las lecciones aprendidas, estas deben divulgarse a través de los medios disponibles, tanto físicos como electrónicos y presentaciones orales, así como a través de los canales oficiales de la organización.



¿HASTA QUÉ PUNTO DEBEMOS TOLERAR EL ERROR EN NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO?



Jose Arturo Palomino Higaonna

Ingeniero de Sistemas. Especializado en Gestión de Proyectos de TI, Innovación Digital y Dirección Estratégica, con más de trece años de experiencia facilitando a las organizaciones a lograr sus metas empresariales con ayuda de las tecnologías de información.

Se me viene a la mente el recuerdo de aquel día, cuando prácticamente todo el sistema comercial para el canal directo de ventas había colapsado y yo, y parte de mi equipo, éramos los responsables de que esto nunca sucediera. Es imposible no volver a sentir la angustia, el estrés y la presión que experimenté aquella vez. La frase "por cada hora que transcurre, la empresa pierde dinero", retumbaba como coro de una mala composición musical en mi cabeza. No podía dejar de escucharla.

Fue en medio de llamadas, reuniones de tipo war room y personas que entraban y salían de mi área, que uno de los gerentes involucrados en la resolución observó que yo estaba en mi escritorio colmado de vasos descartables de café, frente a mi computadora, sudando frío. Se acercó y, entre serio e irónico, me dijo: "Jose Arturo, esta será una de esas lecciones aprendidas que nunca olvidarás".

Recuerdo no haber reconocido su voz mientras alzaba mi mirada con una sonrisa falsa y nerviosa. Solo atiné a decirle: "Créeme, quisiera olvidarla ya mismo".

Solo el tiempo y la madurez me han permitido entender lo que puede significar equivocarse, error, caerse, ser derrotado y cualquier otra connotación negativa que implique aprender de lo sucedido a fin de no volver a cometer la misma falla.

Sin embargo, sigue latente la inquietud de saber hasta cuándo debo equivocarme o tropezar para aprender. La situación se complica aún más cuando pasas a ser el líder de un equipo de trabajo y eres consciente de que tus colaboradores también cometen errores, tan críticos e impactantes como los que cometiste tú en el pasado y ahora, como

buen líder, te toca asumir como si fueran propios. La inquietud, entonces, se vuelve hacia tu equipo: ¿hasta qué punto debes tolerar sus errores para no perjudicar a la organización?

En mi opinión, y bajo mi experiencia, considero que no hay una respuesta correcta, con una verdad absoluta, ni tampoco una regla de oro o pasos infalibles para resolver esta interrogante. No obstante, sí considero que existen algunas pautas, premisas, consideraciones y acciones concretas que pueden ayudarnos a tomar la mejor decisión. En primer lugar, debemos aceptar y reconocer nuestros errores. Esto es crucial para que todas las demás acciones tengan sentido. Dejar momentáneamente a un lado nuestro orgullo o vergüenza es complicado; preferimos ser víctimas de los hechos y, si podemos culpar a otros, mejor aún. Ser conscientes de que como seres humanos nos equivocamos es el reto inicial.

Luego debemos aceptar que los demás también se equivocan. Lo primero que se nos viene a la mente cuando alguien se equivoca y nos perjudica, en algo que para nosotros es muy fácil de hacer, es que esa persona no es competente. ¡Grave conclusión!

Lo siguiente es identificar de qué manera cada colaborador de nuestro equipo de trabajo logra aprender y asimilar más rápido, y de manera correcta, nuevos conocimientos y competencias. Recordemos que todos somos diferentes, no tenemos la misma facilidad de aprender y de entender las cosas. Identificar la ruta o los medios para llegar a nuestros colaboradores nos permitirá obtener buenos resultados, tanto a nosotros como a quienes utilicen los mismos medios para conseguirlos. En este punto, nuestro equipo empezará a ganar conocimiento. Sin embargo, sin ponerlo en práctica y sin evaluar el resultado, solo quedaría como algo bueno que se consiguió aprender.

Identificar la ruta o los medios para llegar a nuestros colaboradores nos permitirá obtener buenos resultados, tanto a nosotros como a quienes utilicen los mismos medios para conseguirlos.

Imaginemos que deseamos aprender a nadar y leemos varios libros acerca de técnicas de nado; asistimos a seminarios y talleres de técnicas especiales de nado, pero no logramos practicarlo dentro de una piscina. En ese sentido, debemos evaluar a las personas de nuestro equipo, con una simulación de escenarios reales o, en el mejor de los casos, como se dice en el fútbol, "aprendiendo en la cancha". Tengamos presente que la otra persona está practicando y nosotros, evaluándola. Aquí lo importante es realizar los ajustes necesarios.

A partir de este momento, nuestro equipo está preparado, listo en conocimiento y competencias para enfrentar los siguientes retos. Pero, así como un equipo de fútbol que entrenó y practicó para conseguir el triunfo puede terminar perdiendo sus partidos en el campeonato, nosotros debemos ser

conscientes de que también perderemos los propios.

Entre palabras de aliento, algunas bromas y uno que otro consejo, terminó aquella vez mi conversación con el gerente de mi área.

—Jose Arturo, ¿pudiste prever lo que acaba de ocurrir? —me preguntó.

—Sinceramente, no... Tú sabes, en TI este tipo de incidentes ocurren, pero no pensé que algo como esto podía ocurrir por la falta de ABC —le contesté, nervioso, esperando que me respondiera que debía haberlo previsto antes, como parte del análisis de riesgos que teníamos como política.

—¡Excelente! Antes de este incidente no lo sabías; ahora lo sabes... Significa que algo aprendiste, ¿cierto?

—Bueno, sí, aprendí algo que sinceramente desconocía, pero que se supone debía saber... ¿o no?

—Quizás sí; quizás no. Pero seguramente ahora que sabes que no sabes muchas cosas, harás algo al respecto.

Finalmente, la principal lección aprendida que me llevé de ese día no considero que haya sido el tema tecnológico o técnico que pude identificar y asimilar sobre arquitectura de soluciones y planes de recuperación, sino, más bien, que nunca dejaré de aprender. Hoy conozco más que ayer, pero menos que mañana.

Esta creencia quedó tatuada en mí y empezó a formar parte de mi modelo mental. Desde entonces, la transmito a las personas que conforman mis diferentes equipos de trabajo. Recuerda, no existen los pasos mágicos ni la receta ideal. Lo que me sirvió a mí, no necesariamente te servirá a ti. Acciona, mejóralo y vuelve a accionar. La decisión la tomas tú.



GP GESTIONA PROYECTOS

revistagp@malbapmc.com

f / in: Gestiona Proyectos
